

10ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 018/2024-SEINFRA

● **Processo Adm nº 2070/2024**

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 - próprio

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros
pessoa jurídica

Valor R\$: 351.238,23

Proc. Nº	110512
Folia Nº	
Assinatura	

Teresina, 22 de setembro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 10ª (décima) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.22 09:33:32 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

1105115

Assinatura

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 10ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (10ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 351.238,23** (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) correspondente a um percentual **6,24%**, relativos à 10ª boletim de medição, totalizando **84,21%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 27 DE AGOSTO 2025 E 24 DE SETEMBRO DE 2025.

Este é o nosso parecer.

Timon, 24 de setembro de 2025.


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 10			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84										
1.1		SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	2.187,17	4.068,13	66,68%		63.415,66	10,13%		480.817,30	76,81%
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	108,85	1.791,67	96,78%		135,46	3,22%		4.203,60	100,00%
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	433,00	147.094,43	76,81%		64,19	3,46%		1.855,87	100,00%
1.4	C3373	SEINFRA	RETIrada DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	3.356,40	43.834,58	59,49%		44.410,29	23,19%		191.504,72	100,00%
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	19.018,35	220.612,82	62,19%		11.848,03	16,08%		55.682,62	75,57%
2			INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%									
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	541,06	267.826,16	95,98%		48.011,29	6,46%		743.668,05	100,00%
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	504,60	117.017,79	89,51%		11.216,70	4,02%		279.042,86	100,00%
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	3.148,75	310.812,81	93,09%		13.712,25	10,49%		130.730,04	100,00%
3			SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%									
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	45,10	14.882,43	100,00%		12.805,68	18,38%		60.452,82	86,78%
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	40,20	14.578,13	89,13%		-	0,00%		14.882,43	100,00%
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2:5 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	-	-	0,00%		11.026,94	63,19%		11.026,94	63,19%
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	39,10	18.186,58	86,71%		-	0,00%		18.186,58	86,71%
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%					-	0,00%		38.406,88	62,40%
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	422,10	38.406,88	62,40%		-	0,00%		38.406,88	62,40%
5			PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%									
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	556,50	16.405,75	98,72%		20.303,58	1,11%		1.826.145,83	100,00%
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.680,94	518.334,10	99,39%		213,44	1,28%		16.619,19	100,00%
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %	22.253,19	1.271.102,40	98,69%		3.163,77	0,61%		521.497,88	100,00%
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%					16.926,37	1,31%		1.288.028,77	100,00%
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%

7	7.1	95571	SINAPI	GALERIAS TUBULARES TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,50	92,14	118,69	148.115,79 26.765,01	2,63% 0,48%	-	-	0,00% 0,00%	51.822,91	34,99% 0,00%	51.822,91	34,99% 0,00%
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32%	0,00%	-	75,40	33,44%	6.108,91	33,44%	6.108,91	33,44%
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%	0,00%	-	100,00	44,35%	45.714,00	44,35%	45.714,00	44,35%
8			DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%					154.879,11	7,60%	1.539.692,27	75,55%
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18%	94,43%	8.518,27	434.687,32	502,51	25.643,09	5,57%	460.330,40	100,00%
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50%	99,34%	4.481,15	195.960,69	29,94	1.309,28	0,66%	197.269,97	100,00%
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89%	99,83%	9.003,35	499.505,82	15,33	850,51	0,17%	500.356,33	100,00%
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13%	14,75%	249,50	17.669,59	-	-	0,00%	17.669,59	14,75%
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74%	14,75%	249,50	39.393,56	-	-	0,00%	39.393,56	14,75%
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65%	59,65%	134,50	21.928,88	90,98	14.833,38	40,35%	36.762,26	100,00%
8.7	CPU SEINFRA TIMON/7 24	Próprio	CANALETAS SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29%	49,61%	133,50	175.667,31	85,30	112.242,86	31,70%	287.910,17	81,31%
8.8	73882/00 5	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
			Total Geral					5.629.973,56		77,97%		4.389.767,84		351.238,23	6,24%	4.741.006,07	84,21%

Maciel do Nascimento Lopes
 Engenheiro Civil CREA 1919112979
 Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
 CPF: 016.156.663-46

Pinc N° nos 125
 Folha N° 1
 Assinatura [Assinatura]

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	72,83
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	3,90
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	130,73
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	907,20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	599,80
2			INFRAESTRUTURA			
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	22,66
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	59,13
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	233,84
3			SUPERESTRUTURA			
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	4,91
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	28,50
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	-
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E PAVIMENTAÇÃO	m²	676,45	-
5			PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	12,30
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	1.224,50
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

1105175

Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	-
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	75,40
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	100,00
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	502,51
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	29,94
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	15,33
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	-
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	-
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	90,98
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269,10	85,30
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc. N° 110516
Folha N°
Assinatura

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDIÇÃO Nº: 10		QUADRO - RESUMO FINANCEIRO	
MEDIÇÃO Nº	MONETÁRIO	VALOR TOTAL MEDIDO	PERÍODO CORRESPONDENTE
1ª	R\$ 443.643,24		INÍCIO FIM
2ª	R\$ 426.083,39		22/10/2024 05/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14		06/11/2024 25/11/2024
4ª	R\$ 450.073,76		26/11/2024 11/12/2024
5ª	R\$ 479.369,02		12/02/2025 14/03/2025
6ª	R\$ 841.310,87		15/03/2025 10/04/2025
7ª	R\$ 451.510,46		11/04/2025 28/05/2025
8ª	R\$ 506.114,74		29/05/2025 26/06/2025
9ª	R\$ 502.073,22		27/06/2025 24/07/2025
10ª	R\$ 351.238,23		25/07/2025 26/08/2025
			27/08/2025 24/09/2025
ACUMULADO	R\$ 4.741.006,07		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56	84,21%	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

CBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024


PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/IMA		CONTRATO Nº: 18/2024										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22										
MEDIÇÃO Nº: 10		Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 26/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2026	9º Med 26/08/2025	10º Med 24/09/2025
1	SERVICOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	53.415,66
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67	48.011,29
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.822,91
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	154.879,11
	Porcentagem		7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%
	Custo		443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	351.238,23
	Porcentagem Acumulado		7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%
	Custo Acumulado		443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.578,88	3.887.694,62	4.389.767,84	4.741.006,07

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191125/5
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

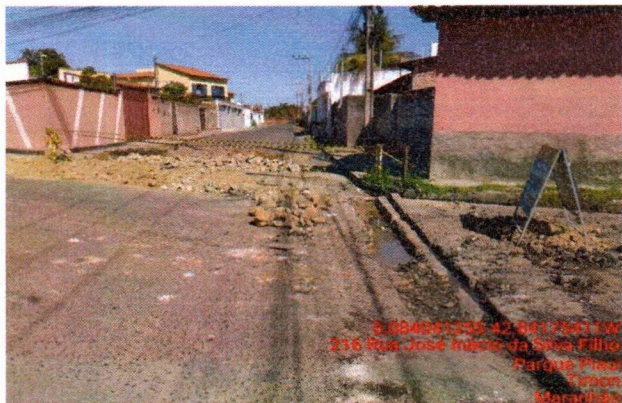

8.2 Guia (Meio -Fio)

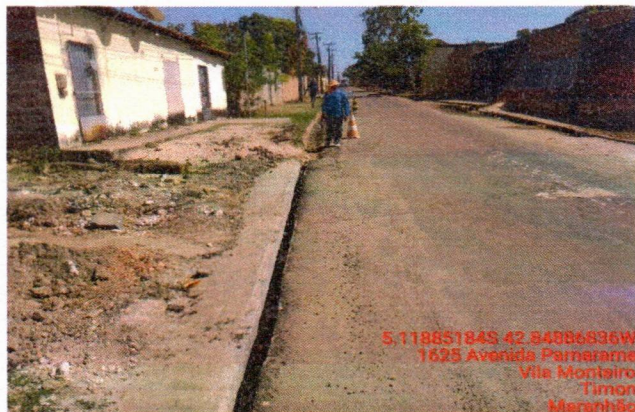


8.2 Guia (Meio -Fio)

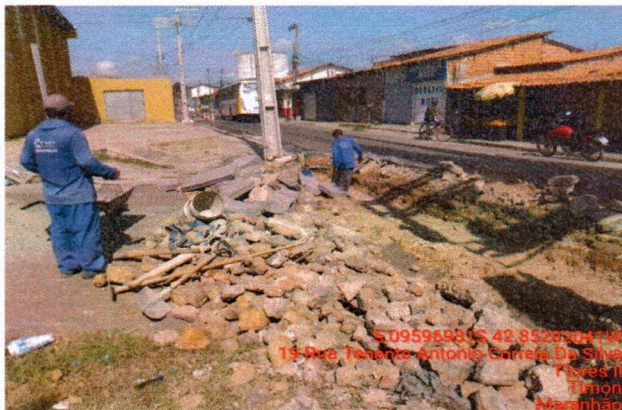


2.2 Escavação manual de vala



2.2 Escavação manual de vala

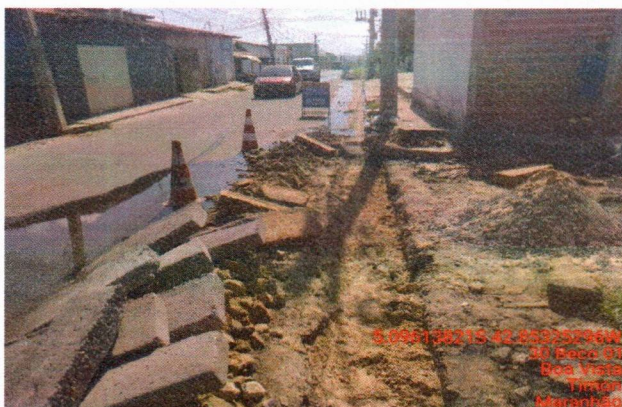

2.2 Escavação manual de vala

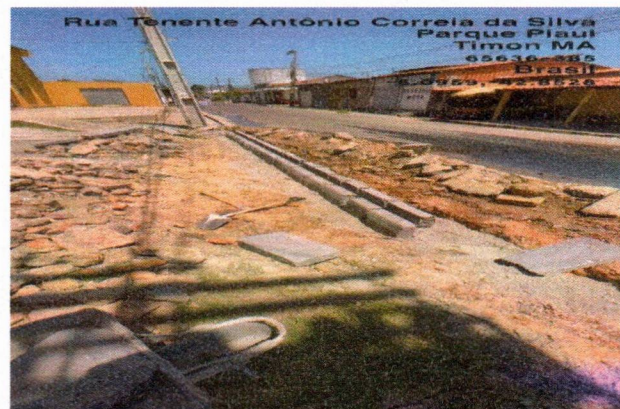

8.1 Assentamento de guia

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc. Nº 1105125
Folha Nº
Assinatura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



3.3 Concreto




8.2 Guia (Meio -Fio)



8.2 Guia (Meio -Fio)



3.3 Concreto

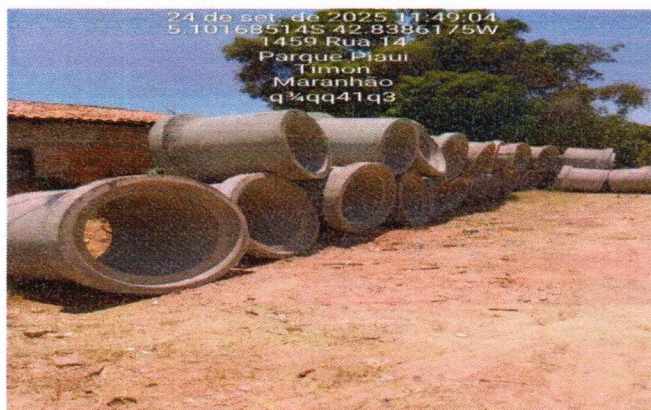

7.3 Tubo de concreto para redes coletoras



1.1 Capina e Limpeza

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



5.1 Piso cimentado




1.1 Capina e Limpeza

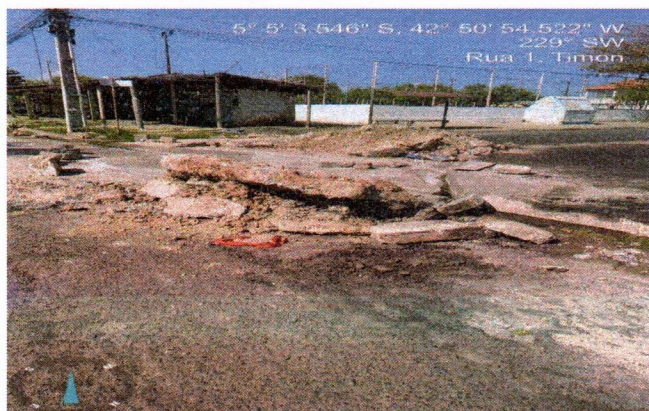


5.1 Piso cimentado



5.1 Piso cimentado

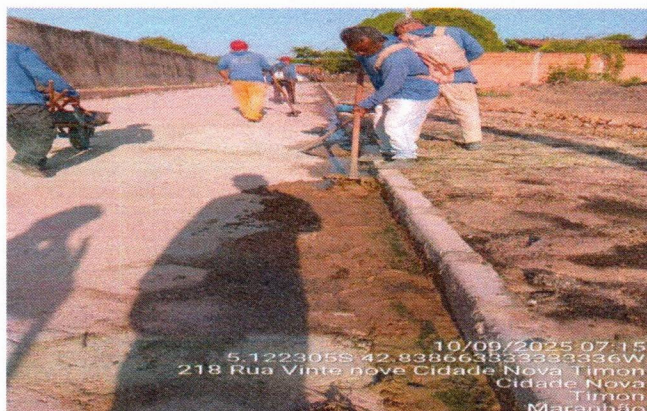

8.2 Guia (Meio -Fio)

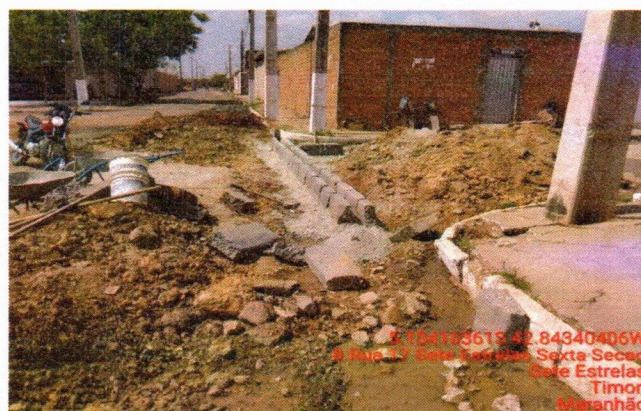


8.1 Assentamento de guia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

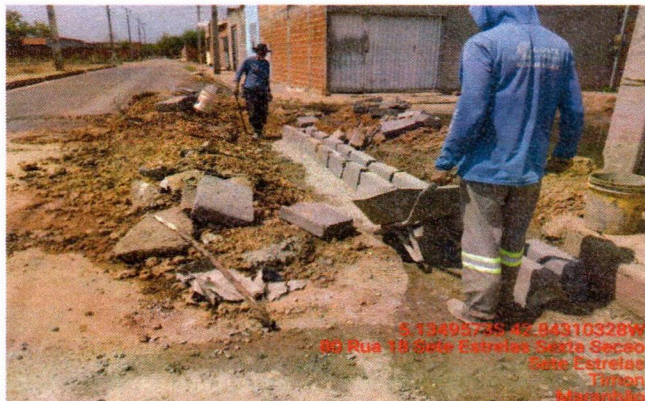


8.1 Assentamento de guia




5.1 Piso cimentado

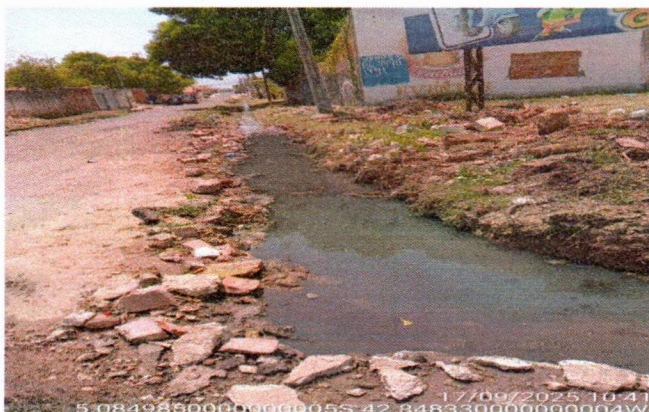

1.1 Capina e limpeza

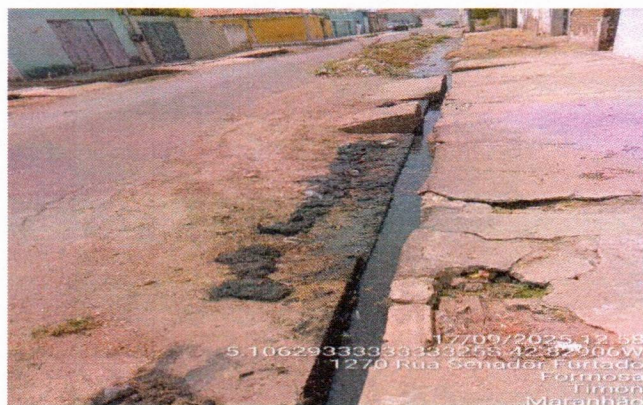

1.1 Capina e limpeza

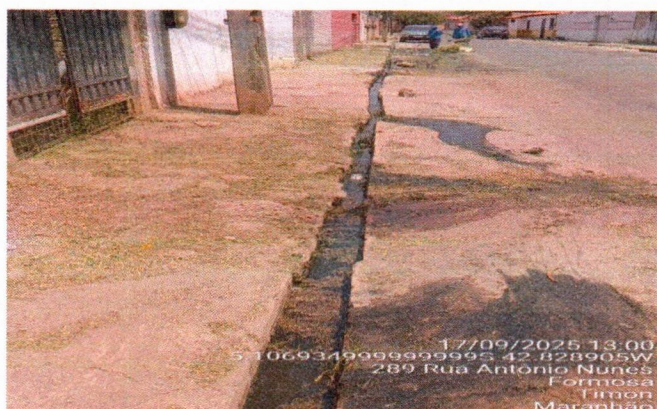

1.1 Capina e limpeza



1.1 Capina e limpeza

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979/Nº
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46


Proc. Nº 1105073

Assinatura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

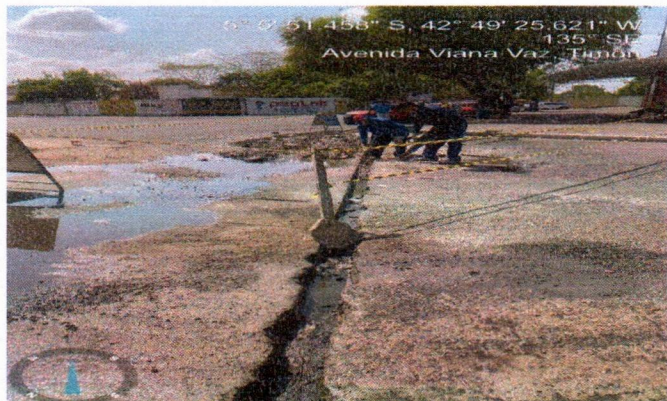

5.1 Piso cimentado

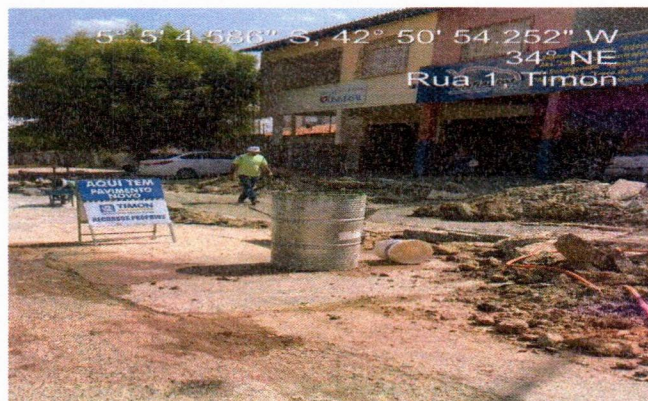

5.1 Piso cimentado

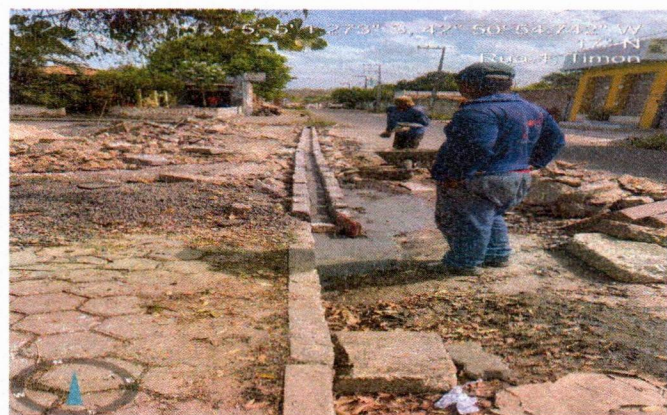

8.2 Guia (meio - fio)



8.1 Assentamento de guia



3.2 Concreto

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Assinatura



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Previsão de término: 31/03/2027

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
 INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 28/03/2025 12:33:01

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1cYZ
 Impresso em: 28/03/2025 às 12:33:01 por: ip: 138.0.234.198

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303



Proc. N°
 Folha f

Proc. N°

Folha N°

Assinatura

Teresina, 24 de setembro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 351.238,23 (Trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais vinte e três centavos), referente a 10ª (decima) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA Assinado de forma digital por FRANKLANDE
COSTA:81764197372 FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.24 20:35:40 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc. Nº 1823/25
Folha Nº 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



TnC9mYH9O

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
24/09/2025 19:05:42

Competência
09/2025

Número / Série
143 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.537.410/0001-22

Nome / Nome Empresarial
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço
CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07 1 S/N VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal
463993-6

E-mail
CLARICESOARES27@HOTMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3212-2837

CEP
64069-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.115.307/0001-14

Nome / Nome Empresarial
PREF MUNICIPAL DE TIMON

Endereço
PRACA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
f.costaconstrutoraltida@gmail.com

Município
TIMON / MA BRASIL

Telefone
(86) 99472-5158

CEP
65630-160

SERVIÇO PRESTADO

C / CBO
4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
TIMON / MA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF A 10* (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO N° 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1823/2024 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TIMON-MA

ATESTO

☐ Os serviços foram realizados
☐ Os materiais foram entregues

ATESTO

☒ Os serviços foram realizados
☐ Os materiais foram entregues

Timon-(MA) 25/09/25

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Tributação Municipal

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
TIMON - MA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
351.238,23	70.247,65	0,00	280.990,58	5,000000	14.049,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.214,85	0,00	0,00	3.863,62	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
280.990,58	8.078,47	0,00	0,00	343.159,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Proc N° 110512
Folha N°
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO

R\$ 351.238,23

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 351.238,23 (Trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais vinte e três centavos), referente a 10ª (décima) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000143.

Teresina, ____ de _____ 2025.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.24 20:35:21 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Proc. Nº	1823
Folha Nº	1

Obra	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024	

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 10				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	TOTAL R\$	%	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.963,84													
1.1		SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	2.187,17	417.401,64	66,68%		63.415,66	10,13%		480.817,30	76,81%			
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	108,85	4.068,13	96,78%	72,83	135,46	3,22%		2.160,00	100,00%			
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	433,00	1.791,67	96,54%	3,90	64,19	3,46%		1.855,87	100,00%			
1.4	C3373	SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	3.356,40	43.834,58	59,49%	130,73	44.410,29	23,19%		191.504,72	100,00%			
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÍDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	19.018,35	220.612,82	62,19%	599,80	6.957,68	1,96%		227.570,50	64,16%			
2			INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%												
2.1	95467	SINAPI	EMBAZAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/ÁREA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	541,06	267.826,16	95,98%	22,66	11.216,70	4,02%		279.042,86	100,00%			
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	504,60	117.017,79	89,51%	59,13	13.712,25	10,49%		130.730,04	100,00%			
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	3.148,75	310.812,81	93,09%	233,84	23.082,35	6,91%		333.895,15	100,00%			
3			SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%												
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:1,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	45,10	14.882,43	100,00%		-	0,00%		60.452,82	86,78%			
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	40,20	14.578,13	89,13%	4,91	1.778,75	10,88%		16.356,88	100,00%			
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	-	-	0,00%	28,50	11.026,94	63,19%		11.026,94	63,19%			
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	39,10	18.186,58	86,71%	-	-	0,00%		18.186,58	86,71%			
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%												
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	422,10	38.406,88	62,40%		-	0,00%		38.406,88	62,40%			
5			PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%												
5.1	98681	SINAPI	PSO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	556,50	16.405,75	98,77%	7,24	213,44	1,28%		16.619,19	100,00%			
5.2	C3410	SEINFRA	ALCANTARAL DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.680,94	518.334,10	99,39%	10,26	3.163,77	0,61%		521.497,88	100,00%			
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %	22.253,19	1.271.102,40	98,69%	296,33	16.926,37	1,31%		1.288.028,77	100,00%			

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:8176419737
2

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:8176419737
Data: 2025.09.24
205243-43100

Mos 125

Folha N°

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:8176419737
Data: 2025.09.24
205243-43100

[illegible]

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA-81764197372
Data: 2025.09.24 20:52:54
-03'00'

[Signature]
Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PERN 1916219403



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDICAÇÃO Nº: 10			
MEDICAÇÃO Nº	QUADRO - RESUMO FINANCEIRO		PERÍODO CORRESPONDENTE
	VALOR TOTAL MEDIDO	PORCENTAGEM	
	MONETÁRIO		INÍCIO FIM
1ª	R\$ 443.643.24	7.88%	10/22/2024 11/5/2024
2ª	R\$ 426.083.39	7.57%	11/6/2024 11/25/2024
3ª	R\$ 289.589.14	5.14%	11/26/2024 12/11/2024
4ª	R\$ 450.073.76	7.99%	2/12/2025 3/14/2025
5ª	R\$ 479.369.02	8.51%	3/15/2025 4/10/2025
6ª	R\$ 841.310.87	14.94%	4/11/2025 5/28/2025
7ª	R\$ 451.510.46	8.02%	5/29/2025 6/26/2025
8ª	R\$ 506.114.74	8.99%	6/27/2025 7/24/2025
9ª	R\$ 502.073.22	8.92%	7/25/2025 8/26/2025
10ª	R\$ 351.238.23	6.24%	8/27/2025 9/25/2025
ACUMULADO	R\$ 4.741.006.07	84.21%	
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973.56		

FRANKLAINE FELIX
DA
COSTA 81764197372
Assinatura eletrônica digital por
FRANKLAINE FELIX DA
COSTA
Data: 2025.09.21 15:18:42 -0500


Bruno Wiliam da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PI/AN 1916219893



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES						
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,260.00	72.83
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112.75	3.90
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	130.73
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	907.20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	599.80
2 INFRAESTRUTURA						
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	22.66
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	59.13
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	233.84
3 SUPERESTRUTURA						
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	4.91
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	28.50
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45.09	-
4 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO						
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676.45	-
5 PAVIMENTAÇÃO						
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563.74	12.30
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1,691.20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	1,224.50
6 ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES						
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	-
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	-

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:81764197
372

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.24
20:53:13 -03'00'

Proc. Nº 1105125
Folha Nº 4
Assinatura



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.50	-
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225.49	75.40
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.49	100.00
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,020.78	502.51
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,511.09	29.94
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,018.68	15.33
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1,691.20	-
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1,691.21	-
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	90.98
8.7	CPU SEINFRA TIMON/724	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269.10	85.30
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897.69	

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.24 20:53:23 -03'00'



OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			CONTRATO Nº: 18/2024									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22									
MEDIÇÃO Nº: 09			Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 26/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2026	9º Med 26/08/2025	10º Med 25/08/2025
1	SERVIÇOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	63.415,66
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67	48.011,29
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	51.822,91
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	351.238,23
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,82	4.389.767,84	4.741.006,07

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.09.24
20:53:32 -03'00'

FRANKLANDE FELIX

DA

COSTA:81764197372

Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA 1516219593


Proc Nº	1105125
Folha Nº	5
Assinatura	

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.




3.2 Concreto

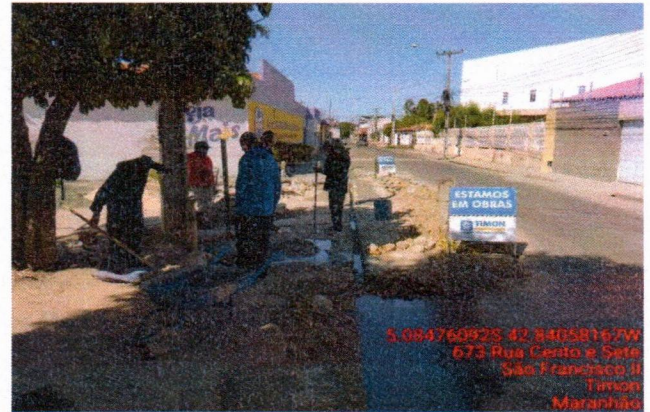


1.1 Capina e limpeza




2.2 Escavação manual de vala

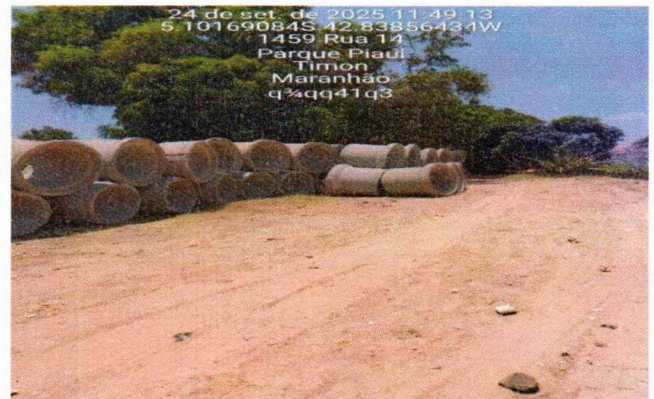

7.3 Tubo de concreto para redes coletoras

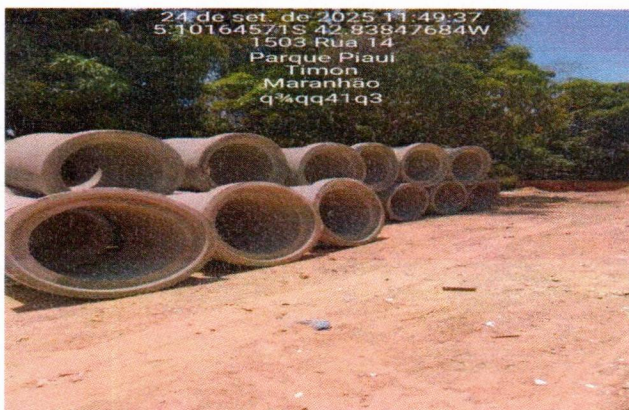


7.3 Tubo de concreto para redes coletoras

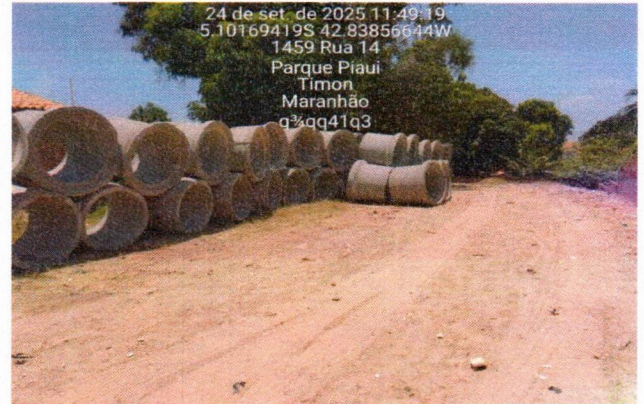


7.3 Tubo de concreto para redes coletoras

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

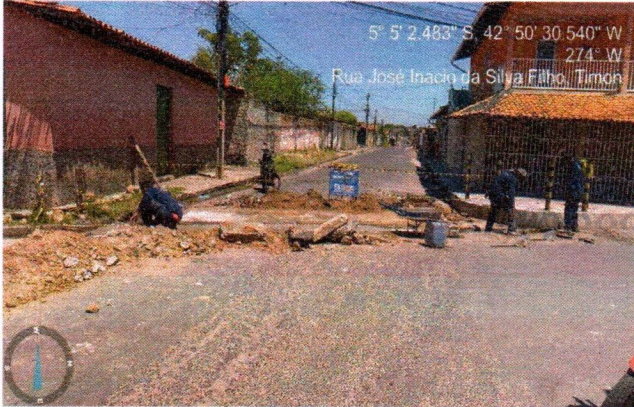

8.1 Assentamento de guia

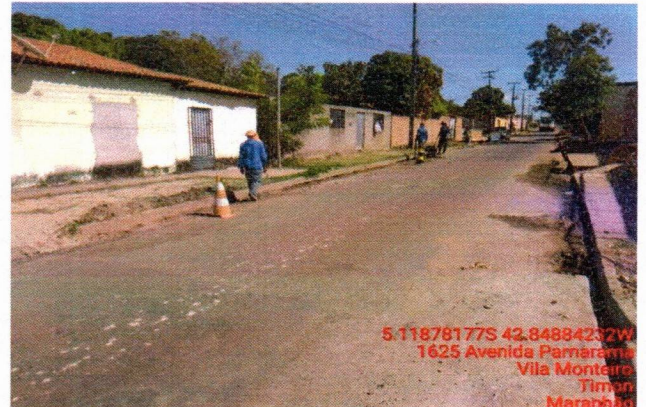


1.1 Capina e limpeza

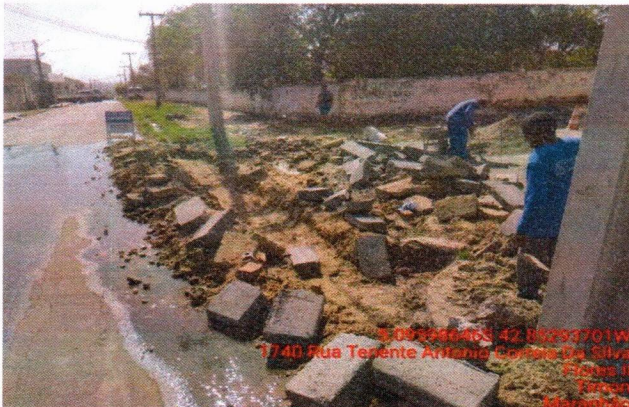

2.2 Escavação manual de vala



2.2 Escavação manual de vala

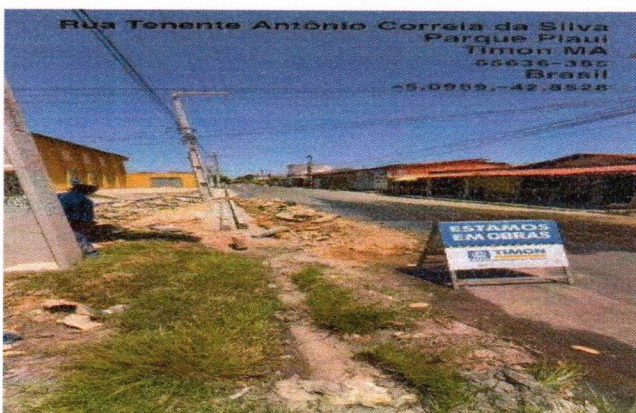

1.1 Capina e limpeza




3.2 Concreto

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.




5.3 Pavimentação em paralelepípedo

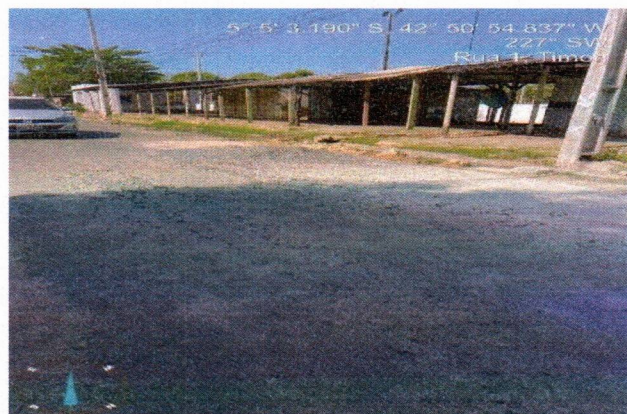


5.3 Pavimentação em paralelepípedo

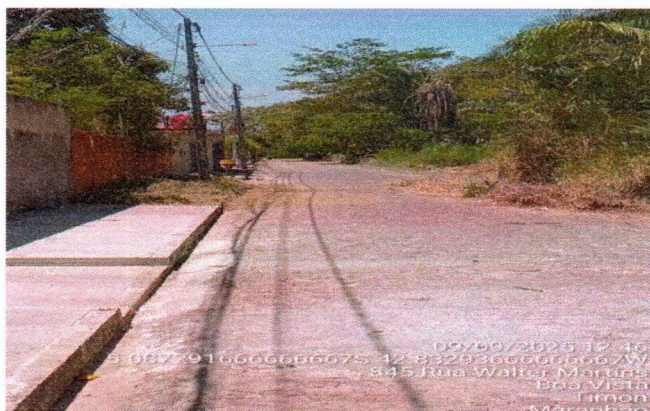

9.3 Sarjetas

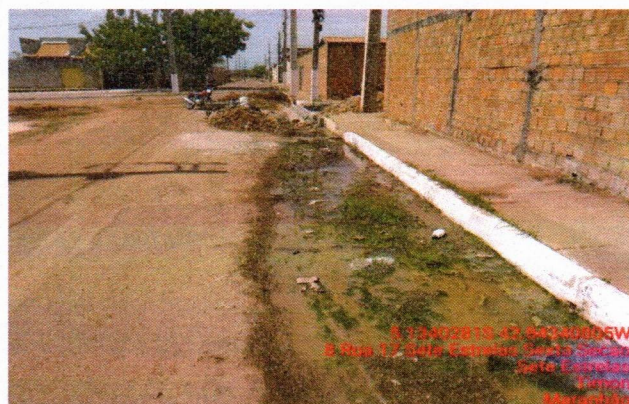

1.1 Capina e limpeza

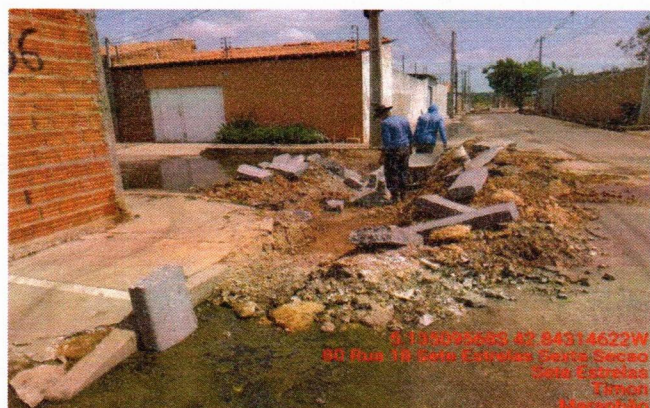

8.1 Assentamento de guia



8.1 Assentamento de guia

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.



8.2 Guia (Meio -Fio)



1.1 Capina e limpeza



1.1 Capina e limpeza



1.1 Capina e limpeza



1.1 Capina e limpeza



3.2 Concreto

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.



8.2 Guia (Meio -Fio)



1.2 Demolição de pavimentação asfáltica

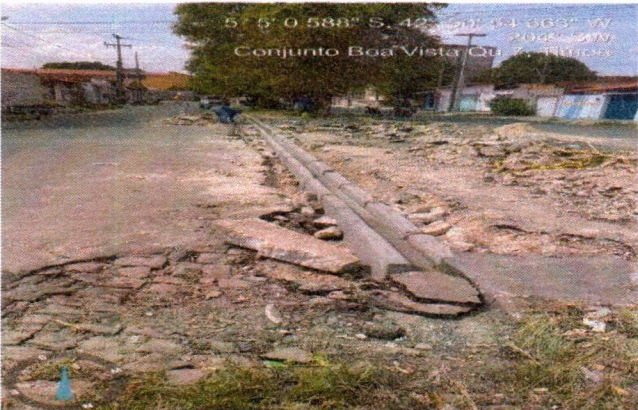

8.1 Assentamento de guia



3.2 Concreto



3.2 Concreto



1.1 Capina e limpeza



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **27.537.410/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:03:56 do dia 07/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2026.

Código de controle da certidão: **2BBF.A767.BB91.7D71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc Nº 1105125
Folha Nº 1
Assinatura [assinatura]

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 27.537.410/0001-22 Período 25/09/2024 a 25/09/2025

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	
FCA1DF90.12D9.4D51	Positiva com efeitos de negativa	18/07/2025 - 09:28:57	14/01/2026	Válida	
E5A196F2.1BF0.72F8	Positiva com efeitos de negativa	17/07/2025 - 12:26:15	13/01/2026	Válida	
907B.16F4.D834.E988	Positiva com efeitos de negativa	11/07/2025 - 19:13:09	07/01/2026	Válida	
2BBF.A767.BB91.7D71	Positiva com efeitos de negativa	07/07/2025 - 00:03:56	03/01/2026	Válida	
OF54.252F.8E86.EADC	Positiva com efeitos de negativa	02/07/2025 - 06:45:10	29/12/2025	Válida	

Exibir: 5 6-10 de 12 itens Página: 2

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: CJ SIGEFREDO PACHECO II SN QD H CASA 6 / VALE DO GAVIAO / TERESINA / PI / 64069-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091607314907643945

Informação obtida em 23/09/2025 13:03:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. N°	1105125
Folha N°	
Assinatura	

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091607314907643945
08/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820314907643901
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121004907643920
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223374907643910
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320404907643981
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503194907643983
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603004907643947
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709174907643925
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902124907643970
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022154907643983
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908384907643923
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109144907643905
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202544907643919
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403304907643907
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503164907643914
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602254907643904
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809424907643944
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905584907643924
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020324907643971
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102374907643978
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307304907643913
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509074907643906
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603234907643905
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707514907643973
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906154907643945
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019464907643947
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101564736832050
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208165151262209
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405113045063760
02/03/2024	02/03/2024 a 02/03/2024	20240302027104004405404

1105/25

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402162340827137
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011607522183608265
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802371610559264
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902073373571865
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003024430108780
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105405024472574
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320001496737603

Resultado da consulta em 25/09/2025 10:21:16

Voltar

Proc. Nº	1105/25
Folha Nº	
Assinatura	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Certidão nº: 39878296/2025

Expedição: 13/07/2025, às 20:23:50

Validade: 09/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.537.410/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	
Assinatura	

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Proc. N°	110515
Folha N°	
	
Assinatura	



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314912908

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2025 16:33:12
VÁLIDA ATÉ 27/10/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E0E745B8-BC86-41FF-AB66-66E1310AEAC5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 28/08/2025 16:33:13 -03:00

Proc. Nº	1105/25
Folha Nº	1
Assinatura	



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214912868

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2025 16:32:46
VÁLIDA ATÉ 27/10/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B4B71CF0-6907-4AC9-B385-D1ADA716FA73

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 28/08/2025 16:32:47 -03:00

Piso Nº	1108/25
Folha Nº	
Assinatura	



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0308920/25-74

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:34:27 h, do dia 23/08/2025

Validade: 21/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4090807B00584300

Proc. Nº	1105/25
Folha Nº	
Nº Via: 1	
Assinatura	

Confirmar

Limpar

Número da certidão *

0.308.920/25-74

Código da autenticidade

4090807B00584300

Itens Obrigatórios

Pelo menos um destes Itens deve ser pre

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 23/08/2025 às 18:34

Válida até 21/11/2025

Código controle 0.308.920/25-74

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22 Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, 1 Complemento: S/N Bairro: BAIRRO VALE DO GAVIAO Cidade: TERESINA Estado:

Cep: 64.069-120

Proc. N°	1105/25
Folha N°	
Assinatura	

CNPJ 27.537.410/0001-22	Razão Social F. COSTA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.6008800-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378748903			Valor Total do Documento 3.319,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	531,73			531,73
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	254,98			254,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.515,97			1.515,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	463,60			463,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	113,69			113,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	189,49			189,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	15,15			15,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	75,79			75,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	113,69			113,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	45,47			45,47

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

01/09/2025 14:16:25

85800000033 0 19560385252 4 62071625244 1 60088009030 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000033 0 19560385252 4 62071625244 1 60088009030 6



CNPJ: 27.537.410/0001-22
Número: 07.16.25244.6008800-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 3.319,56

Pague com o PIX



Proc. Nº

Folha Nº

1105/25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.319,56			3.319,56

Proc. Nº	1205125
Folha Nº	
	
Assinatura	



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 3.319,56

18/09/2025 às 15:44:54

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

94.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250918184444833434956

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF do Devedor:

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162524460088009041821787

Documento: 000000000091802

Autenticação SICPP: 4 6E7 B49 75E 22E AE0

Proc N°	1105/15
Folha N°	1
Assinatura	

CPF/CNPJ do Empregador
27.537.410

Nome/Razão Social do Empregador
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090189292424-0

Tag
27537410 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
606,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	4	606,37	0,00	0,00	0,00	606,37
Total FGTS:		606,37	0,00	0,00	0,00	606,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **606,37**

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 14:17:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77a5443688a4470bba119062c23f67f05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D70C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77a5443688a4470bba119062c23f67f0

Folha N° 105115
Assinatura [assinatura]



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 606,37

18/09/2025 às 15:46:15

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

00360305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250918184605762537460

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: f37e6b741dae48c1bd5767e872c2db4d

Documento: 000000000091803

Autenticação SISBB: 7.D97.D7A.9DD.661.075

Notificação enviada em: 18/09/2025 às 15:46:16

Proc. N°	1105125
Folha N°	
Assinatura	



Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125090189292424-0 Data Emissão: 01/09/2025 14:17:10 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 606,37

Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	19/09/2025	Mensal	2.096,12		167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
08/2025		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	19/09/2025	Mensal	2.096,12		167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
08/2025		GRIGORIO BASILIO DA SILVA NETO	178-0020	025.573.143-40	101	19/09/2025	Mensal	1.431,27		114,50	0,00	0,00	0,00	114,50
08/2025		JULIO CESAR SOUSA FREITAS	178-0019	058.500.333-51	101	19/09/2025	Mensal	1.956,38		156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
Total do Tomador								Sem Tomador		606,37	0,00	0,00	0,00	606,37
Total do Estabelecimento								27.537.410/0001-22		606,37	0,00	0,00	0,00	606,37
Total FGTS								Total FGTS		606,37	0,00	0,00	0,00	606,37

Proc. Nº

Folha Nº

Assinatura

120525

Empregador:	27.537.410	Nome Empregador:	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	4	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/09/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):			606,37
Número da Guia:	0125090189292424-0	Data Emissão:	01/09/2025 14:17:10 (Brasília)	Emitida por:	27.537.410/0001-22	F. COSTA CONSTRUTORA	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	4	7.579,89	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,37
		Total FGTS	7.579,89	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,37

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Contrato temporário
- 05 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - termo firmado nos termos da Lei 9.561/1998
- 06 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - termo firmado nos termos da Lei 9.561/1998
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 14 - Servidor público em comissão
- 15 - Exercente de mandato eletivo
- 16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 19 - Militar
- 20 - Concursito
- 21 - Agente público - Outros
- 22 - Agente público eventual
- 23 - Agente público estatutário
- 24 - Membro do Poder Judiciário, Promotoria, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 25 - Auxiliar local
- 26 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 27 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/pólo auxiliar - Informação prestada pelo cedente/orientadinho
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 31 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 36 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 37 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração mensal superior ao salário mínimo
- 38 - Ministro de conselhos tutelar, nos termos da Lei 8.689/1990
- 39 - Ministro de conselhos tutelar, nos termos da Lei 8.689/1990
- 40 - Ministro de conselhos tutelar, nos termos da Lei 8.689/1990
- 41 - Estagiário
- 42 - Médico residente
- 43 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 44 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 45 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 46 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 47 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 48 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 49 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 50 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 51 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 52 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 53 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 54 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 55 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 56 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 57 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 58 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 59 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 60 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 61 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 62 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 63 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 64 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 65 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 66 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 67 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 68 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 69 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 70 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 71 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 72 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 73 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 74 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 75 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 76 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 77 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 78 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 79 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 80 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 81 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 82 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 83 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 84 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 85 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 86 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 87 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 88 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 89 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 90 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 91 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 92 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 93 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 94 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 95 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 96 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 97 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 98 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 99 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994
- 100 - Profissional, nos termos da Lei 8.956/1994

Proc. Nº 110574
Folha Nº 5
Assinatura

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1550/021101

Conclusão: Parecer Pleno

PROCESSO Nº	1105/2025	NOTA FISCAL/FATURA Nº	143	REFERÊNCIA	set/25, ago/25
ORGAO/ENTIDADE			SEINFRA		
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
701001 /2025 - OR	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	2.010.292,01	351.238,23	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 351.238,23	

I. Introdução

Analisei o processo nº 1105/2025, de pagamento da 10ª medição do do Contrato nº 018/2024, firmado entre o Município de Timon - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon - MA - SEINFRA e a Empresa F. Costa Construtora Ltda, que tem por Objeto, a "Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Manutenção e Conservação de Pavimentação, Canteiros, Sarjetas, Meio Fio, Galerias e Outros em Vias Públicas do Município de Timon - MA", de acordo com o Processo Administrativo Nº 1823/2024 e Concorrência Nº 006/2024, conforme roteiro de Pagamento de medição de obras, previamente definido pela CGM, conforme demonstrado a seguir.

II. Análise

Legenda: S = Sim N = Não

Pergunta	S	N
1. O processo da despesa foi analisado pela Controladoria Geral do Município antes do pagamento? Observação: Cumpre salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com o relatório apresentado pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não será objeto desta análise os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.	X	
2. A análise do controle interno foi realizada pela Controladoria Geral do Município após o pagamento da despesa ?		X

Joseane

Pergunta	S	N
3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ? ☒ Solicitação de Execução de Despesa - SED; ☒ Nota de Empenho; ☒ Contrato e/ou Aditivos; ☒ Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM; ☒ Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA); ☒ Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato; ☒ Ordem de Fornecimento de Material/Serviço; ☒ Solicitação de Pagamento; ☒ Nota Fiscal; ☒ Recibo; ☒ Carta da Contratada encaminhando a medição; ☒ Memória de cálculo; ☒ Cronograma executivo (físico) realizado; ☒ Certificado de medição, definindo o período correspondente; ☒ Quadro resumo financeiro; ☒ Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; ☒ Certidões Negativas de Débito. ☒ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; ☒ Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; ☒ Outros (Especificar): Observação: De acordo com Relatório de Vistoria, Planilhas de Medição, Relatório Fotográfico, todos devidamente atestados pelo Engenheiro Fiscal do presente Contrato, Sr. MACIEL DO NASCIMENTO LOPES do Departamento de Engenharia e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (CREA N° 191911297-9), conforme Contrato n° 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 6,24% referente à 10ª medição, totalizando 84,21% do Valor do Contrato; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo. Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa? Qual a fonte de recurso utilizada? R.: <i>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</i>	X	
12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa? Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: <i>OF N° 29/2025, de 01/07/2025.</i>	X	

Luciane

Proc N° 1105/25
 Folha N° 0100
 Assinatura

Pergunta	S	N
13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato? Qual número e o período de vigência do contrato? R.: <i>Contrato nº 018/2024. Prazo de Vigência: 12 meses: de 21/10/2024 a 21/10/2025.</i> Qual o período de execução da medição? R.: <i>27/08/2025 a 24/09/2025.</i>	X	
14. Houve solicitação de pagamento (SP) ? Qual o número da Solicitação de Pagamento ? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i> Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>24/09/2025.</i>	X	
15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa? Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>143, DE 24/09/2025.</i> Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$) ? R.: <i>351.238,23.</i>	X	
16. O Recibo consta no Processo ?	X	
17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?		X
18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato? Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>R\$ 5.629.973,56.</i> Qual o valor já pago? R.: <i>R\$ 4.741.006,07 (incluindo este pagamento da 10ª medição do Contrato nº 018/2024).</i>	X	
19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período? Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 351.238,23</i> Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 351.238,23</i> Observação: Cabe ressaltar, a responsabilidade da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento e fiscalização das medições, bem como a verificação da qualidade das mesmas, já que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo. Salientamos ainda, a existência de atesto do fiscal do Contrato, designado nos autos do processo, reconhecendo a efetiva medição conforme contratado e apresentados na Nota Fiscal. Assim, uma vez que a regularidade da despesa foi atestada pelo mesmo, esta Controladoria não adentrou ao mérito da fiscalização atestada por ele, nem da autorização do pagamento realizada pelo ordenador da despesa.	X	
20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária? Qual o valor da medição apresentada? R.: <i>R\$ 351.238,23</i> Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: <i>R\$ 351.238,23</i> Observação: Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.	X	

Josiane

Proc Nº *1105/25*
Folha Nº *010*
Assinatura

Pergunta	S	N
21. A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra? Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra? R.: <i>09/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i> Qual o período da medição? R.: <i>27/08/2025 a 24/09/2025.</i>	X	
23. A despesa se refere à pagamento da última medição?		X
24. A medição é referente ao prazo de execução equivalente ao mensal? Qual o mês correspondente da medição? R.: <i>09/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i>	X	
25. Foi apresentada pelo fornecedor, certidões válidas de regularidade fiscal? ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS; ☒ CERTIDÃO DE FGTS ☒ CERTIDÃO TRABALHISTA; Observação: Certidões válidas na data em que foi realizada esta análise. Dessa forma, faz-se necessária a renovação das CND's que estiverem vencidas, no ato do pagamento desta despesa.	X	
26. Trata-se de despesas de exercícios anteriores?		X
Conforme estabelecido no roteiro, as seguintes questões não se aplicaram à análise: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 27, 28, 29, 30.		

III. Conclusão

Em razão de não haver indícios de irregularidades ou impropriedades nos autos, de acordo com os requisitos analisados, concluo que a despesa deverá ser encaminhada para os procedimentos cabíveis.

Recomendações finais:

Cumprе salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com os relatórios, inclusive memorial fotográfico, apresentados pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não serão objeto desta análise, os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.


Salientamos ainda, que a presente análise é apenas de conformidade e leva em consideração os documentos apresentados e atestados pelo Gestor/Fiscal do Contrato, não sendo esta análise uma auditoria do serviço realizado e/ou do Contrato formulado.

Por fim, recomenda-se também que sejam realizadas as devidas retenções dos tributos incidentes e, posteriormente, o recolhimento dos mesmos aos respectivos órgãos arrecadadores, conforme Legislação vigente.


Joseane

Proc N°	1105/25
Folha N°	01
Assinatura	<i>Joseane</i>

Timon-MA, 29 de setembro de 2025.


Joseane Tainan da Silva Dourado
Mat.: 2200828
Técnico de Nível Superior - Engenharia

Paraguaçu Santos Veras Filho
Mat.: 9221038-1
Controlador-Geral

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	010
Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14				701001 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 327	DATA: 29/09/2025	EMPENHO Nº: 701001	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000006/24			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025	
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519	
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, NFS-E Nº 143 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1550/021101.					
OR				SOMA	
				351.238,23	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02 11 01		SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000		Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.010.292,01		1.359.426,19	351.238,23		650.865,82
VALOR A SER PAGO R\$		351.238,23			
trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos *****					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.					
29/09/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93			
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA		Marcel Almeida Soares Secretário Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82			

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 01019
Assinatura

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 19364

PAGTO: 30/09/2025

Credor.: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 2351

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade.: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação..:

REF. A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, NFS-E Nº 143 E PARECER DO CONSELHO INTERNO Nº 1550/2024

Valor **351.238,23**

(trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 351.238,23**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 9	OR 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 351.238,23	R\$ 0,00	R\$ 22.128,00	R\$ 329.110,23
TOTAL					R\$ 351.238,23	R\$ 0,00	R\$ 22.128,00	R\$ 329.110,23

Despesa Líquida: **R\$ 329.110,23**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	71646	329.110,23
TOTAL . . .			R\$ 329.110,23

Despesa paga em 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO
Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038 2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL 151.359,10
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.071.646
VALOR TOTAL 329.110,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359

NR.AUTENTICACAO 5.382.CA3.271.DBB.460

TIMON-MA., 30 de setembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 143

DT/EMIS.: 24-set.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo Pacheco II, Teresina -PI. DADOS BANCÁRIOS: BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 10ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do municipio.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	351.238,23
Pagamentos anteriores	
Valor da Ordem Bancária	351.238,23
Retenções	(22.128,00)
ISSQN	14.049,53
IRRF	4.214,85
INSS	3.863,62
Valor líquido pago	329.110,23
Saldo Remanescente	-

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 105.359-0/FEP

PROCN
Folha Nº 1105/25
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11	Inscrição do Contribuinte 754	No. Crédito 41640191	Vencim Original 10/10/2025	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/10/2025	ISS/2025
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON PRÇ SAO JOSE S/N 65630160 CENTRO TIMON-MA				CPF 000.000.000-00 CNPJ 06.115.307/0001-14		VALOR DO IMPOSTO 14.049,53
Classificação do Contribuinte 84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.09/2025 003						(+) MULTA 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM Impresso no site oficial do Município						(+) JUROS 0,00
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 14.049,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11	Inscrição do Contribuinte 754	No. Crédito 41640191	Vencim Original 10/10/2025	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/10/2025	ISS/2025
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON PRÇ SAO JOSE S/N 65630160 CENTRO TIMON-MA				CPF 000.000.000-00 CNPJ 06.115.307/0001-14		VALOR DO IMPOSTO 14.049,53
Classificação do Contribuinte 84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.09/2025 003						(+) MULTA 0,00
Via da Prefeitura MENSAGEM Impresso no site oficial do Município						(+) JUROS 0,00
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 14.049,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

ISS/2025

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral 11	Inscrição do Contribuinte 754	No. Crédito 41640191	Parcela ÚNICA	Vencim Original 10/10/2025	VENCIMENTO 10/10/2025	VALOR DO IMPOSTO 14.049,53
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON PRÇ SAO JOSE S/N 65630160 CENTRO TIMON-MA						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.09/2025 003						(+) MULTA 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 14.049,53

VIA DO BANCO

81660000140 7 49534542202 8 51010034164 1 01910003000 6



Impresso no site oficial do Município

PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



Proc N°
Folha N°
1105/25
@nau

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 19369

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO EM NF N°143, EMISS. EM 24/09/25, 10ª MEDIÇÃO- EMP
RESA F. COSTA CONSTRUTORA.Valor **14.049,53**(quatorze mil e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 14.049,53**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/ 1	EX	990187		R\$ 14.049,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.049,53
TOTAL					R\$ 14.049,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.049,53

Despesa Líquida: **R\$ 14.049,53**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	93002	14.049,53
TOTAL. . .			R\$ 14.049,53

Despesa paga em 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO
Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038.2025-GP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 8166000140-7 49534542202-8
51010034164-1 01910003000-6

Data do pagamento 30/09/2025

Valor Total 14.049,53

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 6.20F.91B.CA7.9F7.E76

Proc N°	1105/25
Folha N°	01012
Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA E ITAU		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM				
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		Emissao 30/09/2025		IRRF /2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
No. Registro 2899	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 41640195	Vencim Original 30/10/2025	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 4.214,85	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 4.214,85	
Insc. Contribuinte 754		Insc. Econômico 11		Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14		
Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160						

Historico

IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E I
NFAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537
.410/0001-22, REF. NF 143 EMITIDA EM 24/09/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.

IRRPJ

Impresso por CRISTIANE

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

IRRF /2025
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Numero da Taxa 2899	Inscrição do Contribuinte 754	No. Crédito 41640195	Parcela ÚNICA	Vencim Original 30/10/2025	VENCIMENTO 30/10/2025	VALOR DO IMPOSTO 4.214,85
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14 PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160 Historico IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E I NFAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537 .410/0001-22, REF. NF 143 EMITIDA EM 24/09/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbênciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 4.214,85
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO
VIA DO BANCO 81660000042 5 14854542202 1 51030664164 6 01950001000 4 						

Proc N° 1105/25
Folha N° 02017
Assinatura

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 19373

PAGTO: 30/09/2025

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade.: TIMON

CEP: -

Discriminação..:RECOLHIMENTO DE IR RETIDO EM NF N°143, EMISS. EM 24/09/25, 10ª MEDIÇÃO- EMPR
ESA F. COSTA CONSTRUTORA.Valor **4.214,85**(quatro mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.214,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
173	/ 1	EX	999013		R\$ 4.214,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.214,85
TOTAL					R\$ 4.214,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.214,85


Despesa Líquida: **R\$ 4.214,85**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	93001	4.214,85
TOTAL. . .			R\$ 4.214,85

Despesa paga em 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO
Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038 2025-GP

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	6
Assinatura	



Emissão de comprovantes

G3370107500785111
01/10/2025 07:56:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 8166000042-5 14854542202-1

51030664164-6 01950001000-4

Data do pagamento 30/09/2025

Valor Total 4.214,85

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 9.C0E.676.133.A65.752

Proc N° 1105/25
Folha N° 0101
Assinatura
