

# **4<sup>a</sup> e ÚLTIMA MEDIÇÃO do Aditivo 01 CTR 018/2024**

## **F. COSTA CONSTRUTORA**

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

**Contrato nº 018/2024-SEINFRA – Aditivo 01/2025 e 02/2025**

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 - próprio

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros  
pessoa jurídica

**Valor R\$: 206.744,94 (Duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)**

Proc. Nº	4372
Folha Nº	—
Assinatura	

Teresina, 24 de ABRIL de 2026

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA**  
**Secretaria Municipal de obras e infraestrutura**  
**Processo administrativo nº 1823/2024**  
**Secretario**

Nesta

**CONTRATO Nº 018/2024**

**SOLICITAÇÃO DE 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR**

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 4ª (QUARTA) Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX** Assinado de forma digital por  
**DA** FRANKLANDE FELIX DA  
**COSTA:81764197372** COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.24 10:45:44  
-03'00'

Franklande Felix da Costa  
Proprietário administrador

Proc. Nº	47/26
Folha Nº	

## PARECER TÉCNICO

**AÇÃO:** 4º DE MEDIÇÃO DE VALOR E ÚLTIMA DO ADITIVO

**CONTRATO Nº:** 0018/2024-SEINFRA

**OBJETO:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

CONTRATO 018/2024

### DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (4º boletim de medição e última do aditivo) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.


Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 206.744,94** (duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) correspondente a um percentual **14,69%**, relativos à 4º boletim de medição e última do aditivo, totalizando um percentual de **100,00%**, do Aditivo de Valor do contrato 018/2024 da empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

**OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2026.**

Este é o nosso parecer.

  
Maciel do Nascimento Lopes  
Engenheiro Civil CREA 1919112979  
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA  
CPF: 016.156.663-46

Timon, 27 de abril de 2026.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO			MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			VALOR DO CONTRATO ADITIVO R\$ 1.407.493,39			ACUMULADO ANTERIOR					
			QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					156.490,46			33.612,18	21,48%							
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	565,00	1,44	1,86	1.050,90	565,00	1.050,90	100,00%	100,00%	5,87%	565,00	1.050,90	100,00%			
1.2	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	28,19	12,78	16,46	463,95	28,19	463,95	100,00%	100,00%	0,00%	28,19	463,95	100,00%			
1.3	DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	140,93	263,69	339,71	47.876,18	140,93	47.876,18	100,00%	100,00%	0,00%	140,93	47.876,18	100,00%			
1.4	RETRABALHAÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.410,44	10,14	13,06	18.420,28	1.410,44	18.420,28	100,00%	100,00%	0,00%	1.410,44	18.420,28	100,00%			
1.5	DEMOIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m³	7.644,75	9,00	11,60	88.679,15	6.852,95	79.494,22	89,64%	100,00%	10,36%	7.644,75	88.679,15	100,00%			
2	INFRAESTRUTURA					185.916,20			185.915,83	100,00%	0,00%						
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/ÁREA 1:4	m³	140,93	384,57	495,00	69.760,16	140,93	69.760,16	100,00%	100,00%	0,00%	140,93	69.760,16	100,00%			
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	140,93	180,00	231,90	32.682,25	140,93	32.682,25	100,00%	100,00%	0,00%	140,93	32.682,25	100,00%			
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO	m³	845,65	76,62	98,71	83.473,79	845,65	83.473,79	100,00%	100,00%	0,00%	845,65	83.473,79	100,00%			
3	SUPERESTRUTURA					17.415,86			17.412,88	60,69%	0,02%						
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	256,97	329,98	3.720,77	11,28	3.720,77	100,00%	100,00%	0,00%	11,28	3.720,77	100,00%			
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	282,48	362,64	4.089,04	11,28	4.089,04	100,00%	100,00%	0,00%	11,28	4.089,04	100,00%			
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	304,52	386,91	4.362,70	11,28	4.362,70	100,00%	100,00%	0,00%	11,28	4.362,70	100,00%			
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	11,27	361,48	465,13	5.243,35	11,27	5.240,36	99,94%	100,00%	0,06%	11,27	5.243,35	100,00%			
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					15.387,62			15.387,62	0,00%	0,00%						
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	169,11	70,85	90,99	15.387,62	169,11	15.387,62	100,00%	100,00%	0,00%	169,11	15.387,62	100,00%			
5	PAVIMENTAÇÃO					456.536,66			296.016,45	64,84%	35,16%						
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	140,94	22,94	29,48	4.154,77	134,75	3.972,43	95,61%	100,00%	4,39%	140,94	4.154,77	100,00%			
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	422,80	239,50	308,36	130.374,72	362,56	111.799,00	85,75%	100,00%	14,25%	422,80	130.374,72	100,00%			
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	5.637,38	44,36	57,12	322.007,17	3.155,55	180.245,02	55,98%	100,00%	44,02%	5.637,38	322.007,17	100,00%			
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					29.238,99			29.239,50	100,00%	0,00%						
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO	M	84,56	166,81	214,88	18.170,15	84,56	18.170,15	100,00%	100,00%	0,00%	84,56	18.170,15	100,00%			
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO [900 x 500 x 70 mm]	UN	28,19	304,84	392,70	11.068,84	28,19	11.069,29	100,00%	100,00%	0,00%	28,19	11.068,84	100,00%			


Proc Nº 43726  
 Folha Nº  
 Assinatura


Maciel do Nascimento Lopes  
 Engenheiro Civil CHEA 1919112979  
 Portaria N 0146 2025-GP-SEINFRA  
 CPF: 016.156.663-46


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEREIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024


ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO					MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL		
		UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
		C/ BDI																
7	GALERIAS TUBULARES					37.028,95												
7.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,38	92,14	118,69	6.691,25	56,3759	6.691,25	100,00%	56,38	6.691,25	100,00%	56,38	6.691,25	100,00%	56,38	6.691,25	100,00%
7.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	56,37	62,90	81,02	4.567,35	56,3731	4.567,35	100,00%	56,37	4.567,35	100,00%	56,37	4.567,35	100,00%	56,37	4.567,35	100,00%
7.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,37	354,88	457,14	25.770,35	56,3730	25.770,35	100,00%	56,37	25.770,35	100,00%	56,37	25.770,35	100,00%	56,37	25.770,35	100,00%
8	DIVERSOS					509.478,65		509.473,04	100,00%								509.478,65	100,00%
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.255,20	39,61	51,03	115.082,65	2.255,19	115.082,42	100,00%	2.255,20	0,2298	0,00%	2.255,20	115.082,65	100,00%	2.255,20	115.082,65	100,00%
8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.127,77	33,94	43,73	49.317,53	1.127,76	49.316,97	100,00%	1.127,77	0,5647	0,00%	1.127,77	49.317,53	100,00%	1.127,77	49.317,53	100,00%
8.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.254,67	45,06	55,48	125.089,08	2.254,66	125.088,78	100,00%	2.254,67	0,3008	0,00%	2.254,67	125.089,08	100,00%	2.254,67	125.089,08	100,00%
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	422,80	54,97	70,82	29.942,72	422,80	29.942,71	100,00%	422,80	0,01	0,00%	422,80	29.942,72	100,00%	422,80	29.942,72	100,00%
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	422,80	122,55	157,89	66.756,41	422,80	66.756,15	100,00%	422,80	0,26	0,00%	422,80	66.756,41	100,00%	422,80	66.756,41	100,00%
8.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,37	126,56	163,04	9.190,59	56,37	9.190,56	100,00%	56,37	0,03	0,00%	56,37	9.190,59	100,00%	56,37	9.190,59	100,00%
8.7	CANALETA SIMPLES	M	67,27	1.020,93	1.315,86	88.524,48	67,27	88.520,40	100,00%	67,27	4,08	0,00%	67,27	88.524,48	100,00%	67,27	88.524,48	100,00%
8.8	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	224,42	88,46	113,96	25.575,19	224,42	25.575,05	100,00%	224,42	0,14	0,00%	224,42	25.575,19	100,00%	224,42	25.575,19	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.407.493,39</b>		<b>1.200.748,45</b>	<b>85,31%</b>				<b>1.407.493,39</b>	<b>100,00%</b>		<b>1.407.493,39</b>	<b>100,00%</b>	

  
 Maciel do Nascimento Lopes  
 Engenheiro Civil CREA 1919112979  
 Portaria N 0146 2025-GP-SEINFRA  
 CPF: 016.156.663-46

Proc. N° 43/26  
 Folha N° 

 <b>SEINFRA</b> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO</b> <b>PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA</b> <b>CONTRATO Nº: 18/2024</b>	
<b>MEDICÃO Nº: 4º ADITIVO E ÚLTIMA</b>	
<b>QUADRO - RESUMO FINANCEIRO</b>	
MEDIÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO
	MONETÁRIO      PORCENTAGEM
1ª MEDIÇÃO	R\$ 390.145,91      27,72%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 350.013,38      24,87%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 460.589,16      32,72%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 206.744,94      14,69%
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.407.493,39</b>
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>R\$ 1.407.493,39</b>
	PERÍODO CORRESPONDENTE
	INÍCIO      FIM
	18/12/2025      29/01/2026
	30/01/2026      24/02/2026
	25/02/2026      27/03/2026
	28/03/2026      27/04/2026

  
**Maciel do Nascimento Lopes**  
 Engenheiro Civil CREA 1919112979  
 Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA  
 CPF: 016.156.663-46

Proc. Nº	4372
Folha Nº	1
Assinatura	

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES</b>			
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	565,00	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	28,19	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>3</sup>	140,93	0,01
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.410,44	0,00
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	m <sup>2</sup>	7.644,75	791,80
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>			
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	140,93	0,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m <sup>3</sup>	140,93	0,00
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m <sup>3</sup>	845,65	0,00
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11,28	-
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11,28	-
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11,28	-
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	11,27	0,006
<b>4</b>	<b>ELEMENTOS DE VEDAÇÃO</b>			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	169,11	0,00
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	140,94	6,19
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	422,80	60,24
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	5.637,38	2.481,83
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES</b>			
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	84,56	0,00
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	28,19	0,00

Maciel do Nascimento Lopes  
Engenheiro Civil CREA 19191129-1  
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA  
CPF: 016.156.663-46

Proc. Nº	43/20
Folha Nº	1

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
<b>7</b>	<b>GALERIAS TUBULARES</b>			
7.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,38	56,38
7.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	56,37	56,37
7.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,37	56,37
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>			
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.255,20	0,00
8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.127,77	0,01
8.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.254,67	0,01
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m <sup>3</sup>	422,80	0,00
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m <sup>3</sup>	422,80	0,00
8.6	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,37	0,00
8.7	CANALETA SIMPLES	M	67,27	0,00
8.8	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	224,42	0,00

*mlf*  
Maciel do Nascimento Lopes  
Engenheiro Civil CREA 1919112979  
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA  
CPF: 016.156.663-46

OBRA

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA**

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

MEDIÇÃO Nº: 4º ADITIVO


Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 29/01/2026	2ª Med. 24/02/2026	3ª Med. 27/03/2026	4ª Med. 27/04/2026
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	156.490,46	33.612,18	35.249,20	78.442,06	9.187,01
2	INFRAESTRUTURA	185.916,20	69.693,63	28.189,28	88.032,92	0,37
3	SUPERESTRUTURA	17.415,86	10.568,32	-	6.844,55	2,99
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	15.387,62	-	-	15.387,32	0,30
5	PAVIMENTAÇÃO	456.536,66	-	111.091,74	184.924,71	160.520,21
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	29.238,99	14.619,50	-	14.620,00	0,51
7	GALERIAS TUBULARES	37.028,95	-	-	-	37.028,95
8	DIVERSOS	509.478,65	261.652,28	175.483,17	72.337,60	5,61
	Porcentagem		27,72%	24,87%	32,72%	14,69%
	Custo		390.145,91	350.013,38	460.589,16	206.744,94
	Porcentagem Acumulado		27,72%	52,59%	85,31%	100,00%
	Custo Acumulado		390.145,91	740.159,29	1.200.748,45	1.407.493,39


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª Medição Aditivo**

**OBJETO**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

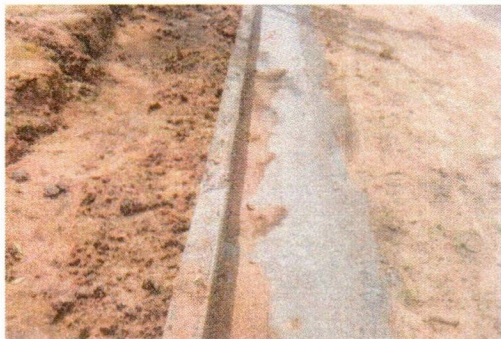


8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

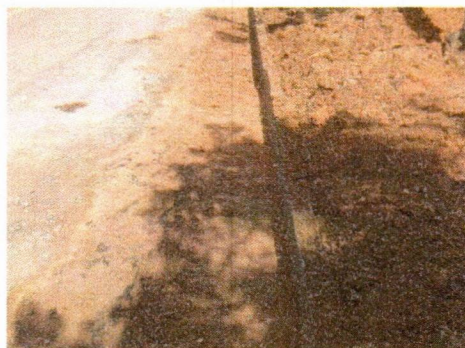

8.4 CORTE MANUAL DE TERRA



8.2 GUIA

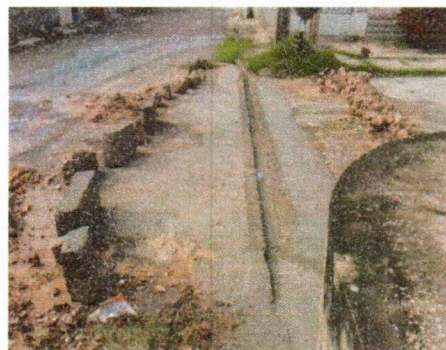

8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

Maciel do Nascimento Lopes  
 Engenheiro Civil CREA 1919112979  
 Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA  
 CPF: 016.156.663-46


Folha N°

43/26

*[Handwritten signature]*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª Medição Aditivo**


**OBJETO** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

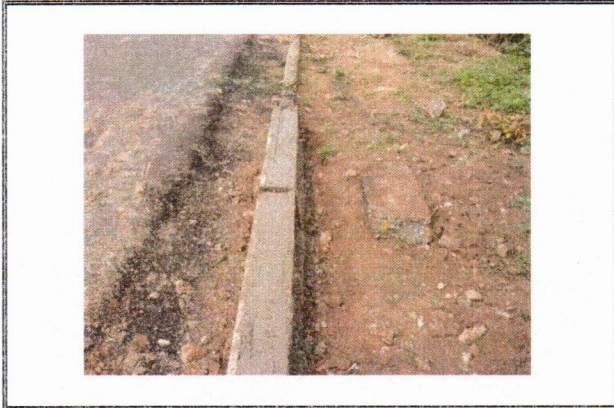

8.2 GUIA



8.2 GUIA

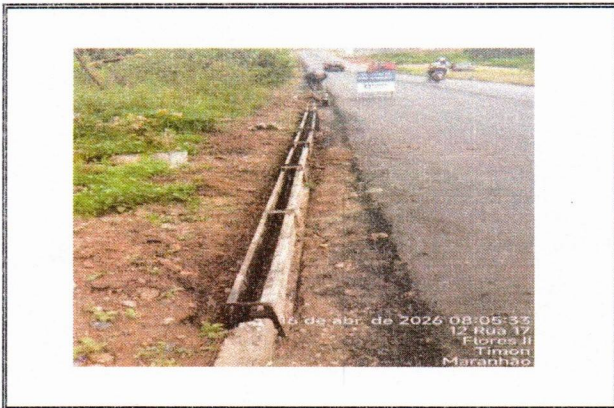

8.2 GUIA



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA



8.4 CORTE DE TERRA



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

Maciel do Nascimento Lopes  
Engenheiro Civil CREA 1919112979  
Portaria N 0146 2025-GP-SEINFRA  
CPF: 016.156.663-46

Proc. Nº 43/26  
Folha Nº



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 5.629.973,56

Ação Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 01/01/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

Previsão de término: 31/03/2027

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE  
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 30/01/2026 10:49:35

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: \*\*\*.156.663.\*\*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877

Proc. Nº 43726  
Folha Nº \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YDDc5  
Impresso em: 30/01/2026 às 10:49:35 por: ip: 177.10.118.20

Teresina, 27 de ABRIL de 2026

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA**  
**Secretaria Municipal de obras e infraestrutura**  
**Processo administrativo nº 1823/2024**  
**Secretario**

Nesta

**CONTRATO Nº 018/2024**

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 206.744,94 (Duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a 4ª (QUARTA) E ULTIMA Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA**  
**COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por  
FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:44:36 -03'00'

Franklande Felix da Costa  
Proprietário administrador

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 27/04/2026 13:11:36  
Competência 04/2026  
Número / Série 166 / U  
Código de Verificação 8lbqB34wE

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 27.537.410/0001-22  
Nome / Nome Empresarial F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereço CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07 1 S/N VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal 463993-6  
Telefone (86) 3212-2837  
E-mail CLARICESOARES27@HOTMAIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64069-120

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 06.115.307/0001-14  
Nome / Nome Empresarial PREF MUNICIPAL DE TIMON  
Endereço PRACA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone (86) 99472-5158  
E-mail f.costaconstrutoraltda@gmail.com  
Município TIMON / MA BRASIL  
CEP 65630-160

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço TIMON / MA  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

Ref. A QUARTA E ULTIMA MEDICAO do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 018/2024. que possui como objeto a Contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon/MA.

**ATESTO QUE:**  
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
X OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
27/04/26  
M

Macliel do Carmo Lopes  
Engenheiro Civil CREA 1919112979  
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA  
CPF: 016.156.663-46

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente  
Município da Incidência do ISSQN TIMON - MA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN -

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
206.744,94	0,00	0,00	206.744,94	5,000000	10.337,24

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.480,93	0,00	0,00	2.274,19	0,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
206.744,94	4.755,12	0,00	0,00	201.989,82

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Proc. N° 43720  
Folha N°  
Assinatura

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA  
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura  
Processo administrativo nº 1823/2024  
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

**RECIBO**

**R\$ 206.744,94**


Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 206.744,94 (Duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a 4ª (QUARTA) E ULTIMA Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA . De acordo com nota fiscal em anexo nº 166.

Teresina, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2026.

**FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por  
FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:44:49 -03'00'

Franklande Félix da Costa  
Proprietário administrador

Proc. Nº	4374
Folha Nº	
Assinatura	

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SABETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMONHIA. CONTRATO 018/2024																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PLANOJA DE MEDIÇÃO - ADITIVO			MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ANTERIOR					
			QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	TOTAL R\$	%	VALOR MEDIÇÃO	QUANT.	TOTAL R\$	%	VALOR MEDIÇÃO	QUANT.	TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					156.490,46			33.612,18	21,48%	9.187,01	5,87%	206.744,94	1.407,483,39	565,00	156.490,46	100,00%
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	565,00	1,44	1,86	1.050,90	100,00%	1.050,90	1.050,90	100,00%	-	0,00%	-	-	565,00	1.050,90	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CANGA E TRANSPORTE	m³	28,19	12,78	16,46	463,95	100,00%	463,95	463,95	100,00%	-	0,00%	-	-	28,19	463,95	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	140,93	263,69	339,71	47.876,18	100,00%	47.876,18	47.876,18	100,00%	0,01	2,12	0,00%	-	140,93	47.876,18	100,00%
1.4	RETRIBUAÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.410,44	10,14	13,06	18.420,28	100,00%	18.420,28	18.420,28	100,00%	0,00	0,04	0,00%	-	1.410,43	18.420,28	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	7.644,75	9,00	11,60	88.679,15	89,64%	6.852,95	79.494,22	89,64%	791,80	9,184,93	10,36%	9.184,93	7.644,75	88.679,15	100,00%
2	INFRAESTRUTURA					185.916,20	100,00%	185.916,20	185.916,20	100,00%	0,37	0,37	0,00%	-	185.916,20	185.916,20	100,00%
2.1	EMBRASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	m³	140,93	384,57	495,00	69.760,16	100,00%	69.760,16	69.760,16	100,00%	0,0038	0,19	0,00%	-	140,93	69.760,16	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	140,93	180,00	231,90	32.682,25	100,00%	32.682,25	32.682,25	100,00%	0,00299	0,69	0,00%	-	140,93	32.682,25	100,00%
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	845,65	76,62	98,71	83.473,79	100,00%	83.473,79	83.473,79	100,00%	0,00133	0,13	0,00%	-	845,65	83.473,79	100,00%
3	SUPERESTRUTURA					17.415,86	60,69%	17.412,88	17.412,88	60,69%	2,99	0,02%	-	-	17.415,87	17.415,87	100,00%
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	11,28	256,97	329,98	3.720,77	100,00%	3.720,77	3.720,77	100,00%	-	-	0,00%	-	11,28	3.720,77	100,00%
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	11,28	282,48	362,64	4.089,04	100,00%	4.089,04	4.089,04	100,00%	-	-	0,00%	-	11,28	4.089,04	100,00%
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	11,28	301,52	386,91	4.362,70	100,00%	4.362,70	4.362,70	100,00%	-	-	0,00%	-	11,28	4.362,70	100,00%
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	11,27	361,48	465,13	5.243,35	99,94%	5.240,36	5.240,36	99,94%	0,0064	2,99	0,06%	2,99	11,27	5.243,35	100,00%
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					15.387,62	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	15.387,62	100,00%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X4X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	169,11	70,85	90,99	15.387,62	100,00%	15.387,62	15.387,62	100,00%	0,0033	0,30	0,00%	0,30	169,11	15.387,62	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO					456.536,66	64,84%	296.016,45	296.016,45	64,84%	-	-	35,16%	-	-	456.536,66	100,00%
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	m²	140,94	22,94	29,48	4.154,77	95,61%	3.972,43	3.972,43	95,61%	6,19	182,24	4,39%	182,24	140,94	4.154,77	100,00%
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	422,80	239,50	308,36	130.374,72	85,75%	111.799,00	111.799,00	85,75%	60,24	18.572,72	14,25%	18.572,72	422,80	130.374,72	100,00%
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (ABREGADO ADQUIRIDO)	m²	5.637,38	44,36	57,12	322.007,17	55,96%	180.245,02	180.245,02	55,96%	2.481,83	141.762,15	44,02%	141.762,15	5.637,38	322.007,17	100,00%
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					29.238,99	100,00%	29.239,99	29.239,99	100,00%	-	-	0,51	-	-	29.238,99	100,00%

Assinado de forma digital por:  
FRANKLANDE FELIX DA COSTA  
Dados: 2026.04.27 14:49:50 -03'00'

Proc. N.º 43/26  
Folha N.º

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA, CONTRATO 018/2024																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO					MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR					VALOR DO CONTRATO ADITIVO		ACUMULADO ANTERIOR	
			QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$	%
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	84,56	166,81	214,88	18.170,15	84,56	18.170,21	100,00%	0,0003	0,06	0,00%	84,56	18.170,15	100,00%	
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	28,19	304,84	392,70	11.068,84	28,19	11.069,29	100,00%	0,0011	0,45	0,00%	28,19	11.068,84	100,00%	
7	GALERIAS TUBULARES	M	56,38	92,14	118,69	6.691,25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	56,38	6.691,25	100,00%	
7.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	56,38	92,14	118,69	6.691,25	-	-	0,00%	56,3759	6.691,25	100,00%	56,38	6.691,25	100,00%	
7.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	56,37	62,90	81,02	4.567,35	-	-	0,00%	56,3731	4.567,35	100,00%	56,37	4.567,35	100,00%	
7.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	56,37	354,88	457,14	25.770,35	-	-	0,00%	56,3730	25.770,35	100,00%	56,37	25.770,35	100,00%	
8	DIVERSOS	M				509.478,65		509.473,04	100,00%		5,61	0,00%		509.478,65	100,00%	
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 05/2016	M	2.255,20	39,61	51,03	115.082,42	2.255,19	115.082,42	100,00%	0,0045	0,2298	0,00%	2.255,20	115.082,65	100,00%	
8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	1.127,77	33,94	43,73	49.317,53	1.127,76	49.316,97	100,00%	0,0129	0,5547	0,00%	1.127,77	49.317,53	100,00%	
8.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	2.254,67	43,06	55,48	125.089,08	2.254,66	125.088,78	100,00%	0,0054	0,3008	0,00%	2.254,67	125.089,08	100,00%	
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	422,80	54,97	70,82	29.942,72	422,80	29.942,71	100,00%	0,0001	0,01	0,00%	422,80	29.942,72	100,00%	
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	422,80	122,55	157,89	66.756,41	422,80	66.756,15	100,00%	0,0016	0,26	0,00%	422,80	66.756,41	100,00%	
8.6	EXECUÇÃO DE SARIETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	56,37	126,56	163,04	9.190,59	56,37	9.190,56	100,00%	0,0002	0,03	0,00%	56,37	9.190,59	100,00%	
8.7	CANALETA SIMPLES	M	67,27	1.020,93	1.315,86	88.524,48	67,27	88.520,40	100,00%	0,0031	4,08	0,00%	67,27	88.524,48	100,00%	
8.8	GALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 500,MM	M	224,42	88,46	113,96	25.575,19	224,42	25.575,05	100,00%	0,0013	0,14	0,00%	224,42	25.575,19	100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.407.493,39</b>		<b>1.200.748,45</b>	<b>85,31%</b>			<b>14,69%</b>		<b>1.407.493,39</b>	<b>100,00%</b>	

Proc. Nº 4372  
 Folha Nº  
 Assinatura

Assinado de forma digital por  
 FRANKLANDE FELIX DA  
 COSTA:81764197372  
 Dados: 2026.04.27 14:50:01 -03'00'

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.					
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA					
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22					
CONTRATO Nº: 18/2024					
MEDIÇÃO Nº: 4º ADITIVO					
MEDIÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE		
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM	
1ª MEDIÇÃO	R\$ 390.145,91	27.72%	12/18/2025	1/29/2026	
2ª MEDIÇÃO	R\$ 350.013,38	24.87%	1/30/2026	2/24/2026	
3ª MEDIÇÃO	R\$ 460.589,16	32.72%	2/25/2026	3/27/2026	
4ª MEDIÇÃO	R\$ 206.744,94	14.69%	3/28/2026	4/27/2026	
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.407.493,39</b>	<b>100,00%</b>			
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>R\$ 1.407.493,39</b>				

FRANKLANDE FELIX  
DA  
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por  
FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:50:21  
-03'00"

Proc. Nº 47/26  
Folha Nº

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES</b>			
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	565.00	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	28.19	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>3</sup>	140.93	0.01
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1,410.44	0.00
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m <sup>2</sup>	7,644.75	791.80
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>			
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	140.93	0.00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m <sup>3</sup>	140.93	0.00
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m <sup>3</sup>	845.65	0.00
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11.28	-
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11.28	-
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11.28	-
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	11.27	0.006
<b>4</b>	<b>ELEMENTOS DE VEDAÇÃO</b>			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	169.11	0.00
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	140.94	6.19
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	422.80	60.24
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	5,637.38	2,481.83
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES</b>			
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	84.56	0.00
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	28.19	0.00

 FRANKLANDE FELIX DA  
 COSTA:81764197372

 Assinado de forma digital por  
 FRANKLANDE FELIX DA  
 COSTA:81764197372  
 Dados: 2026.04.27 14:50:34  
 -03'00'

Proc. Nº	97/26
Folha Nº	
Assinatura	

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
<b>7</b>	<b>GALERIAS TUBULARES</b>			
7.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56.38	56.38
7.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	56.37	56.37
7.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56.37	56.37
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>			
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2,255.20	0.00
8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,127.77	0.01
8.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2,254.67	0.01
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	422.80	0.00
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	422.80	0.00
8.6	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56.37	0.00
8.7	CANALETA SIMPLES	M	67.27	0.00
8.8	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	224.42	0.00

FRANKLANDE FELIX  
DA  
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital  
por FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:50:43  
-03'00'

Proc. N°	43726
Folha N°	1

OBRA

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024**

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
CONTRATO Nº: 18/2024  
CONTRATADA: F. COSTA

MEDICÃO Nº: 4º ADITIVO

**Cronograma Físico e Financeiro**




Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 29/01/2026	2ª Med. 24/02/2026	3ª Med. 27/03/2026	4ª Med. 27/04/2026
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	156,490.46	33,612.18	35,249.20	78,442.06	9,187.01
2	INFRAESTRUTURA	185,916.20	69,693.63	28,189.28	88,032.92	-
3	SUPERESTRUTURA	17,415.86	10,568.32	-	6,844.55	2.99
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	15,387.62	-	-	15,387.32	0.30
5	PAVIMENTAÇÃO	456,536.66	-	111,091.74	184,924.71	160,520.21
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	29,238.99	14,619.50	-	14,620.00	0.51
7	GALERIAS TUBULARES	37,028.95	-	-	-	37,028.95
8	DIVERSOS	509,478.65	261,652.28	175,483.17	72,337.60	5.61
Porcentagem Custo			27.72%	24.87%	32.72%	14.69%
Porcentagem Acumulado			390,145.91	350,013.38	460,589.16	206,744.58
Custo Acumulado			390,145.91	740,159.29	1,200,748.45	1,407,493.03

Assinado de forma digital por  
FRANKLANDE FELIX DA  
COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:50:54  
-03'00

FRANKLANDE FELIX  
DA  
COSTA:81764197372

Proc. Nº 47/24  
Folha Nº 1  
Assinatura

	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª Medição Aditivo</b>
<b>OBJETO</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

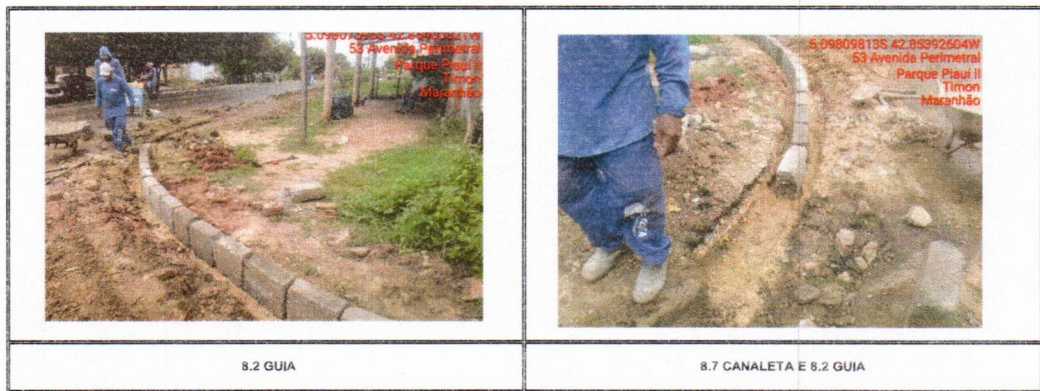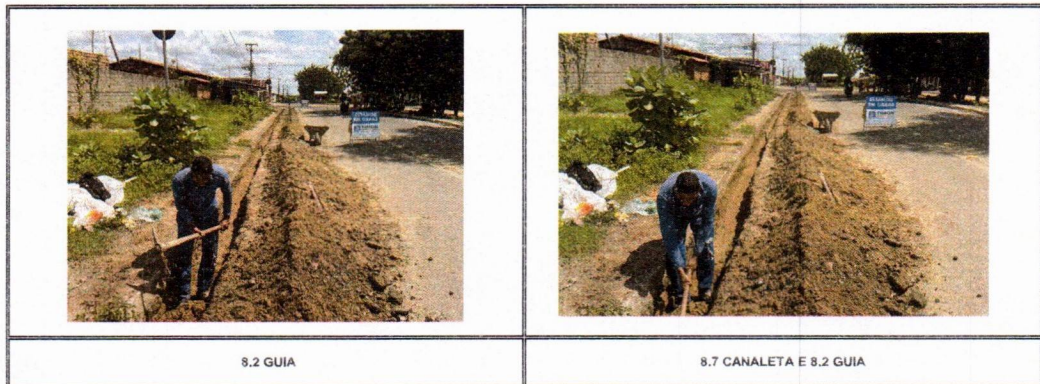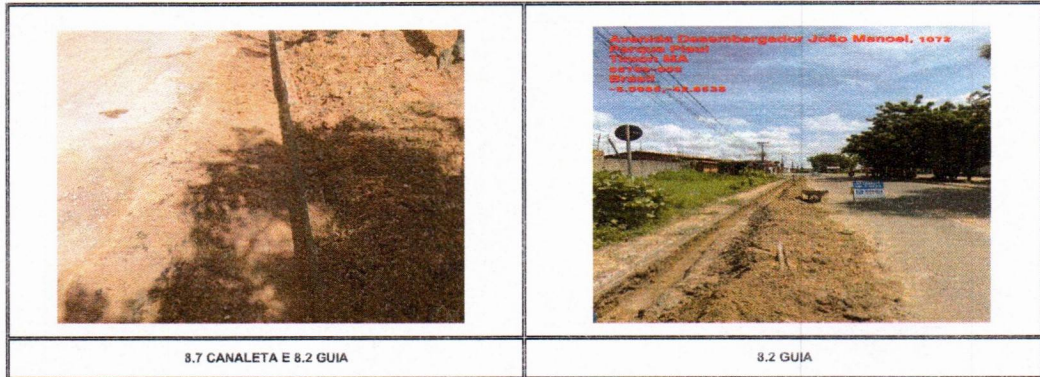





FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372  
 Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372  
 Dados: 2026.04.27 14:48:57 -03'00'


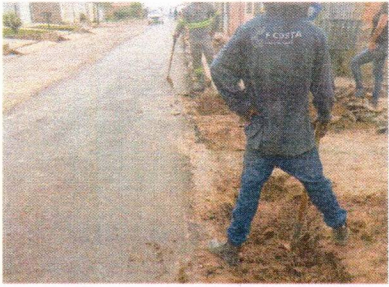
*Dr. Wilson de Sousa Rocha*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA 19102189/3

Proc. Nº 43/26  
 Folha Nº 1  
 Assinatura

	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª Medição Aditivo</b>
<b>OBJETO</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

	
1.1 CAPINA	5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

	
8.2 GUIA	8.2 GUIA

 <p>13 de abr. de 2026, 09:52:05 5° 6'35" S 42° 49'26" W 686 Rua Francisco Firmino de Sousa Porto de Timon Maranhão Altitude: 51,2msnm Número de índice: 1175</p>	
1.1 CAPINA	5.1 PISO CIMENTADO

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372  
Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372  
Dados: 2026.04.27 14:49:07 -03'00'

*Dr. Wilson de Sousa Rocha*  
Engenheiro Civil  
CREA-PA/1915215993

Proc. Nº 43/26  
Folha Nº  
\_\_\_\_\_



## Comprovante BB

# R\$ 3.251,89

20/04/2026 às 14:16:58

**Pix - QR Code**

### Recebedor

#### Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Pagador

#### F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410/0001-22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID: E0000000020260420171650518795367

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Cód.Produto: 07162611021710869047969840

Comprovante emitido em: 20/04/2026 às 14:17:07

Documento: 00000000042007

Autenticação SISBB: 1.EE7.ABF.C4C.8C5.246

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.537.410/0001-22</b>	Razão Social <b>F. COSTA CONSTRUTORA LTDA</b>	
Período de Apuração <b>Março/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26110.2171086-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000470456050</b>		Pagar este documento até <b>20/04/2026</b>
		Valor Total do Documento <b>3.251,89</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	532,59			532,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	277,31			277,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.345,71			1.345,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	504,20			504,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	201,85			201,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	168,21			168,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	13,45			13,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	67,28			67,28
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	100,92			100,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	40,37			40,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

20/04/2026 11:23:23

8582000032 5 51890385261 0 10071626110 0 21710869959 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000032 5 51890385261 0 10071626110 0 21710869959 2



CNPJ: 27.537.410/0001-22  
 Número: 07.16.26110.2171086-9  
 Pagar até: 20/04/2026  
 Valor: 3.251,89

Pague com o PIX



Proc. Nº	43/26
Enlla Nº	
Assinatura	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>3.251,89</b>			<b>3.251,89</b>

Proc. N° 4372  
Folha N° 1



## Comprovante BB

# R\$ 538,26

20/04/2026 às 14:18:24

**Pix - QR Code**

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Pagador

**F. C C LTDA - EPP**

**CNPJ**

27.537.410/0001-22

**Agência**

3507-6

**Conta**

71646-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID: E0000000020260420171816422462520

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Cód.Produto: 9641485e995d463988f79d37653cb3cb

Comprovante emitido em: 20/04/2026 às 14:18:34

Documento: 00000000042008

Autenticação SISBB: 7.CD6.751.E38.F6D.A77

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Proc. N°	4714
Folha N°	
Assinatura	





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 538,26  
**Número da Guia:** 0126042033378192-6 **Data Emissão:** 20/04/2026 11:24:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	20/04/2026	Mensal	2.242,85	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
03/2026		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	20/04/2026	Mensal	2.242,85	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
03/2026		JULIO CESAR SOUSA FREITAS	178-0019	058.500.333-51	101	20/04/2026	Mensal	2.242,85	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
<b>Total do Tomador</b>								<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Folha Nº \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 538,26  
**Número da Guia:** 0126042033378192-6 **Data Emissão:** 20/04/2026 11:24:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	3	6.728,55	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26
		<b>Total FGTS</b>	<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público estatutário, registrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Exercente de mandato eletivo
- 303 - Servidor público ocupante de cargo vacante em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo em comissão ou cargo de confiança, na condição de representante
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrite
- 309 - Servidor Público - Outros
- 310 - Servidor Público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Trabalho Sindical - Informação prestada pelo juridical
- 400 - Trabalho Sindical - Informação prestada pelo juridical
- 401 - Trabalho Sindical - Informação prestada pelo casualista/diário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 728 - Contribuinte individual - Magnata casista temporária da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 729 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.989/1990
- 731 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.989/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.595/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Folha Nº \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 538,26  
**Número da Guia:** 0126042033378192-6 **Data Emissão:** 20/04/2026 11:24:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	27.537.410/0001-22	3	6.728,55	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26
<b>Total FGTS</b>			<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>

Proc. N° 43/26  
 Folha N°  
 Assinatura



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 538,26  
**Número da Guia:** 0126042033378192-6 **Data Emissão:** 20/04/2026 11:24:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	27.537.410/0001-22	11 - FGTS mensal	3	6.728,55	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26
			Total FGTS	6.728,55	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26

Proc. N°	43126
Folha N°	1
Assinatura	



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.537.410 **Nome Empregador:** F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 538,26  
**Número da Guia:** 0126042033378192-6 **Data Emissão:** 20/04/2026 11:24:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	Sem Tomador	3	6.728,55	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26
		<b>Total FGTS</b>	<b>6.728,55</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>

Proc. Nº 43/26  
 Folha Nº 1  
 Assinatura \_\_\_\_\_

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	27.537.410/0001-22
<b>Nome</b>	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	03/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	40094568442 / eSocial 149675141 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 809,90	R\$ 809,90
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.051,76	R\$ 2.051,76
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 390,23	R\$ 390,23
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.251,89	R\$ 3.251,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	FRANKLANDE FELIX DA COSTA	Proc. Nº <u>43/26</u> Folha Nº _____ Assinatura _____
<b>CPF</b>	817.641.973-72	
<b>Telefone</b>	3221-0969	

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/04/2026 11:09:45
Nº do recibo de entrega	0000050000470456050
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	27.537.410/0001-22

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 27.537.410/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:01:56 do dia 14/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2026.

Código de controle da certidão: **30A7.8AE3.6228.A536**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. Nº	47/22
Folha Nº	—
Assinatura	



Entrar com gov.br

Serviços da Receita Federal

Home &gt; Resultado Consulta

## Resultado da Consulta de Certidão


CNPJ 27537410/0001-22 Período 26/03/2025 a 26/03/2026

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
217A.DCOF.7974.C512	Positiva com efeitos de negativa	16/10/2025 - 11:50:11	14/04/2026	Válida	
4658.FB1197A6.0748	Positiva com efeitos de negativa	03/10/2025 - 10:37:07	01/04/2026	Válida	
6A01FF5D.305C.BCCE	Positiva com efeitos de negativa	30/09/2025 - 20:07:07	29/03/2026	Válida	
C537.24D19C69.427C	Positiva com efeitos de negativa	03/09/2025 - 15:38:48	02/03/2026	Expirada	
9F45.8ED0.3CC6.62CE	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 21:49:01	01/03/2026	Expirada	

Exibir 5 1-5 de 13 itens

Página: 1

**Expirada:** A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.[← Voltar](#)[★ Avaliar Serviço](#)[Q Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)



Proc N°	43/26
Folha N°	6104
Assinatura	

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.537.410/0001-22  
**Razão Social:** F. COSTA CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** CJ SIGEFREDO PACHECO II SN / VALE DO GAVIAO / TERESINA / PI / 64069-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/04/2026 a 30/04/2026

**Certificação Número:** 2026040119174907643957

Informação obtida em 13/04/2026 17:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Proc. Nº	43726
Folha Nº	
Assinatura	



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.537.410/0001-22

Razão social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/03/2026	13/03/2026 a 11/04/2026	2026031304124907643973
22/02/2026	22/02/2026 a 23/03/2026	2026022201484907643950
03/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020306174907643941
01/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011205354907643925
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122420094907643911
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120420264907643941
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111410054907643972
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102601234907643961
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100519454907643917
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091607314907643945
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820314907643901
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121004907643920
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223374907643910
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320404907643981
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503194907643983
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603004907643947
04/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709174907643925
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902124907643970
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022154907643983
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908384907643923
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109144907643905
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202544907643919
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403304907643907
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503164907643914
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602254907643904
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809424907643944
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905584907643924
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020324907643971
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102374907643978
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307304907643913
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509074907643906
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603234907643905
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707514907643973
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906154907643945
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019464907643947

Proc N° 43/26  
Folha N° 0101P  
ASSINATURA

Emissão/Leitura	Data de validade	Numero do CRF
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101564736832050
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208165151262209

Resultado da consulta em 27/03/2026 12:52:34

[Voltar](#)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Certidão nº: 66467272/2025

Expedição: 04/11/2025, às 18:42:25

Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.537.410/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc. Nº	43/16
Folha Nº	—
Assinatura	—

### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010324724730**

**CPF/CNPJ:** 27.537.410/0001-22

**Nome/Razão Social:** F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2026 18:28:56**  
**VÁLIDA ATÉ 09/05/2026**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A2481A8A-47D0-4167-96AF-DABCEA0D6C18

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 10/03/2026 18:29:00 -03:00

Proc. N°	4372
Folha N°	
Assinatura	



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010224724908**

**CPF/CNPJ:** 27.537.410/0001-22

**Nome/Razão Social:** F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2026 18:28:37**  
**VÁLIDA ATÉ 09/05/2026**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A978DA11-E26C-48C1-B02C-CF9478A82EFD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 10/03/2026 18:28:41 -03:00

Proc. Nº	4314
Folha Nº	
Assinatura	

- Menu Certidão
- Negativa de Débitos
- Menu Certidão
- Negativa de Dívida Ativa
- Menu Consultas

Início Menu Certidão - 2025/03/27 10:20:26

### Consultar Solicitação de Certidão

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Número da Solicitação

A verificação exigida. Marque a caixa de seleção novamente:

Não sou um robô

Tipo de Certidão	Especie de Certidão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Status	Numero da Solicitação	Data de Solicitação	Tipo de Emissão	Data de Emissão	Data de Validade	Ação
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2600010124724749	10/03/2026 18:28:52	AUTOMÁTICA	10/03/2026 18:28:56	09/05/2026	<a href="#">P</a> <a href="#">D</a>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2600010024726916	10/03/2026 18:28:37	AUTOMÁTICA	10/03/2026 18:28:37	09/05/2026	<a href="#">P</a> <a href="#">D</a>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0301-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2600010121300670	05/01/2026 10:55:24	AUTOMÁTICA	05/01/2026 10:55:42	06/03/2026	<a href="#">P</a> <a href="#">D</a>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2600010021300590	05/01/2026 10:55:08	AUTOMÁTICA	05/01/2026 10:55:12	06/03/2026	<a href="#">P</a> <a href="#">D</a>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010118339228	27/10/2025 13:05:41	AUTOMÁTICA	27/10/2025 13:05:45	26/12/2025	<a href="#">P</a> <a href="#">D</a>

5 - 1-5 de 22

Proc. N° 43/26  
 Folha N° 01004  
 Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 016.864/26-53**

**CPF/CNPJ:** 27.537.410/0001-22

**Contribuinte:** F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:02:24 h, do dia 24/02/2026.

Validade: 25/05/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4FD45B7AD11675E9

Nº Via: 1

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios  
Pelo menos um destes Itens deve s

Número da certidão *	Código da autenticidade
0.016.864/26-53	4FD48E7AD11675E9

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 24/02/2026 às 12:04

Válida até 25/05/2026

Código controle 0.016.864/26-53

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22 Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, 1 Complemento: S/N Bairro: BAIRRO VALE DO GAVIAO Cidade: TERESINA Es

Cep: 64.069-120

Proc N°	43/26
Folha N°	01 de 01

**PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1667/021101**

Conclusão: Parecer Pleno

PROCESSO Nº	43/2026	NOTA FISCAL/FATURA Nº	166/U	REFERÊNCIA	abr./26, mar./26
ORGAO/ENTIDADE			SEINFRA		
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
105008 /2026 - GL	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	1.169.391,72	206.744,94	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 206.744,94	


**I. Introdução**

Analisei o processo nº 43/2026, de pagamento da 4ª e última medição do aditivo ao Contrato nº 018/2024, firmado entre o Município de Timon - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon - MA - SEINFRA e a Empresa F. Costa Construtora Ltda, que tem por Objeto, a "Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Manutenção e Conservação de Pavimentação, Canteiros, Sarjetas, Meio Fio, Galerias e Outros em Vias Públicas do Município de Timon - MA", de acordo com o Processo Administrativo Nº 1823/2024 e Concorrência Nº 006/2024, conforme roteiro de Pagamento de medição de obras, previamente definido pela CGM, conforme demonstrado a seguir.


**II. Análise**

Legenda: S = Sim N = Não

Pergunta	S	N
1. O processo da despesa foi analisado pela Controladoria Geral do Município antes do pagamento?  Observação:  Cumprе salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com o relatório apresentado pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não será objeto desta análise os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.	X	
2. A análise do controle interno foi realizada pela Controladoria Geral do Município após o pagamento da despesa ?		X



Pergunta	S	N
<p>3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solicitação de Execução de Despesa - SED;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contrato e/ou Aditivos;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ordem de Fornecimento de Material/Serviço;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solicitação de Pagamento;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recibo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Carta da Contratada encaminhando a medição;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memória de cálculo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cronograma executivo (físico) realizado;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Certificado de medição, definindo o período correspondente;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quadro resumo financeiro;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relatório fotográfico, contendo comentários por foto;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Certidões Negativas de Débito.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros (Especificar):</p> <p>Observação:</p> <p>De acordo com Relatório de Vistoria, Planilhas de Medição, Relatório Fotográfico, todos devidamente atestados pelo Engenheiro Fiscal do presente Contrato, Sr. MACIEL DO NASCIMENTO LOPES do Departamento de Engenharia e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (CREA N° 191911297-9), conforme Contrato n° 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 14,69% referente à 4ª medição , totalizando 100,00% do Valor aditivo ao Contrato; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo.</p> <p>Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.</p>	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
<p>9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa?</p> <p>Qual a fonte de recurso utilizada? R.: <i>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</i></p>	X	
<p>12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa?</p> <p>Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: <i>OF N° 53/2025, de 18/12/2025.</i></p>	X	

Pergunta	S	N
<p>13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato?</p> <p>Qual número e o período de vigência do contrato? R.: <i>Contrato nº 018/2024. Prazo de Vigência: 12 meses: de 21/10/2024 a 21/10/2025. 2º Termo de aditivo: 22/10/2025 a 22/10/2026.</i></p> <p>Qual o período de execução da medição? R.: <i>28/03/2026 a 27/04/2026.</i></p>	X	
<p>14. Houve solicitação de pagamento (SP) ?</p> <p>Qual o número da Solicitação de Pagamento ? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i></p> <p>Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>27/04/2026.</i></p>	X	
<p>15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa?</p> <p>Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>166, DE 27/04/2026.</i></p> <p>Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$) ? R.: <i>206.744,94.</i></p>	X	
<p>16. O Recibo consta no Processo ?</p>	X	
<p>17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?</p>		X
<p>18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato?</p> <p>Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>Contrato R\$ 5.629.973,56 e Aditivo R\$ 1.407.493,39.</i></p> <p>Qual o valor já pago? R.: <i>5.629.973,56 (Contrato nº18/2024) ; R\$ 1.407.493,39 (aditivo ao contrato nº18/2024).</i></p>	X	
<p>19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período?</p> <p>Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 206.744,94.</i></p> <p>Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 206.744,94.</i></p> <p>Observação:</p> <p>Cabe ressaltar, a responsabilidade da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento e fiscalização das medições, bem como a verificação da qualidade das mesmas, já que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo. Salientamos ainda, a existência de atesto do fiscal do Contrato, designado nos autos do processo, reconhecendo a efetiva medição conforme contratado e apresentados na Nota Fiscal. Assim, uma vez que a regularidade da despesa foi atestada pelo mesmo, esta Controladoria não adentrou ao mérito da fiscalização atestada por ele, nem da autorização do pagamento realizada pelo ordenador da despesa.</p>	X	
<p>20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária?</p> <p>Qual o valor da medição apresentada? R.: <i>R\$ 206.744,94.</i></p> <p>Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: <i>R\$ 206.744,94.</i></p> <p>Observação:</p> <p>Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.</p>	X	

*Joana*

Pergunta	S	N
21. A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra?  Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra? R.: <i>04/2026, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i>  Qual o período da medição? R.: <i>28/03/2026 a 27/04/2026.</i>	X	
23. A despesa se refere à pagamento da última medição?	X	
25. Foi apresentada pelo fornecedor, certidões válidas de regularidade fiscal?  <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS; <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL; <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA ESTADUAL; <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS; <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO TRABALHISTA;  Observação:  Certidões válidas na data em que foi realizada esta análise. Dessa forma, faz-se necessária a renovação das CND's que estiverem vencidas, no ato do pagamento desta despesa.	X	
26. Trata-se de despesas de exercícios anteriores?		X
Conforme estabelecido no roteiro, as seguintes questões não se aplicaram à análise: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 24, 27, 28, 29, 30 .		

### III. Conclusão

Em razão de não haver indícios de irregularidades ou impropriedades nos autos, de acordo com os requisitos analisados, concluo que a despesa deverá ser encaminhada para os procedimentos cabíveis.

#### Recomendações finais:

Cumpra salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com os relatórios, inclusive memorial fotográfico, apresentados pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não serão objeto desta análise, os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.

Ressalta-se que compete à área técnica do órgão Contratante as análises quanto ao preço de mercado e necessidade de aquisição/contratação e, esta Controladoria, não adentra à análise do mérito Administrativo e dos aspectos da legalidade do procedimento realizado, uma vez que já foram objeto de análise jurídica pelo setor competente.


Diante do exposto, após análise da documentação constante do referido processo de pagamento, constatou-se que estas guardam conformidade, de acordo com os aspectos contábeis e financeiros, no que se refere ao cumprimento das exigências referentes aos estágios da despesa (Empenho e Liquidação).

Em relação à prestação do serviço, esta Controladoria verificou que há atesto do fiscal do contrato na nota fiscal, bem como emissão de relatório de fiscalização, reconhecendo, assim, a efetiva realização do serviço contratado.

Ressaltamos ainda, que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo.

Por fim, recomenda-se também que sejam realizadas as devidas retenções dos tributos incidentes e, posteriormente, o recolhimento dos mesmos aos respectivos órgãos arrecadadores, conforme Legislação vigente.

Timon-MA, 28 de abril de 2026.

  
Joseane Tainan da Silva Dourado  
Mat.: 2200828  
Técnico de Nível Superior - Engenharia

  
Paraguaçu Santos Veras Filho  
Mat.: 9221038-1  
Controlador-Geral

**SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA**Praça São José, S/N  
06.115.307/0001-14**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****105008 / 4**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 313 DATA: 29/04/2026 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000006/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2026

NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA 27.537.410/0001-22 CÓDIGO: 23519  
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07 TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO-FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-e Nº 166 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1667/021101.	Liquido <b>182.555,78</b> Desconto <b>24.189,16</b>

GL **SOMA** **206.744,94**

9351 9999.00.0.0.05.00 ISS - INFRA-ESTRUTURA 10.337,25	9519 9999.90.0.2.71. IRRF - PJ REINF - SEINFRA 2.480,94
9869 9999.00.0.0.00.85 INSS - REINF 11.370,97	

**TOTAL DE DESCONTOS 24.189,16**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.169.391,72	1.407.493,39	206.744,94	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 206.744,94**

duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.1016.2005.0000	Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

29/04/2026

*Thayane de Araújo Evangelista*  
 Diretora Técnica  
 Portaria Nº 0363/2025-GP  
 CPF: 063.240.303-93

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

*Marcel Almeida Soares*  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Portaria Nº 022/2025-GP  
 CPF: 791.274.103-82

Emissão de comprovantes  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL**30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28  
379103791 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL  
 AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026  
 NR. DOCUMENTO 553.507.000.071.646  
 VALOR TOTAL 182.555,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: F. C C LTDA - EPP  
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4  
 NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.E0F.0ED.E04.B6F.CF2

Transação efetuada com sucesso por: JI607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 30 de abril de 2026.

**PROCESSO Nº 43/26**

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 166

DT/EMIS.: 27-abr.-26

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo

OBJETO: 4ª medição do aditivo 01 para o 1º quadrimestre de 2026 dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do municipio.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

**Descrição do Pagamento**

<b>Valor NF/Fatura/Liquidação</b>	<b>206.744,94</b>
Pagamentos anteriores	
<b>Valor da Ordem Bancária</b>	<b>206.744,94</b>
<b>Retenções</b>	<b>(24.189,16)</b>
ISSQN	10.337,25
IRRF	2.480,94
INSS	11.370,97
<b>Valor líquido pago</b>	<b>182.555,78</b>
Saldo Remanescente	-

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)**

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO:

Banco do Brasil

RECURSO:

105.359-0/FEP

**SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA**

Praça São José, S/N  
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08723

PAGTO: 30/04/2026

Credor.: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade.: TERESINA

CEP: 64069-120

**Discriminação..:**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO-FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-e N° 166 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 1667/021101.

Valor **206.744,94**

(duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 206.744,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105008 / 9	GL	021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 206.744,94	R\$ 0,00	R\$ 24.189,16	R\$ 182.555,78
TOTAL . . . . .					R\$ 206.744,94	R\$ 0,00	R\$ 24.189,16	R\$ 182.555,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182.555,78**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	105539	182.555,78
TOTAL. . .			R\$ 182.555,78

Despesa paga em 30/04/2026 Com os recursos acima discriminados

Flávio Sebastião Farias Bitencourt  
Tesoreroiro Geral do Município de Timon-MA  
Portaria N° 038/2025-GP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA**  
**CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2026
11	754	42145288	12/05/2026	ÚNICA	12/05/2026	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		10.337,25
PRÇ SAO JOSE S/N 65630160				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO TIMON-MA				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2026 004						(+) JUROS
						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				MENSAGEM		Impresso no site oficial do Município
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						10.337,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA**  
**CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2026
11	754	42145288	12/05/2026	ÚNICA	12/05/2026	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		10.337,25
PRÇ SAO JOSE S/N 65630160				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO TIMON-MA				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2026 004						(+) JUROS
						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via da Prefeitura				MENSAGEM		Impresso no site oficial do Município
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						10.337,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA**  
**CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO**

**ISS/2026**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
11	754	42145288	ÚNICA	12/05/2026	12/05/2026	10.337,25
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
PRÇ SAO JOSE S/N 65630160						(+) MULTA
CENTRO TIMON-MA						0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.04/2026 004						0,00
INSTRUÇOES/OBSERVAÇOES						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						10.337,25

VIA DO BANCO

81670000103 4 37254542202 7 60512034214 8 52880003000 9



PAGUE VIA PIX  
QRCODE AO LADO



**SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA**

Praça São José, S/N  
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08724

PAGTO: 30/04/2026

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade.: TIMON

CEP: -

**Discriminação...:**

RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE VALOR DA NF N° 166, EMISS. 27/04/26 -F. COSTA CONS TRUTORA LTDA- EPP.

Valor **10.337,25**

(dez mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.337,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/ 1	EX	990187		R\$ 10.337,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.337,25
TOTAL . . . . .					R\$ 10.337,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.337,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.337,25**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	043001	10.337,25
TOTAL . . . . .			R\$ 10.337,25

Despesa paga em 30/04/2026 Com os recursos acima discriminados

Flavio Sebastiao Carlos Bitencourt  
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA  
Portaria N° 038/2026-CP



## Emissão de comprovantes

G3373013262908141  
30/04/2026 13:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.58  
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL  
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0  
=====

Convenio	PREFEITURA MUN TIMON - IP		
Codigo de Barras	81670000103-4	37254542202-7	
	60512034214-8	52880003000-9	
Data do pagamento		30/04/2026	
Valor Total		10.337,25	

-----

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A1B.501.8E1.6D5.7F4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA**  
 CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA E ITAU</b>				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON</b>				Emissao 29/04/2026			
				IRRF /2026			
				IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
No. Registro <b>6549</b>	Item <b>1</b>	Parcela <b>ÚNICA</b>	No. do documento <b>42145294</b>	Vencim Original <b>11/05/2026</b>	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo <b>2.480,94</b>	(+) Atualização <b>0,00</b>	(+) Multa/Mora <b>0,00</b>	(+) Juros <b>0,00</b>	(-) Descontos <b>0,00</b>	Valor do Documento <b>2.480,94</b>		
Insc. Contribuinte 754	Insc. Econômico 11		Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14				
Nome ou Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON</b> PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160							

Historico  
 IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 166 EMITIDA EM 27/04/2026 COM N° DE PROC. 43/2026.



IRRPJ  
 Impresso por CRISTIANE ARAItb196

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON</b> <b>SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA</b> CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO					<b>IRRF /2026</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>		
Numero da Taxa <b>6549</b>	Inscrição do Contribuinte <b>754</b>	No. Crédito <b>42145294</b>	Parcela <b>ÚNICA</b>	Vencim Original <b>11/05/2026</b>	VENCIMENTO <b>11/05/2026</b>	VALOR DO IMPOSTO <b>2.480,94</b>	
Dados do Contribuinte						(+ ATUALIZAÇÃO <b>0,00</b> )	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON</b>						(+ MULTA <b>0,00</b> )	
Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14						(+ JUROS <b>0,00</b> )	
PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160						(+ TAXA DE EXPEDIENTE <b>0,00</b> )	
Historico						(+ Ônus Sucumbênciais <b>0,00</b> )	
IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 166 EMITIDA EM 27/04/2026 COM N° DE PROC. 43/2026.						(-) DESCONTOS <b>0,00</b>	
						VALOR COBRADO <b>2.480,94</b>	

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

**PAGUE VIA PIX**  
**QR CODE AO LADO**

VIA DO BANCO **8164000024 5 80944542202 9 60511664214 7 52940001000 3**

**SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA**

Praça São José, S/N  
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08725

PAGTO: 30/04/2026

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade.: TIMON

CEP: -

**Discriminação.:**

RECOLHIMENTO DE IRRF, SOBRE VALOR DA NF N° 166, EMISS. 27/04/26 -F. COSTA CON  
STRUTORA LTDA- EPP.

Valor **2.480,94**

(dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.480,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	EX	999013		R\$ 2.480,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,94
TOTAL . . . . .					R\$ 2.480,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.480,94**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	43002	2.480,94
TOTAL. . . . .			R\$ 2.480,94

Despesa paga em 30/04/2026 Com os recursos acima discriminados

*Flávio Sebastião Farias Bitencourt*  
Tescureiro Geral do Município de Timon-MA  
Portaria Nº 038 2026-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.58  
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====  
Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 8164000024-5 80944542202-9  
60511664214-7 52940001000-3

Data do pagamento 30/04/2026

Valor Total 2.480,94

-----  
DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: A.067.513.989.43B.91D

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28  
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL  
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.791.000.200.036
VALOR TOTAL	11.370,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMT FDO PARTICIPACAO  
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 200.036-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359

=====

NR.AUTENTICACAO A.4E6.973.913.BDE.375

Transação efetuada com sucesso por: JI607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.
