

11ª MEDIDA

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 0018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 (próprio)

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 300.785,69

Teresina, 24 de outubro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG.1.874.616SSPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 11ª (décima) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA

COSTA:81764197372

Dados: 2025.10.24 13:30:39 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	01

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 11ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (11ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.


Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 300.785,69** (trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) correspondente a um percentual **5,34%**, relativos à 11ª boletim de medição, totalizando **89,55%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 25 DE SETEMBRO 2025 E 27 DE OUTUBRO DE 2025.

Este é o nosso parecer.


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 27 de outubro de 2025.

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 11				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84													
1.1		SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	2.260,00	4.203,60	76,81%	-	-	2,99%	18.743,59	480.817,30	76,81%			
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	112,75	1.855,87	100,00%	-	-	0,00%	2.260,00	4.203,60	100,00%			
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	563,73	191.504,72	100,00%	-	-	0,00%	112,75	1.855,87	100,00%			
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRODA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	4.263,60	55.682,62	75,57%	901,20	11.769,67	15,97%	5.164,80	67.452,29	91,55%			
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	19.618,15	227.570,50	64,16%	601,20	6.973,92	1,97%	20.219,35	234.544,42	66,12%			
2			INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%												
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	563,72	279.042,86	100,00%	-	-	0,00%	563,72	279.042,86	100,00%			
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	563,73	130.730,04	100,00%	-	-	0,00%	563,73	130.730,04	100,00%			
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	3.382,59	333.895,15	100,00%	-	-	0,00%	3.382,59	333.895,15	100,00%			
3			SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%												
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	45,10	14.882,43	100,00%	-	-	0,00%	45,10	14.882,43	100,00%			
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	45,11	16.356,88	100,00%	-	-	0,00%	45,11	16.356,88	100,00%			
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	28,50	11.026,94	63,19%	16,61	6.424,64	36,82%	45,11	17.451,58	100,00%			
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	39,10	18.186,58	86,71%	5,99	2.786,13	13,28%	45,09	20.972,71	100,00%			
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%												
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	422,10	38.406,88	62,40%	422,10	-	0,00%	422,10	38.406,88	62,40%			
5			PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%												
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	563,74	16.619,19	100,00%	-	-	0,00%	563,74	16.619,19	100,00%			
5.2	C3410	SEINFRA	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.691,20	521.497,88	100,00%	-	-	0,00%	1.691,20	521.497,88	100,00%			
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,77	22,88 %	22.549,52	1.288.028,77	100,00%	-	-	0,00%	22.549,52	1.288.028,77	100,00%			
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%												
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

Maícel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/7
Portaria N. 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

3105/25
Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 11				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
7	95571	SINAPI	GALERIAS TUBULARES	M	225,50	92,14	118,69	148.115,79	2,63%		51.822,91	34,99%		69.736,00	47,08%		121.558,91	82,07%			
								26.765,01	0,48 %	-	0,00%	100,00	11.869,00	44,35%	100,00	11.869,00	44,35%				
7.2	92824	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32 %	75,40	6.108,91	33,44%	150,00	12.153,00	66,52%	225,40	18.261,91	99,96%			
7.3	92223	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %	100,00	45.714,00	44,35%	100,00	45.714,00	44,35%	200,00	91.428,00	88,69%			
8	94273	SINAPI	DIVERSOS	M	9.020,78	39,61	51,03	2.037.914,59	36,20%		1.539.692,27	75,55%		203.095,33	9,97%		1.742.787,60	85,52%			
								460.330,61	8,18 %	-	0,00%	9.020,78	460.330,40	100,00%	-	-	0,00%	9.020,78	460.330,40	100,00%	
8.2	94265	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %	4.511,09	197.269,97	100,00%	-	-	0,00%	4.511,09	197.269,97	100,00%			
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89 %	9.018,68	500.356,33	100,00%	-	-	0,00%	9.018,68	500.356,33	100,00%			
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %	249,50	17.669,59	14,75%	465,20	32.945,46	27,51%	714,70	50.615,05	42,26%			
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74 %	249,50	39.393,56	14,75%	445,20	70.292,63	26,32%	694,70	109.686,18	41,08%			
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65 %	225,48	36.762,26	100,00%	-	-	0,00%	225,48	36.762,26	100,00%			
8.7	CPU SEINFRA TIMON/7 24	Próprio	CAVALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29 %	218,80	287.910,17	81,31%	50,30	66.187,76	18,69%	269,10	354.097,93	100,00%			
8.8	73882/00 5	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %	-	-	0,00%	295,45	33.669,48	32,91%	295,45	33.669,48	32,91%			
					Total Geral							4.741.006,07	84,21%		300.785,69	5,34%	5.041.791,76	89,55%			

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 191911257-9
Portaria N. 0146 2025-GP SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 1105/25
Folha N° 010
Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	-
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	-
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	-
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	901,20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	601,20
2			INFRAESTRUTURA			
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	-
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	-
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	-
3			SUPERESTRUTURA			
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	16,61
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	5,99
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E	m²	676,45	-
5			PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	-
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	-
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	-
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	-

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

1105/25

Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
			TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	100,00
7.1	95571	SINAPI				
			ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	150,00
7.2	92824	SINAPI				
			TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	100,00
7.3	92223	SINAPI				
8			DIVERSOS			
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	-
8.1	94273	SINAPI				
			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-
8.2	94265	SINAPI				
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	-
8.3	94288	SINAPI				
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	465,20
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	445,20
			EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	-
8.6	94293	SINAPI				
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269,10	50,30
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	295,45

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 1105/25
Folha N° 6102
Assinatura

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDICÇÃO Nº: 11			
MEDICÇÃO Nº	QUADRO - RESUMO FINANCEIRO		PERÍODO CORRESPONDENTE
	VALOR TOTAL MEDIDO	PORCENTAGEM	
	MONETÁRIO		INÍCIO FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024 05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024 25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024 11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025 14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025 10/04/2025
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/04/2025 28/05/2025
7ª	R\$ 451.510,46	8,02%	29/05/2025 26/06/2025
8ª	R\$ 506.114,74	8,99%	27/06/2025 24/07/2025
9ª	R\$ 502.073,22	8,92%	25/07/2025 26/08/2025
10ª	R\$ 351.238,23	6,24%	27/08/2025 24/09/2025
11ª	R\$ 300.785,69	5,34%	25/09/2025 27/10/2025
ACUMULADO	R\$ 5.041.791,76	89,55%	
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56		



SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

Construindo agora o futuro

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMONIMA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATO Nº: 18/2024 CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22											
MEDIÇÃO Nº: 11			Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 26/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2026	9º Med 26/08/2025	10º Med 24/09/2025	11º Med 27/10/2025	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	63.415,66	18.743,59	
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67	48.011,29		
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68	9.210,77	
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12	-	-	
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58		
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.822,91	69.736,00	
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	154.879,11	203.095,33	
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%	5,34%	
Custo			443.643,24	426.093,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	361.238,23	300.785,69	
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%	89,55%	
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,62	4.389.767,84	4.741.006,07	5.041.791,76	


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 191912379
Portaria N° 0146 2025-6P-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N°	3105/25
Folha N°	0101
Assinatura	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

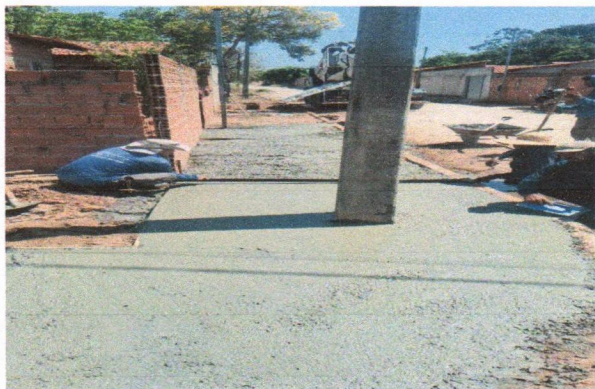


3.3 Concreto



3.3 Concreto



3.3 Concreto

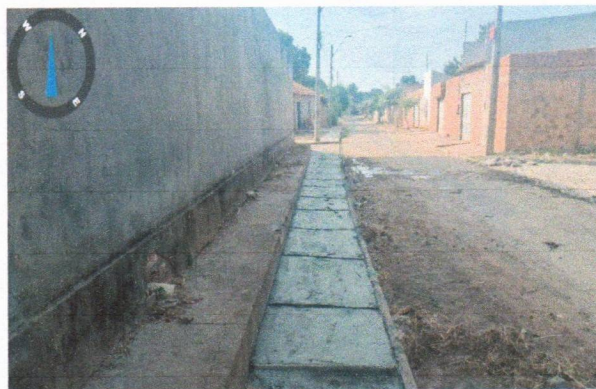

3.3 Concreto



3.3 Concreto



3.3 Concreto

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-48

1105/25

Assinatura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



3.3 Concreto

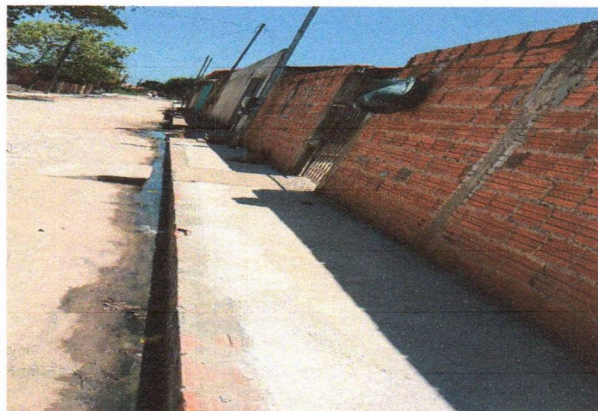

3.3 Concreto



3.3 Concreto



7.1 Tubo de Concreto



7.1 Tubo de Concreto



1.5 Demolição e remoção de pavimento em paralelepípedo e poliédrico

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Folha N°

1105/25

6/10/25

Assinatura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11ª Medição

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



8.7 Canaletas

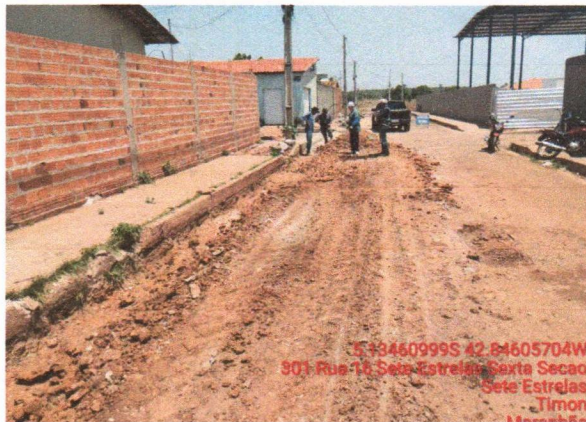


8.4 Corte manual em terra

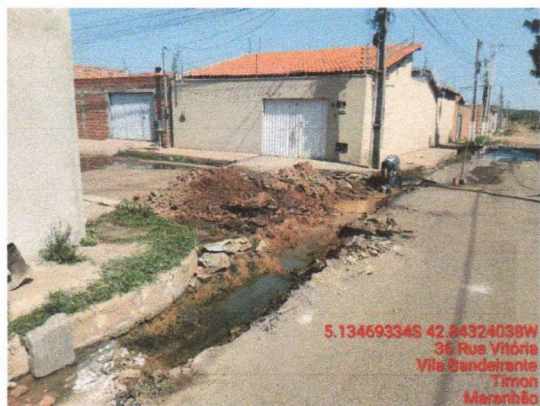

1.4 Retira de meio fio



8.7 Canaletas

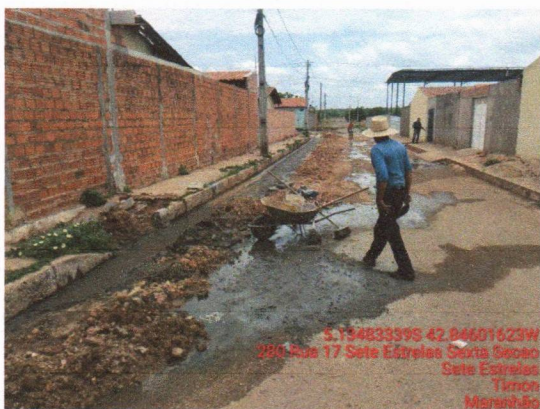

8.7 Canaletas



1.5 Demolição e remoção de pavimento

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11ª Medição

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



8.7 Canaletas



8.4 Corte manual em terra

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Previsão de término: 31/03/2027

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 28/03/2025 12:33:01

Local

data

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1cYZ
Impresso em: 28/03/2025 às 12:33:01 por: , ip: 138.0.234.198

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303



Proc Nº 3305/25
Folha Nº 6
Assinatura



Teresina, 27 de outubro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 300.785,69 (Trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais vinte e sessenta e nove centavos), referente a 11ª (décima primeira) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27 17:38:01 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 0100



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Bmmm0MHxp

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 15:52:01
Competência 10/2025
Número / Série 146 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.537.410/0001-22
Nome / Nome Empresarial
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP
Endereço
CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07 1 S/N VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal 463993-6
Telefone (86) 3212-2837
E-mail CLARICESOARES27@HOTMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64069-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.115.307/0001-14
Nome / Nome Empresarial
PREF MUNICIPAL DE TIMON
Endereço
PRACA SAO JOSE CENTRO


Inscrição Municipal -
Telefone (86) 99472-5158
E-mail f.costaconstrutoraltda@gmail.com
Município TIMON / MA BRASIL
CEP 65630-160

SERVIÇO PRESTADO

CBO
4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço TIMON / MA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TIMON-MA



Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN TIMON - MA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
300.785,69	60.157,14	0,00	240.628,55	5,000000	12.031,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.609,42	0,00	0,00	3.308,64	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
240.628,55	6.918,06	0,00	0,00	293.867,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Proc Nº 3105/25
Folha Nº
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO

R\$ 300.785,69

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 300.785,69 (Trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente a 11ª (décima primeira) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000146.

Teresina, ____ de ____ 2025.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27 17:38:18 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 01

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA, CONTRATO 018/2024

Orçamento Síntese										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR						MEDIÇÃO ATUAL 11						MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E REMOÇÕES					625.961,84																				
1.1	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %		2.260,00	4.203,61	100,00 %	-	-	0,00 %	2.260,00	4.203,61	100,00 %	-	-	0,00 %	2.260,00	4.203,61	100,00 %	-	-	0,00 %
1.2	SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %		112,75	1.855,87	100,00 %	-	-	0,00 %	112,75	1.855,87	100,00 %	-	-	0,00 %	112,75	1.855,87	100,00 %	-	-	0,00 %
1.3	C1049	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %		563,73	191.504,72	100,00 %	-	-	0,00 %	563,73	191.504,72	100,00 %	-	-	0,00 %	563,73	191.504,72	100,00 %	-	-	0,00 %
1.4	C3373	RETRABALHO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %		4.263,60	55.682,62	75,57 %	901,20	11.769,67	15,97 %	5.164,80	67.452,29	91,55 %									
1.5	C3064	REMOÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	m²	30,579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %		19.618,15	227.570,50	64,16 %	601,20	6.973,92	1,97 %	20.219,35	234.544,42	66,12 %									
2		INFRAESTRUTURA					743.668,81	13,21 %																			
2.1	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/ÁREA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %		563,72	279.042,86	100,00 %	-	-	0,00 %	563,72	279.042,86	100,00 %	-	-	0,00 %	563,72	279.042,86	100,00 %	-	-	0,00 %
2.2	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LOCO DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %		563,73	130.730,04	100,00 %	-	-	0,00 %	563,73	130.730,04	100,00 %	-	-	0,00 %	563,73	130.730,04	100,00 %	-	-	0,00 %
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,15	5,93 %		3.382,59	333.895,15	100,00 %	-	-	0,00 %	3.382,59	333.895,15	100,00 %	-	-	0,00 %	3.382,59	333.895,15	100,00 %	-	-	0,00 %
3		SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24 %																			
3.1	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %		45,10	14.882,43	100,00 %	-	-	0,00 %	45,10	14.882,43	100,00 %	-	-	0,00 %	45,10	14.882,43	100,00 %	-	-	0,00 %
3.2	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %		45,11	16.356,88	100,00 %	-	-	0,00 %	45,11	16.356,88	100,00 %	-	-	0,00 %	45,11	16.356,88	100,00 %	-	-	0,00 %
3.3	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %		28,50	11.026,94	63,19 %	16,61	6.424,64	36,82 %	45,11	17.451,58	100,00 %									
3.4	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %		39,10	18.186,58	86,71 %	5,99	2.786,13	13,28 %	45,09	20.972,71	100,00 %									
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,00 %																			
4.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %		422,10	38.406,88	62,40 %	-	-	0,00 %	422,10	38.406,88	62,40 %									
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,59	32,44 %																			
5.1	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %		563,74	16.619,19	100,00 %	-	-	0,00 %	563,74	16.619,19	100,00 %	-	-	0,00 %	563,74	16.619,19	100,00 %	-	-	0,00 %
5.2	C3410	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %		1.691,20	521.497,88	100,00 %	-	-	0,00 %	1.691,20	521.497,88	100,00 %	-	-	0,00 %	1.691,20	521.497,88	100,00 %	-	-	0,00 %
5.3	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %		22.549,52	1.288.028,77	100,00 %	-	-	0,00 %	22.549,52	1.288.028,77	100,00 %	-	-	0,00 %	22.549,52	1.288.028,77	100,00 %	-	-	0,00 %
6							116.955,94	2,08 %																			

FRANKLAND Assinado de forma digital por E FELIX DA FRANKLAND DE FELIX COSTA:8176 COSTA81764197372 4197372 Dados: 2025.10.27 17:32:11 -03'00'

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MÁ. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL 11		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
6.1	83624	SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6.2	C4327	SEINFRA GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

FRANKLANDE Assinado de forma

FELIX DA digital por

COSTA:817641 FRANKLANDE FELIX DA

97372 DADOS: 2025.10.27

17:32:25 -03'00'

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Obra

Orçamento Síntico										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 11				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
7			GALÉRIAS TUBULARES																		
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	92,14	118,69	148.115,79	2,63%	-	51.822,91	34,99%	100,00	11.869,00	44,35%	100,00	121.558,91	82,07%			
								26.765,01	0,48%		-	0,00%					11.869,00	44,35%			
7.2	92824	SINAPI	ASSESTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32%	75,40	6.108,91	33,44%	150,00	12.153,00	66,52%	225,40	18.261,91	99,96%			
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%	100,00	45.714,00	44,35%	100,00	45.714,00	44,35%	200,00	91.428,00	88,69%			
8			DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%		1.539.692,27	75,55%		203.095,33	9,97%		1.742.787,60	85,52%			
8.1	94273	SINAPI	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18%	9.020,78	460.330,40	100,00%	-	-	0,00%	9.020,78	460.330,40	100,00%			
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50%	4.511,09	197.269,97	100,00%	-	-	0,00%	4.511,09	197.269,97	100,00%			
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89%	9.018,68	500.356,33	100,00%	-	-	0,00%	9.018,68	500.356,33	100,00%			
8.4	CO930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13%	249,50	17.669,59	14,75%	465,20	32.945,46	27,51%	714,70	50.615,05	42,26%			
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74%	249,50	39.393,56	14,75%	445,20	70.292,63	26,37%	694,70	109.686,18	41,08%			
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65%	225,48	36.762,26	100,00%	-	-	0,00%	225,48	36.762,26	100,00%			
8.7	CPU SEINFRA TIMON/72 4	Próprio	CAVALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29%	218,80	287.910,17	81,31%	50,30	66.187,76	18,69%	269,10	354.097,93	100,00%			
8.8	73882/00 5	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82%	-	-	0,00%	295,45	33.669,48	32,91%	295,45	33.669,48	32,91%			
					Total Geral		5.629.973,56			4.714.006,07		84,21%	300.785,69		5,34%	5.041.791,76		89,55%			

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -									
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA					CONTRATO Nº: 18/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON					CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22				
MEDICÃO Nº: 11									
MEDICÃO Nº		QUADRO - RESUMO FINANCEIRO			PERÍODO CORRESPONDENTE				
		VALOR TOTAL MEDIDO		PORCENTAGEM		INÍCIO		FIM	
1ª		MONETÁRIO		R\$ 443,643.24		7.88%		10/22/2024	
2ª				R\$ 426,083.39		7.57%		11/6/2024	
3ª				R\$ 289,589.14		5.14%		12/11/2024	
4ª				R\$ 450,073.76		7.99%		3/14/2025	
5ª				R\$ 479,369.02		8.51%		4/10/2025	
6ª				R\$ 841,310.87		14.94%		5/28/2025	
7ª				R\$ 451,510.46		8.02%		6/26/2025	
8ª				R\$ 506,114.74		8.99%		7/24/2025	
9ª				R\$ 502,073.22		8.92%		8/26/2025	
10ª				R\$ 351,238.23		6.24%		9/24/2025	
11ª				R\$ 300,785.69		5.34%		10/28/2025	
ACUMULADO				R\$ 5,041,791.76		89.55%			
VALOR CONTRATO				R\$ 5,629,973.56					

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27 17:32:58 -03'00'

Proc Nº 1105/23
Folha Nº 0188
Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
			CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,260.00	-
1.1	73859/002	SINAPI				-
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112.75	-
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	-
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	901.20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	601.20
2			INFRAESTRUTURA			-
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	-
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	-
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	-
3			SUPERESTRUTURA			-
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	-
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	16.61
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45.09	5.99
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			-
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E PAVIMENTAÇÃO	m²	676.45	-
5			PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020			-
5.1	98681	SINAPI	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	563.74	-
5.2	C3410	SEINFRA		m²	1,691.20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	-
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			-
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	-
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	-

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27
17:33:11 -03'00'

F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158
Fone: (86) 3213-6396 / (86) 9 9472-5158 **E-mail:** f.costaconstrutoraltda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

Proc N° 1105/85
Folha N° 0102
Assinatura

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.50	100.00
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225.49	150.00
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.49	100.00
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,020.78	-
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,511.09	-
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,018.68	-
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1,691.20	465.20
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1,691.21	445.20
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	-
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269.10	50.30
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897.69	295.45

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:8176419
7372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27 17:33:24 -03'00'

F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158
Fone: (86) 3213-6396 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutoraltda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 6104
Assinatura

CBSA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATO Nº: 18/2024			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22						
MEDIÇÃO Nº: 11			Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 28/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2026	9º Med 26/08/2025	10º Med 24/09/2025	11º Med 28/10/2025		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	63.415,66	18.743,59		
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.982,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,87	48.011,29			
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68	9.210,77		
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12	-	-		
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58			
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.822,91	69.736,00		
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	154.879,11	203.095,33		
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%	5,34%		
Custo			443.643,24	426.083,39	289.599,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	351.238,23	300.785,69		
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%	89,55%		
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,62	4.389.767,84	4.741.006,07	5.041.791,76		


FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:81764197
372

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.27
17:33:34 -03'00'


Proc Nº 1105/25
Folha Nº 01
Assinatura

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

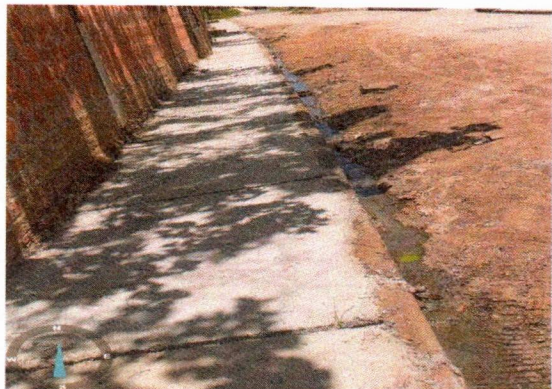

3.2 Concreto

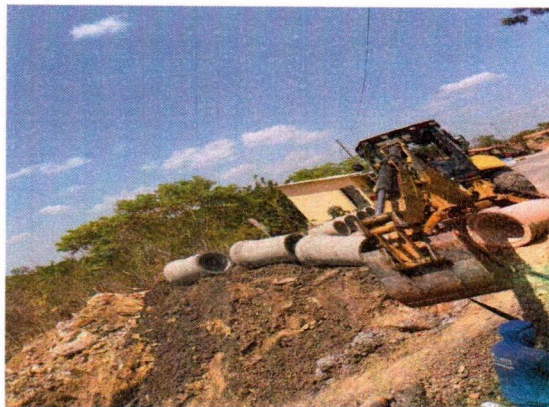


7.1 Tubo de Concreto

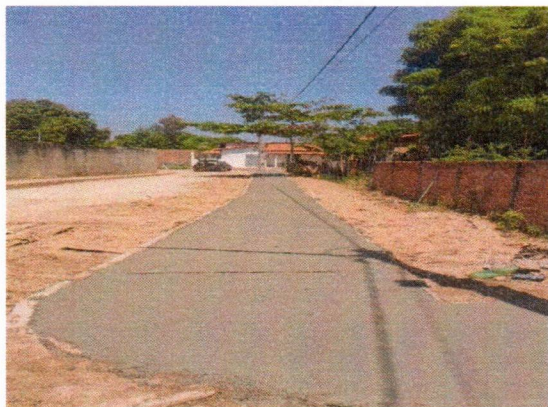


3.2 Concreto



7.1 Tubo de Concreto

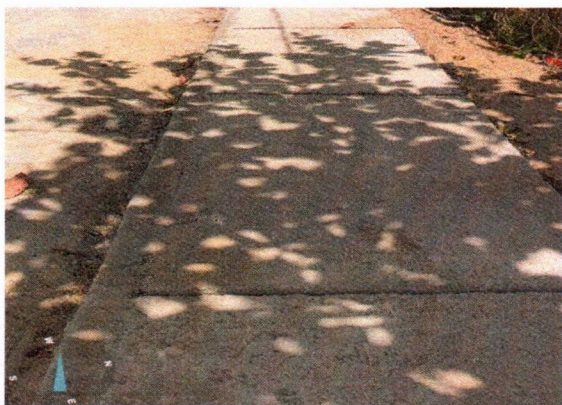


3.2 Concreto

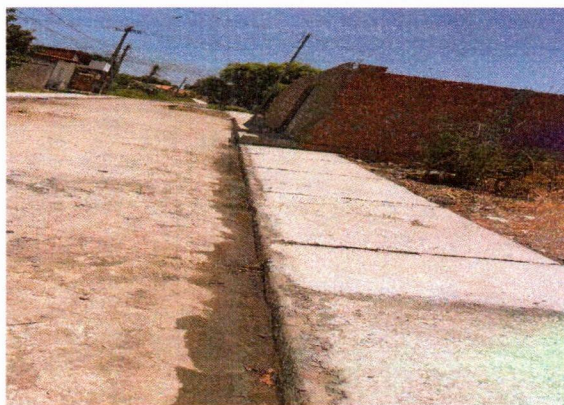

3.2 Concreto

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

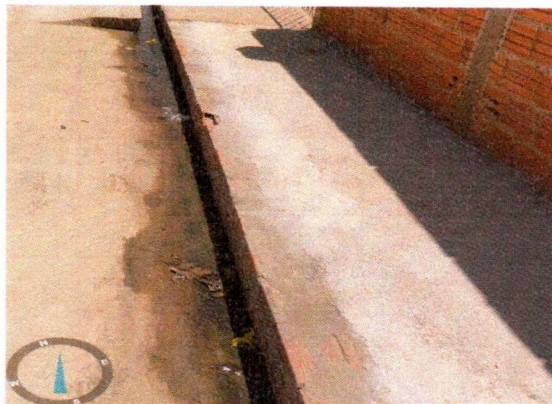


3.2 Concreto



7.1 Tubo de Concreto




3.2 Concreto

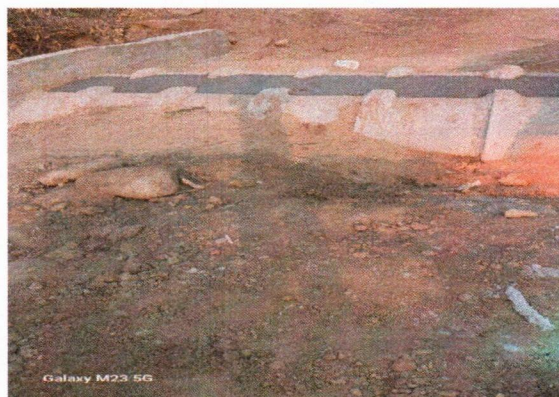

7.1 Tubo de Concreto




3.2 Concreto

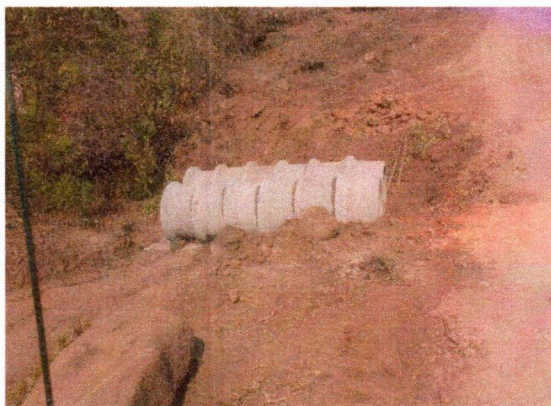

3.2 Concreto

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

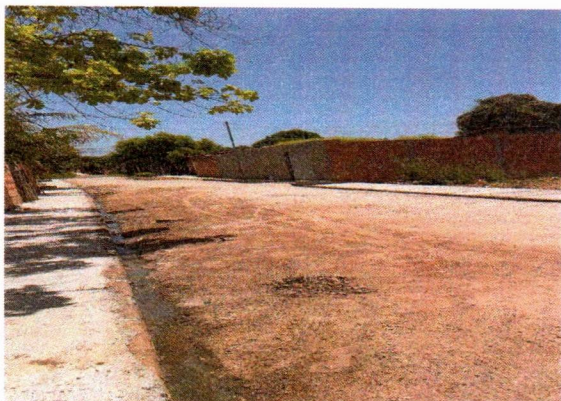

3.2 Concreto



3.2 Concreto




8.7 Canaletas



8.7 Canaletas



1.4 Retirada de meio fio

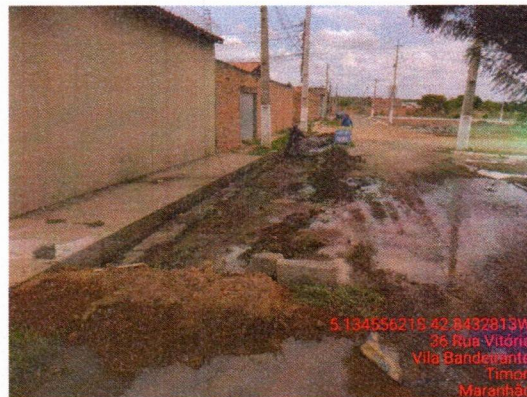


8.7 Canaletas

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.



8.7 Canaletas

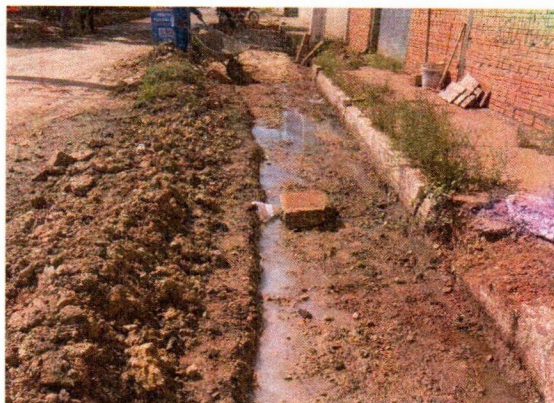

1.5 Demolição e remoção de pavimento

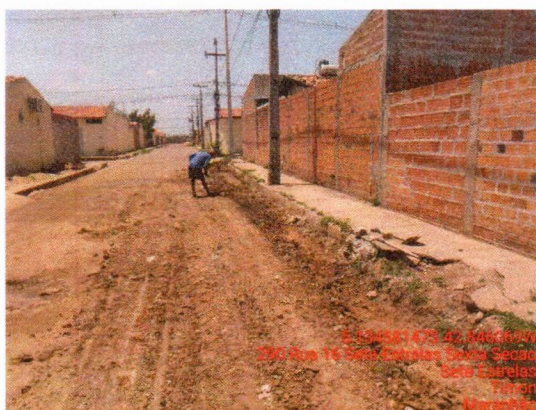

8.4 Corte manual de terra

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:8176419
7372

Assinado de forma
digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Data: 2025.10.27
17:33:24 -03'00'

Bruno Wladimir Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PIRN 1918219803



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.537.410/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:45:10 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2025.

Código de controle da certidão: **0F54.252F.8E86.EADC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc Nº	3105/25
Folha Nº	01/01
Assinatura	

Home > Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

Serviços do Contribuinte

Entrar com gov.br

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
217A.DCOF.7974.C512	Positiva com efeitos de negativa	16/10/2025 - 11:50:11	14/04/2026	Válida
4658.FB11.97A6.0748	Positiva com efeitos de negativa	03/10/2025 - 10:37:07	01/04/2026	Válida
6A01FF5D.305C.BCCE	Positiva com efeitos de negativa	30/09/2025 - 20:07:07	29/03/2026	Válida
C537.24D1.9C69.427C	Positiva com efeitos de negativa	03/09/2025 - 15:38:48	02/03/2026	Válida
9F45.8ED0.3CC6.62CE	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 21:49:01	01/03/2026	Válida

Exibir: 5 1-5 de 15 itens Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Saiba mais em nossa

Ver Política de Cookies

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Atestar
Omar

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: CJ SIGEFREDO PACHECO II SN QD H CASA 6 / VALE DO GAVIAO /
TERESINA / PI / 64069-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519454907643917

Informação obtida em 15/10/2025 09:12:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc N°	1105/25
Folha N°	01
Assinatura	



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.537.410/0001-22

Razão social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102601234907643961
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100519454907643917
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091607314907643945
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820314907643901
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121004907643920
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223374907643910
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320404907643981
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503194907643983
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603004907643947
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709174907643925
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902124907643970
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022154907643983
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908384907643923
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109144907643905
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202544907643919
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403304907643907
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503164907643914
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602254907643904
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809424907643944
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905584907643924
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020324907643971
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102374907643978
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307304907643913
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509074907643906
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603234907643905
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707514907643973
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906154907643945
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019464907643947
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101564736832050
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040200010515100000

Proc N° 1105/25
Folha N° 01014
Assinatura

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405113045063760
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022307404681425404
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402162340827137
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011607522183608265
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802371610559264
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902073373571865
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003024430108780
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105405024472574

Resultado da consulta em 28/10/2025 11:45:47

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Certidão nº: 39878296/2025

Expedição: 13/07/2025, às 20:23:50

Validade: 09/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.537.410/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318339210

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2025 13:05:45
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 932F7461-62CB-4FFB-97A2-47584666090C



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218339873

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2025 13:05:09
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 70BFB973-809C-464E-A07A-71D7A96709FD



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0308920/25-74

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:34:27 h, do dia 23/08/2025

Validade: 21/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4090807B00584300

Folha Nº 1105/25 Nº Via: 1

6102

[Confirmar](#) [Limpar](#)

Número da certidão *

0.308.920/25-74

Código da autenticidade

4090807B00584300

[Itens Obrig.](#)
[Pelo menos](#)

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 23/08/2025 às 18:34

Válida até 21/11/2025

Código controle 0.308.920/25-74


Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22 Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, 1 Complemento: S/N Bairro: BAIRRO VALE DO GAVIAO Cidade

Cep: 64.069-120

Para melhor acessar o site utilize:



CNPJ 27.537.410/0001-22	Razão Social F. COSTA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25276.2959663-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000389496359			Valor Total do Documento 3.401,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	547,88			547,88
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	254,98			254,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.564,37			1.564,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	463,60			463,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	117,32			117,32
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	195,54			195,54
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	15,64			15,64
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	78,21			78,21
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	117,32			117,32
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	46,93			46,93

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

03/10/2025 10:29:07

85890000034 4 01790385252 1 93071625276 6 29596632082 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 01790385252 1 93071625276 6 29596632082 3



CNPJ: 27.537.410/0001-22
Número: 07.16.25276.2959663-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.401,79

Pague com o PIX



Proc N°
Folha N°
3105/25
O. Ana

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.401,79			3.401,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.22
3507603507

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
EFETUADO POR: FRANKLANDE F COSTA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000034-4 01790385252-1
93071625276-6 29596632082-3
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25276.2959663-2
Valor Total 3.401,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 102003

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Proc N°	3105/25
Folha N°	0202
Assinatura	

CPF/CNPJ do Empregador
27.537.410

Nome/Razão Social do Empregador
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100395506263-5

Tag
27537410 09/2025 MENSAL

Valor a recolher

625,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	4	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72
Total FGTS:		625,72	0,00	0,00	0,00	625,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **625,72**

Observações

Data de geração da Guia: 03/10/2025 às 10:31:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 625,72

20/10/2025 às 17:52:05

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

060.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251020205159142275138

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 6233e5fbe95c491391ba24550efa95f3

Documento: 000000000102004

Proc N° 3105/25
Folha N° 01
Assinatura

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72
Número da Guia: 0125100395506263-5 Data Emissão: 03/10/2025 10:31:05 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Inscrição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	20/10/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
09/2025		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	20/10/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
09/2025		GRIGORIO BASILIO DA SILVA NETO	178-0020	025.573.143-40	101	20/10/2025	Mensal	1.533,50	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68
09/2025		JULIO CESAR SOUSA FREITAS	178-0019	058.500.333-51	101	20/10/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
Total do Tomador								Sem Tomador	7.821,86	625,72	0,00	0,00	625,72
Total do Estabelecimento								27.537.410/0001-22	7.821,86	625,72	0,00	0,00	625,72
								Total FGTS	7.821,86	625,72	0,00	0,00	625,72

Proc N° 3105/25
Folha N° 01
Assinatura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Origem: Gestão de Guias 4
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (FGTS): 625,72
Número da Guia: 0125100395506263-5 Data Emissão: 03/10/2025 10:31:05 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
		Total FGTS	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72

scrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
2 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
3 - Empregado - Agente
4 - Empregado - Doméstico
5 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.091/1988
6 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.091/1988
7 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
8 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
9 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
1 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
2 - Trabalhador avulso por conta própria
3 - Trabalhador avulso por conta própria
4 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
5 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
6 - Exercício de mandato eletivo
7 - Exercício de mandato eletivo
8 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
9 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
1 - Militar
2 - Militar
3 - Militar
4 - Militar
5 - Militar
6 - Militar
7 - Militar
8 - Militar
9 - Militar
1 - Agente público - Outros
2 - Agente público eventual
3 - Agente público eventual
4 - Agente público eventual
5 - Agente público eventual
6 - Agente público eventual
7 - Agente público eventual
8 - Agente público eventual
9 - Agente público eventual
1 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
2 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
3 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
4 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
5 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
6 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
7 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
8 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
9 - Diretor de Serviço Social - Informação prestada pelo sindicato
1 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
2 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
3 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
4 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
5 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
6 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
7 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
8 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
9 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
1 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
2 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
3 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
4 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
5 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
6 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
7 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
8 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
9 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
1 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
2 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
3 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
4 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
5 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
6 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
7 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
8 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
9 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
1 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
2 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
3 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
4 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
5 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
6 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
7 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
8 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
9 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
1 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
2 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
3 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
4 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
5 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
6 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
7 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
8 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
9 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
1 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
2 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
3 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
4 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
5 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
6 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
7 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
8 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
9 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
1 - Bolista, nos termos da Lei 8.558/1994
2 - Bolista, nos termos da Lei 8.558/1994
3 - Bolista, nos termos da Lei 8.558/1994
4 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
5 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Proc N° 3605/85
Folha N° 01
Assinatura

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72
Número da Guia: 0125100395506263-5 Data Emissão: 03/10/2025 10:31:05 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	27.537.410/0001-22	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
Total FGTS			7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Encimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125100395506263-5 Data Emissão: 03/10/2025 10:31:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72

Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22	Comp. Auração: 09/2025	Tipo de Valor: 11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores: 4	Base Remuneração Total: 7.821,86	FGTS Mensal na Guia: 625,72	FGTS Rescisório na Guia: 0,00	Ind. Compensatória na Guia: 0,00	Juros: 0,00	Atualiz. Monetária: 0,00	Multa: 0,00	Total: 625,72
			Total FGTS	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72

Proc Nº 3105/23

Folha Nº 01

Assinatura

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72
Número da Guia: 0125100395506263-5 Data Emissão: 03/10/2025 10:31:05 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
Total FGTS		7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72

Proc N° 3105/25
Folha N° 01
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.537.410/0001-22
Nome	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34924433885 / eSocial 124490046 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 867,86	R\$ 802,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.145,29	R\$ 2.145,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 453,64	R\$ 453,64
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.466,79	R\$ 3.401,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANKLANDE FELIX DA COSTA
CPF	817.641.973-72
Telefone	3221-0969

Proc Nº	1105/05
Folha Nº	0100

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/10/2023 10.23.36

Nº do recibo de entrega 0000050000389496359

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 27.537.410/0001-22

Proc Nº	3305/25
Folha Nº	01009
Assinatura	



TIMON
PREFEITURA

Construindo agora o futuro

SEINFRA

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 018/2024 celebrado entre o MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, e a empresa **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.**

Fundamentação: Arts. 107 e 124, II, b da Lei nº 14.133/2021; Proc. Administrativo nº 2979/2024, Modalidade: Concorrência nº 006/2024.

O MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 06.115.307/0001-14, situada na Avenida Paulo Ramos, s/nº, Centro, com CEP 65.630-140, Timon - MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MARCEL ALMEIDA SOARES**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, escrito no CPF sob nº 791.274.103-82, nomeado pela portaria nº 022/2025-GP, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.537.410/0001-22, com endereço no Conjunto Sigefredo Pacheco II, Quadra C 06, casa 07, Vale do Gavião, Teresina-PI, CEP: 64.069-120, neste ato representada pelo Sr. **Franklande Felix da Costa**, brasileiro, administrador, casado, portador do RG nº 1.874.616 SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 817.641.973-72, residente na Rua Maria José de Aguiar, nº 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI, CEP: 64057-382, doravante chamada **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e, por acordo mútuo entre seus representantes legais infra-assinado, resolvem celebrar aditivo ao supracitado contrato, segundo cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de nº 018/2024, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon/MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO

O **prazo de vigência** do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, estendendo-se assim, pelo **período de 22/10/2025 a 22/10/2026.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aqui aditado.

Proc. Nº	1105/25
Folha Nº	5
Assinatura	



TIMON
PREFEITURA

Construindo agora o futuro

SEINFRA

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Timon, Estado do Maranhão, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 2 (Duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (Duas) testemunhas instrumentárias.

Timon - MA, 10 de outubro de 2025.

Marcel Almeida Soares
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria N° 022/2025-GP
CPF: 791.274.103-82

Marcel Almeida Soares
Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura de Timon-MA
CONTRATANTE

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.10.10 12:13:58
-03'00'

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Franklande Felix da Costa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª) *Sra Raquel de Almeida* CPF nº *188 903 638-35*
2ª) *Renato de Oliveira Pires* CPF nº *027 626 073-29*

Proc. N°	<i>1105/25</i>
Folha N°	<i>1</i>
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>



TIMON
PREFEITURA

Construindo agora o futuro

SEINFRA

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

**SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024
MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO**

Termo Aditivo nº: 02/2025

Contrato nº 018/2024 - SEINFRA

Processo Administrativo nº 2979/2024

Concorrência nº 006/2024

Fundamentação Legal: Arts. 107 e 124, II, b da lei nº 14.133/2021

Contratante: Município de Timon, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Contratado: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Objeto: Aditivo ao valor do Contrato de n.º 018/2024, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon/MA.

Projeto/Atividade: 2005 – recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 1.500 – próprios

Valor do contrato: R\$ 7.037.466,95 (sete milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Prazo de Vigência: 22/10/2025 a 22/10/2026

Data da assinatura: 10/10/2025.

Proc. Nº	1105128
Folha Nº	5
Assinatura	
Página 1 de 1	

Fonte de Recurso: 1.500 - próprio
Valor do contrato: R\$ 184.049,64 (cento e oitenta e quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Prazo de Vigência: 29/08/2025 a 28/02/2026
Data da assinatura: 27/08/2025.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO**

Termo Aditivo nº: 01/2025
Contrato nº 001/2025 - SEINFRA
Processo Administrativo nº 3010/2025
Adesão a Ata SRP nº 16/2024, da Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA
Fundamentação Legal: Art. 124 e 125, da Lei 14.133/2021
Contratante: Município de Timon, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Contratado: AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 08.238.376/0001-15
Objeto: Aditivo ao valor do Contrato de nº 001/2025, que tem como objeto a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, para atender as demandas do município de Timon/MA.
Projeto/Atividade: 1030 - manutenção da Sec. De Obras e Infraestrutura
Elemento de Despesa: 3.3.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 - próprios
Valor aditivado: R\$ 1.273.192,20 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, cento e dois reais e vinte centavos).
Valor Global: R\$ 6.365.511,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais).
Data da assinatura: 06/10/2025.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO

Termo Aditivo nº: 02/2025
Contrato nº 018/2024 - SEINFRA
Processo Administrativo nº 2979/2024
Concorrência nº 006/2024
Fundamentação Legal: Arts. 107 e 124, II, b da lei nº 14.133/2021
Contratante: Município de Timon, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Contratado: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.537.410/0001-22
Objeto: Aditivo ao valor do Contrato de nº 018/2024, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon/MA.
Projeto/Atividade: 2005 - recuperação e conservação de ruas pavimentadas
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 - próprios
Valor do contrato: R\$ 7.037.466,95 (sete milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de Vigência: 22/10/2025 a 22/10/2026
Data da assinatura: 10/10/2025.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO

TERMO ADITIVO Nº 001 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013B/2024.
Processo Administrativo 3169/2025-SEMAG.
Fundamentação Legal: O presente termo aditivo é celebrado com base no art. 64, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Contratante: Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - SEMAG.
CNPJ da Contratante nº 06.115.307.0001-14.
Contratado: A F L MENDES COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 53.075.507/0001-70.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 013B/2024, cujo objeto é o Registro de Preço para futura aquisição de equipamentos submersíveis para poços tubulares (unidade de bombeamento - conj. motobombas), materiais hidráulicos (tubos, conexões e afins) e ferramentas para sistema de abastecimento de água, destinados a atender às eventuais demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Timon/MA.
Vigência: 17/07/2025 Até 17/10/2026.
Data da assinatura: 17 de outubro de 2025.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO

TERMO ADITIVO Nº 003/2025 AO CONTRATO Nº 008/2022-SMTTM.
OBJETO DO ADITIVO: prorrogação da vigência do contrato original, prestação de serviços do sistema de gestão e registro de infrações e apoio ao trânsito: talonário eletrônico de multas de trânsito.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE (SMTTM), CNPJ nº 59.614.377/0001-83.
CONTRATADA: 22.093.636/0001-68 - SYSLAE SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: Timon/MA, 09/10/2025.

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO**MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO**

Na publicação do EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2025, veiculada na Edição Extraordinária nº 3.262-A do Diário Executivo do Município de Timon, em 03 de outubro de 2025.

ONDE SE LÊ:

"O presente termo aditivo consiste em acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, equivalente a R\$ 1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais), elevando o valor global de R\$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais) para R\$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais) (...)."

LEIA-SE:

"O presente termo aditivo consiste em acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, equivalente a R\$ 1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais), elevando o valor global de R\$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais) para R\$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais), bem como prorrogação da vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original."

Permanecem inalteradas as demais informações.

Timon - MA, 03 de outubro de 2025.

Mariely de Almeida Vilhena Ponte

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania

Portaria nº 026/2025 - GP

EXTRATO DE CONCESSÃO DIÁRIAS

No Extrato de Concessão de Diárias, publicado no Diário Oficial do Município de Timon nº 3.256, de 25 de setembro de 2025, página 2, referente ao Favorecido: ITAMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR,

Onde se lê: Portaria de Concessão: 0112/2025-GP

Leia-se: Portaria de Concessão: 0113/2025-GP

No Extrato de Concessão de Diárias, publicado no Diário Oficial do Município de Timon nº 3.271, de 25 de setembro de 2025, página 6, referente ao Favorecido: ITAMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR,

Onde se lê: Destino: PARAIBA-PB

Leia-se: Destino: JOÃO PESSOA-PB

Portaria de Concessão nº 0127/2025- GP

Favorecido: RAIMUNDO PEREIRA DA CUNHA NETO

Cargo/Função: Presidente

Órgão/lotação: ATJ

Destino: Timon-MA/Fortaleza-CE/Timon-MA

Período: 21.10.2025 a 24.10.2025

Quantidade de Diárias: 04 (quatro)

Valor Unitário: R\$ 520,00 Valor Global: R\$ 2.080,00

Finalidade: visita técnica à empresa Arrow Security com o objetivo de conhecer tecnologias, soluções e serviços voltados à segurança da informação, proteção de dados e infraestrutura cibernética.

Portaria de Concessão nº 0128/2025- GP

Favorecido: ROMAURO LUIZ VANDERLEY DE OLIVEIRA

Cargo/Função: Presidente

Órgão/lotação: IPMT

Destino: Timon-MA/São Luis-MA/Timon-MA

Período: 20.10.2025 a 22.10.2025

Quantidade de Diárias: 03 (três)

Valor Unitário: R\$ 260,00 Valor Global: R\$ 780,00

Finalidade da Viagem: Tratar de assuntos de interesse do IPMT junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE), referente ao Relatório de Instrução nº 8341/2025, processo nº 1918/2025 de Natureza a apreciação da legalidade dos Atos de Pessoal

Portaria nº 062/2025-IPMT, DE 26 DE AGOSTO DE 2025.

Favorecido: LIVIA RAQUEL BORGES SIQUEIRA

Órgão: IPMT

Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Origem/Destino: TIMON/MA - SÃO LUIS/MA - TIMON/MA

Período: 20 e 22 de outubro de 2025.

Qtds. Diárias: 03 (três).

Valor Unitário: R\$ 260,00. Valor Total: R\$ 780,00.

Finalidade da Viagem: Assessorar o Presidente do IPMT, em assuntos de interesse do Instituto junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE - MA).

Portaria de Concessão nº 750/2025- GAB/SEMED

Favorecido: ANA LUCIA DA SILVA BEZERRA

Cargo/Função: SECRETARIA ADJUNTA

Órgão: Gabinete da Secretária Municipal de Educação-SEMED

Destino: Timon-MA/São Luis-MA /Timon-MA

Período: 28.10.2025 a 01.11.2025

Quantidade de Diárias: 05 (Cinco)

Valor Unitário: R\$ 230,00 Valor Global: R\$ 1.150,00

Finalidade: Participar do 13º Simposio Estadual dos CEM's do Maranhão.

Portaria de Concessão nº 748/2025- GAB/SEMED

Favorecido: ANTÔNIO NONATO DA CRUZ

Cargo/Função: MOTORISTA

Órgão: Gabinete da Secretária Municipal de Educação-SEMED

Destino: Timon-MA/São Luis-MA /Timon-MA

CERTIFICADO DIGITALMENTE
E COM CARIMBO DE TIMON

Praca São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 - Timon - MA

O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 29/10/2025 - 29/10/2025

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 06115307000114

DATA DE CRIAÇÃO: 29/10/2025 09:29:44

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8565384e-4e5d-4034-b393-c7e95f30e133

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

cnpj contratante	id contrato	tipo termo	numero termo	ano termo	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06115307000114	CP182024SEINFRA	5	2	2025	01364297345	29/10/2025	-	-	ENVIADO

Total Alteração Contratual: 1

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1570/021101 - Reanálise nº 1**Conclusão: Parecer Pleno**

PROCESSO Nº	1105/2025	NOTA FISCAL/FATURA Nº	146	REFERÊNCIA	set/25, out/25
ORGAO/ENTIDADE			SEINFRA		
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
701001 /2025 - OR	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	2.010.292,01	300.785,69	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 300.785,69	

I. Introdução

Analisei o processo nº 1105/2025, de pagamento da 11ª medição do do Contrato nº 018/2024, firmado entre o Município de Timon - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon - MA - SEINFRA e a Empresa F. Costa Construtora Ltda, que tem por Objeto, a "Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Manutenção e Conservação de Pavimentação, Canteiros, Sarjetas, Meio Fio, Galerias e Outros em Vias Públicas do Município de Timon - MA", de acordo com o Processo Administrativo Nº 1823/2024 e Concorrência Nº 006/2024, conforme roteiro de Pagamento de medição de obras, previamente definido pela CGM, conforme demonstrado a seguir.

II. Análise

Legenda: S = Sim N = Não

Pergunta	S	N
1. O processo da despesa foi analisado pela Controladoria Geral do Município antes do pagamento? Observação: Cumpre salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com o relatório apresentado pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não será objeto desta análise os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.	X	
2. A análise do controle interno foi realizada pela Controladoria Geral do Município após o pagamento da despesa ?		X

Pergunta	S	N
3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ? ☒ Solicitação de Execução de Despesa - SED; ☒ Nota de Empenho; ☒ Contrato e/ou Aditivos; ☒ Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM; ☒ Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA); ☒ Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato; ☒ Ordem de Fornecimento de Material/Serviço; ☒ Solicitação de Pagamento; ☒ Nota Fiscal; ☒ Recibo; ☒ Carta da Contratada encaminhando a medição; ☒ Memória de cálculo; ☒ Cronograma executivo (físico) realizado; ☒ Certificado de medição, definindo o período correspondente; ☒ Quadro resumo financeiro; ☒ Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; ☒ Certidões Negativas de Débito. ☒ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; ☒ Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; ☒ Outros (Especificar): Observação: De acordo com Relatório de Vistoria, Planilhas de Medição, Relatório Fotográfico, todos devidamente atestados pelo Engenheiro Fiscal do presente Contrato, Sr. MACIEL DO NASCIMENTO LOPES do Departamento de Engenharia e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (CREA N° 191911297-9), conforme Contrato n° 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 5,34% referente à 11ª medição, totalizando 89,55% do Valor do Contrato; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo. Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa? Qual a fonte de recurso utilizada? R.: <i>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</i>	X	
12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa? Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: <i>OF N° 29/2025, de 01/07/2025.</i>	X	

João

Pergunta	S	N
13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato? Qual número e o período de vigência do contrato? R.: <i>Contrato nº 018/2024. Prazo de Vigência: 12 meses: de 21/10/2024 a 21/10/2025. 2º Termo de aditivo: 22/10/2025 a 22/10/2026.</i> Qual o período de execução da medição? R.: <i>25/09/2025 a 27/10/2025.</i>	X	
14. Houve solicitação de pagamento (SP) ? Qual o número da Solicitação de Pagamento ? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i> Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>27/10/2025.</i>	X	
15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa? Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>146, DE 27/10/2025.</i> Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$) ? R.: <i>300.785,69.</i>	X	
16. O Recibo consta no Processo ?	X	
17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?		X
18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato? Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>R\$ 5.629.973,56.</i> Qual o valor já pago? R.: <i>R\$ 5.041.791,76 (incluindo este pagamento da 11ª medição do Contrato nº 018/2024).</i>	X	
19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período? Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 300.785,69</i> Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 300.785,69</i> Observação: Cabe ressaltar, a responsabilidade da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento e fiscalização das medições, bem como a verificação da qualidade das mesmas, já que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo. Salientamos ainda, a existência de atesto do fiscal do Contrato, designado nos autos do processo, reconhecendo a efetiva medição conforme contratado e apresentados na Nota Fiscal. Assim, uma vez que a regularidade da despesa foi atestada pelo mesmo, esta Controladoria não adentrou ao mérito da fiscalização atestada por ele, nem da autorização do pagamento realizada pelo ordenador da despesa.	X	
20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária? Qual o valor da medição apresentada? R.: <i>R\$ 300.785,69</i> Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: <i>R\$ 300.785,69</i> Observação: Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.	X	

Joanne

Pergunta	S	N
21. A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra? Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra? R.: <i>10/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i> Qual o período da medição? R.: <i>25/09/2025 a 27/10/2025.</i>	X	
23. A despesa se refere à pagamento da última medição?		X
24. A medição é referente ao prazo de execução equivalente ao mensal? Qual o mês correspondente da medição? R.: <i>10/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i>	X	
25. Foi apresentada pelo fornecedor, certidões válidas de regularidade fiscal? ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS; ☒ CERTIDÃO DE FGTS ☒ CERTIDÃO TRABALHISTA; Observação: Certidões válidas na data em que foi realizada esta análise. Dessa forma, faz-se necessária a renovação das CND's que estiverem vencidas, no ato do pagamento desta despesa.	X	
26. Trata-se de despesas de exercícios anteriores?		X
Conforme estabelecido no roteiro, as seguintes questões não se aplicaram à análise: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 27, 28, 29, 30.		

III. Conclusão

Em razão de não haver indícios de irregularidades ou impropriedades nos autos, de acordo com os requisitos analisados, concluo que a despesa deverá ser encaminhada para os procedimentos cabíveis.

Recomendações finais:


Cumpre salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com os relatórios, inclusive memorial fotográfico, apresentados pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não serão objeto desta análise, os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.

Salientamos ainda, que a presente análise é apenas de conformidade e leva em consideração os documentos apresentados e atestados pelo Gestor/Fiscal do Contrato, não sendo esta análise uma auditoria do serviço realizado e/ou do Contrato formulado.

Por fim, recomenda-se também que sejam realizadas as devidas retenções dos tributos incidentes e, posteriormente, o recolhimento dos mesmos aos respectivos órgãos arrecadadores, conforme Legislação vigente.

Josane

Timon-MA, 29 de outubro de 2025.


Joseane Tainan da Silva Dourado
Mat.: 2200828
Técnico de Nível Superior - Engenharia

Paraguaçu Santos Veras Filho
Mat.: 9221038-1
Controlador-Geral

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14				701001 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA: 327		DATA: 29/10/2025	
EMPENHO Nº: 701001					
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA		000006/24		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 29/10/2025					
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519	
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA 8ªMEDIÇÃO E DEMAIS SEGUINTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CTR 018/2024, COM O OBJETIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM 2025 REF. AOS MESES DE SET E OUT/25. CONFORME S E D Nº055/2025 E PARECER DA CGM Nº 1570/021101 - REANÁLISE Nº 1.					
OR				SOMA	
				300.785,69	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02 11 01		SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000		Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.010.292,01		1.660.211,88		300.785,69	
SALDO A LIQUIDAR		350.080,13			
VALOR A SER PAGO R\$		300.785,69			
trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.					
29/10/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93			
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		Marcel Almeida Soares Secretario Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82			
DATA					

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14				701001 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 327		DATA: 29/10/2025	
EMPENHO Nº: 701001					
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA		000006/24		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 29/10/2025					
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519	
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA 8ª MEDIÇÃO E DEMAIS SEGUINTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CTR 018/2024, COM O OBJETIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM 2025 REF. AOS MESES DE SET E OUT/25. CONFORME S E D Nº055/2025 E PARECER DA CGM Nº 1570/021101 - REANÁLISE Nº 1.					
OR				SOMA	
				-300.785,69	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02 11 01		SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000		Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.010.292,01		1.359.426,19		-300.785,69	
VALOR A SER PAGO R\$		-300.785,69		650.865,82	
		trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.					
29/10/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93			
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA		Marcel Almeida Soares Secretário Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82			

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14			701001 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 327	DATA: 29/10/2025	EMPENHO Nº: 701001
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA		000006/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025
NOME:	F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22	CÓDIGO: 23519
ENDEREÇO:	CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-e Nº 146 E PARECER DA CGM Nº 1570/021102-REANÁLISE Nº 1.				
OR				SOMA
				300.785,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 11 01	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000	Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.010.292,01	1.660.211,88	300.785,69	350.080,13	
VALOR A SER PAGO R\$		300.785,69		
trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.				
29/10/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93		
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		Marcel Almeida Soares Secretário Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82		
DATA				

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 23741

PAGTO: 03/11/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-e N° 146 E PARECER DA CGM N° 1570/021102-REANÁLISE N° 1.

Valor 300.785,69

(trezentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * *

Despesa Bruta: R\$ 300.785,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001 / 12	OR	021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300.785,69	R\$ 0,00	R\$ 18.949,50	R\$ 281.836,19
TOTAL					R\$ 300.785,69	R\$ 0,00	R\$ 18.949,50	R\$ 281.836,19

Despesa Líquida: R\$ 281.836,19

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	071646	281.836,19
TOTAL. . .			R\$ 281.836,19

Despesa paga em 03/11/2025 Com os recursos acima discriminados

 Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038 2025-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:56
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	281.836,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359
=====

NR. AUTENTICACAO	B.070.B85.171.6BC.2F3
------------------	-----------------------

TIMON-MA., 03 de novembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 146

DT/EMIS.: 27-out.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo pacheco II, Teresina -PI. **DADOS BANCÁRIOS:** BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 11ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do Município.. **ÓRGÃO DE ORIGEM:** SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	300.785,69
Pagamentos anteriores	
Valor da Ordem Bancária	300.785,69
Retenções	(18.949,50)
ISSQN	12.031,43
IRRF	3.609,43
INSS	3.308,64
Valor líquido pago	281.836,19
Saldo Remanescente	-

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 105.359-0/FEP

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 23742

PAGTO: 03/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COSTA CONSTRUTORA LTDA., CONFORME NFS-e Nº 146 EMITIDA EM 27/10/2025.

Valor 12.031,43

(doze mil e trinta e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.031,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
244	/ 1	EX	990187		R\$ 12.031,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.031,43
TOTAL					R\$ 12.031,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.031,43

Despesa Líquida: R\$ 12.031,43

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	110301	12.031,43
TOTAL. . .			R\$ 12.031,43

Despesa paga em 03/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Téc. Adm. Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038 2025-GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41647908	10/11/2025	ÚNICA	10/11/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		12.031,43
PRÇ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.10/2025 003						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte						(+) Ônus Sucumbenciais
MENSAGEM						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						12.031,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41647908	10/11/2025	ÚNICA	10/11/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		12.031,43
PRÇ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.10/2025 003						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via da Prefeitura						(+) Ônus Sucumbenciais
MENSAGEM						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						12.031,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

ISS/2025

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
11	754	41647908	ÚNICA	10/11/2025	10/11/2025	12.031,43
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
PRÇ SAO JOSE						(+) MULTA
CENTRO						0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.10/2025 003						0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						12.031,43

VIA DO BANCO

81610000120 4 31434542202 1 51110034164 9 79080003000 5



Impresso no site oficial do Município

PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO





Emissão de comprovantes

G3330407430553311
04/11/2025 07:55:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIA

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 81610000120-4 31434542202-1
51110034164-9 79080003000-5

Data do pagamento 03/11/2025

Valor Total 12.031,43

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 2.B2B.E59.75C.C53.9CC

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 23743

PAGTO: 03/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IR DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COSTA CONSTRUTORA L TDA., CONFORME NFS-e N° 146 EMITIDA EM 27/10/2025.

Valor 3.609,43

(três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.609,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
245	/ 1	EX	999013		R\$ 3.609,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.609,43
TOTAL					R\$ 3.609,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.609,43

Despesa Líquida: R\$ 3.609,43

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	110302	3.609,43
TOTAL. . .			R\$ 3.609,43

Despesa paga em 03/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Secretário Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 009.2025-OP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

Local de Pagamento
BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA E ITAU

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Emissao
03/11/2025

IRRF /2025
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

No. Registro	Item	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
3316	1	ÚNICA	41647904	01/12/2025		
Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento	
3.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,43	

Insc. Contribuinte
754

Insc. Econômico
11

Documento
C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160

Historico

IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 146 EMITIDA EM 27/10/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.

IRRPJ

Impresso por CRISTIANE

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

IRRF /2025
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
3316	754	41647904	ÚNICA	01/12/2025	01/12/2025	3.609,43
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14 PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160 Historico IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 146 EMITIDA EM 27/10/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.						(+) ATUALIZAÇÃO
						0,00
						(+) MULTA
						0,00
						(+) JUROS
						0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbênciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						3.609,43

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



VIA DO BANCO 81620000036 1 09434542202 9 51201664164 3 79040001000 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 81620000036-1 09434542202-9

51201664164-3 79040001000-1

Data do pagamento 03/11/2025

Valor Total 3.609,43

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 9.0B3.E35.2CA.134.CB2

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 23744

PAGTO: 03/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

REPASSE DE VALOR REFERENTE AO INSS DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COS TA CONSTRUTORA LTDA., CONFORME NFS-e N° 146 EMITIDA EM 27/10/2025.

Valor **3.308,64**

(três mil, trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.308,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
246	/ 1	EX	991740		R\$ 3.308,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,64
TOTAL					R\$ 3.308,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,64

Despesa Líquida: **R\$ 3.308,64**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	200036	3.308,64
TOTAL. . .			R\$ 3.308,64

Despesa paga em 03/11/2025 Com os recursos acima discriminados


Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 003 2025-OP

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.791.000.200.036
VALOR TOTAL	3.308,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMT FDO PARTICIPACAO
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 200.036-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359
=====

NR. AUTENTICACAO	F.437.612.100.E9A.AFE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.
