



RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

OBJETO: TERCEIRA (03ª) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

CONTRATO: 018/2024

MUNICÍPIO: TIMON/MA

Com base em vistoria técnica realizada nas obras do objeto supracitado consideramos que as obras cujo objeto do contrato prevê a Manutenção e Conservação de Pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon -MA , através da empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22 chega nesta 03ª (TERCEIRA) medição no valor de R\$ 289.589,14 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) ao percentual de execução de 5,14% nesta medição, totalizando 20,59% do total executado de acordo com os itens previstos em planilha orçamentária. FORAM REFORMADOS ENDEREÇOS QUE SOFRERAM INTERVENÇÕES NO PASSADO MAS QUE DEGRADARAM-SE POR AGENTES EXTERNOS COMO INTemperismos e UTILIZAÇÃO COTIDIANA DA POLUIÇÃO.

LISTA DE ATIVIDADES – 03ª MEDIÇÃO

Serviços Manutenção e Conservação de Pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros:

OBS: * MAIORES DETALHES NA MEMORIA DE CÁLCULO E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. * MEDIÇÕES VISTORIADAS IN LOCO UTILIZANDO-SE TRENAS, GPS . VISTORIAS IN LOCO REALIZADAS COM SUCESSO POR MEMBRO E AMOSTRAS FOTOGRÁFICAS REPASSADAS A FISCALIZAÇÃO PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



A presente medição compreende os serviços executados entre os dias 26/11/2024 - 11/12/2024

Diante do exposto acima, seguem anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
3. Relatório de vistoria.
4. Memoria de Cálculo
5. Cronograma de Execução (03ª Medição)

Atenciosamente,

Timon/MA, 11 DE DEZEMBRO de 2024.



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

MEDICÃO Nº: 03

QUADRO - RESUMO FINANCEIRO

MEDICÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024	05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024	25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024	11/12/2024
ACUMULADO	R\$ 1.159.315,78			
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56	20,59%		

Atestado:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
11/12/2024

Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 198564317-4
Portaria nº 017/2024-GP
CPF: 965.477.833-87



OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22
MEDICÃO Nº: 03		

Cronograma Físico e Financeiro

Ite m	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38
Porcentagem Custo			7,88%	7,57%	5,14%
Porcentagem Acumulado			443.643,24	426.083,39	289.589,14
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78

ATESTO QUE:
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

11/12/2024

Antonio Rodrigues de Lima Junior
 Engenheiro Civil - CREA: 19059477-4
 Portaria nº 017/2024-CP
 CPF: 965.477.77-87



Proc Nº 2164/24
 Folha Nº 0102
 Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-	
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	212,89	item vistoriado in-loco
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	-	
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	-	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	-	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	1.920,36	item vistoriado in-loco
2		INFRAESTRUTURA			-	
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	53,10	item vistoriado in-loco
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	44,25	item vistoriado in-loco
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	159,32	item vistoriado in-loco
3		SUPERESTRUTURA			-	
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	1,42	item vistoriado in-loco
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-	

Proc Nº
Folha Nº

Assinatura

(X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

Praça São José, s/n, Centro - - TIMON / MA

11 / 12 / 2024
Engenheiro Civil - CREA: 190553/17-4
Portaria nº 01173/2021-GP
CPF: 965.477.63-87

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	-	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			-	
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	-	
5		PAVIMENTAÇÃO			-	
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	8,85	item vistoriado in-loco
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	132,76	item vistoriado in-loco
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	2.478,19	item vistoriado in-loco

Proc N°	2109/24
Folha N°	6 de 6
Assinatura	

ATESTO QUE:

(X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

11/12/2024

Praça São José, s/n, Centro - - TIMON / MA

Engenheiro Civil - CREA 180553/17-4
Portaria N.º 73/2021-CP
CPF: 965.471.123-87



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			-	
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	-	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	-	
7		GALERIAS TUBULARES			-	
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	-	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	-	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	-	

Atestado:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
11 / 12 / 2024

Antônio Rodrigues de Lima Junior
Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4

Portaria nº 017/2024-GP
CPF: 965.477.933-37



Proc N° 2164/24
Folha N° 61024
Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
8		DIVERSOS			-	-
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	9.020,78	-	
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-	
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	566,37	item vistoriado in-loco
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	-	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	-	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	-	
8.7	CPU Próprio SEINFRA	CANALETA SIMPLES	M	269,10	-	
8.8	73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	-	

Proc Nº 2164/24
Folha Nº 01
Assinatura _____

ATESTAQUE:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
11/02/2024
Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 190553/17-4
Portaria nº 01773/2024-GP
CPF: 365.471.63-87



Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F.
COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 03			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					623.951,84										
1.1	73859002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.250,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	543,76	57.907,93	9,25%	212,89	22.672,18	3,62%	756,65	80.580,11	12,87%
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	-	1.011,39	24,06%	-	395,98	9,42%	-	1.407,37	33,48%
1.3	C1049 SENFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
1.4	C3373 SENFRA	RETIrada DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.881,11	1,31 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
1.5	C3094 SENFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,80	354.716,60	5,30 %	4.904,67	58.896,54	16,04%	1.920,36	22.276,20	6,28%	6.825,24	79.172,75	22,32%
2		INFRAESTRUTURA					743.864,81	13,21%		194.882,42	26,15%		52.274,32	7,03%		246.766,74	33,18%
2.1	96467 SINAPI	EMBASAMENTO CPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMA/AREIA 1:4	m²	593,72	364,57	485,00	279.040,66	4,96 %	135,63	67.137,16	24,09%	53,10	26.295,63	9,42%	188,73	93.422,81	33,48%
2.2	73965009 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCORAMENTO	m²	563,73	180,00	231,90	130.726,99	2,32 %	180,11	41.767,91	31,95%	44,25	10.282,23	7,85%	224,36	52.030,14	39,80%
2.3	C0330 SENFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL SICOINTELE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.392,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	886,96	85.577,33	25,63%	159,32	15.726,46	4,71%	1.026,28	101.303,79	30,34%
3		SUPERESTRUTURA					89.883,48	1,24%		3.723,75	5,35%		467,33	0,87%		4.191,08	5,02%
3.1	94983 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.893,09	0,26 %	11,28	3.723,75	26,02%	1,42	467,33	3,14%	12,70	4.191,08	28,16%
3.2	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	282,46	302,64	16.356,15	0,29 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3	94986 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4	73381 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

ATENÇÃO:

X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
X OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
X AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

11/12/2024

Antônio Rodrigues de Lima Junior
Engenheiro Civil - CREA: 19055-8/17-4
Portaria nº 07739261-GP
CPF: 965.871.823-87



Proc N°	2164/24
Folha N°	6 nov
Assinatura	

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F.
COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Síntetico										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 03				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4.1	97523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 381x141x9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_062014	m²	676,45	70,85	90,39	61.550,46	1,09%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5		PAVIMENTAÇÃO					1.320.146,69	32,44%				20,21%		182.752,94	10,01%		716.108,31	39,21%			
5.1	98681 SINAPI	PSO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_082220	m²	563,74	22,54	29,48	16.619,10	0,30%		176,94	5.186,82	31,21%	8,85	280,92	1,57%	184,79	5.447,74	32,78%			
5.2	C3410 SENFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26%		540,34	168.818,90	31,95%	132,76	40.837,66	7,85%	673,10	207.556,56	39,80%			
5.3	C2893 SENFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍFUGO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.026,70	22,86%		8.329,65	361.549,66	28,07%	2.478,19	141.554,35	10,99%	8.807,84	503.104,01	39,06%			
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					118.885,94	2,89%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
6.1	93624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,25%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
6.2	C4327 SENFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (600 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
7		GALERIAS TUBILARES					148.115,78	2,63%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_122015	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,46%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
7.2	92834 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_122015	M	225,49	62,50	81,02	18.269,36	0,32%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
7.3	92223 SINAPI	QUALIDADE DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_122015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

ALÍCIO QUE:
(X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

15/12/2024

Antonio Rodrigues de Lima Junior
Engenheiro Civil - CREA 190564317-4
Portaria nº 0173/2021-GP
CPF: 98.647.822-87



Proc N° 2164/24
Folha N° 01049
Assinatura



PREFEITURA DE
Timon
A Cidade que a gente ama

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEIROS, SARIJETAS, MIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA, CONTRATATO 016/2024 - CONTRATADA: F.
COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.337.410/0001-22

Orçamento Sintética										MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDICÃO ATUAL 03				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
8		DIVERSOS					2.037.814,59	36,29%													
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (MIO-FIO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_062016	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18 %		-	80.257,16	3,94%		31.422,38	1,54%		111.979,53	5,48%			
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_062016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_062016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.366,34	8,89 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
8.4	C0500 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m²	1.891,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %		1.448,80	80.257,16	16,04%		31.422,38	6,29%		111.979,53	23,32%			
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m²	1.891,21	122,55	157,89	287.026,62	4,74 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_062016	M	225,48	126,86	163,04	36.762,34	0,65 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
8.7	CFU Próprio SEINFRA	CAVALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
8.8	73882005 SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.900,75	1,82 %			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
				Total Geral			5.629.973,96				869.726,63	15,45%		289.569,14	5,14%		1.169.315,79	20,59%			

ATESIO QUE:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

14 / 12 / 2024

Antônio Rodrigues de Lima Junior
Engenheiro Civil - CREA 19024317-4
Portaria 08-017/2024-GP
CPF: 965.477.633-97

Proc N° 2164/24

Folha N° 0204

Assinatura





RELATORIO FOTOGRAFICO - 003ª MEDIÇÃO

OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.
----------------	--

FOTO: 001	FOTO: 002
1 - ENDEREÇO: END. 01- R. 15, 1942 - São Benedito, Timon - MA, 65636-410. ITEM 9.7 - CANALETA SIMPLES	1 - ENDEREÇO: END. 01- R. 15, 1942 - São Benedito, Timon - MA, 65636-410. ITEM 9.7 - CANALETA SIMPLES

FOTO: 001	FOTO: 002
1 - ENDEREÇO: END. 01- R. 15, 1942 - São Benedito, Timon - MA, 65636-410. ITEM 9.7 - CANALETA SIMPLES	2 - ENDEREÇO: END. 02 - R. São Sebastião, 453 - Formosa, Timon - MA. ITEM 2.3 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL

FOTO: 003	FOTO: 004
2 - ENDEREÇO: END. 02 - R. São Sebastião, 453 - Formosa, Timon - MA. ITEM 3.1 - CONCRETO FCK = 15MPA	2 - ENDEREÇO: END. 02 - R. São Sebastião, 453 - Formosa, Timon - MA. ITEM 9.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)

FOTO: 005	FOTO: 006
2 - ENDEREÇO: END. 02 - R. São Sebastião, 453 - Formosa, Timon - MA. ITEM 2.3 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	3 - ENDEREÇO: END. 03 - Conj. Cidade Nova III Qu C, 5 - Vila Monteiro, Timon - MA, 65634-540. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Proc N° 2164/24
Folha N° 6
Assinatura

ATESTO QUE:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
- ☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☒ AS DEPENDÊNCIAS FORAM REALIZADAS

11/12/24

Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4
Portaria nº 01773/2024 GP
CPF: 965.477.622-87



FOTO: 007



FOTO: 008




4 - ENDEREÇO: END. 04 - Av. Luís Firmino de Sousa, 3675-B - MUTIRÃO, Timon - MA, 65636-000. ITEM 9.3 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

4 - ENDEREÇO: END. 04 - Av. Luís Firmino de Sousa, 3675-B - MUTIRÃO, Timon - MA, 65636-000. ITEM 9.3 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

FOTO: 009



FOTO: 0010

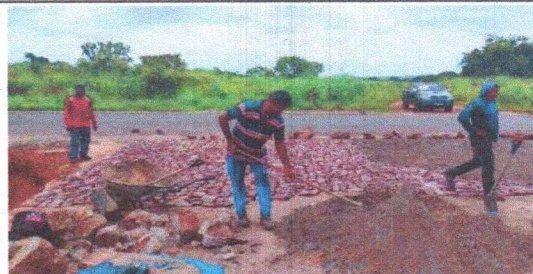

4 - ENDEREÇO: END. 04 - Av. Luís Firmino de Sousa, 3675-B - MUTIRÃO, Timon - MA, 65636-000. ITEM 9.3 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

END. 05 - R. Edmilson P Oliveira, 20 - Sete Estrelas, Timon - MA, 64000-970. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

FOTO: 009



FOTO: 0010




END. 05 - R. Edmilson P Oliveira, 20 - Sete Estrelas, Timon - MA, 64000-970. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

END. 05 - R. Edmilson P Oliveira, 20 - Sete Estrelas, Timon - MA, 64000-970. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

FOTO: 0011



FOTO: 0012

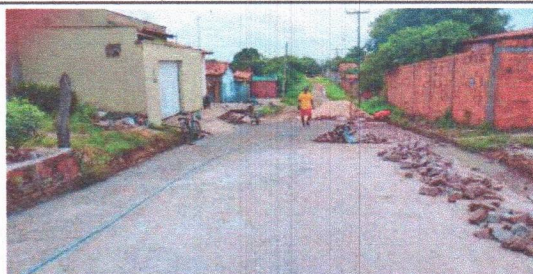

6- ENDEREÇO: END. 06 - Conj. Cidade Nova III Qu C, 5 - Vila Monteiro, Timon - MA, 65634-540. ITEM 1.5 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

6- ENDEREÇO: END. 06 - Conj. Cidade Nova III Qu C, 5 - Vila Monteiro, Timon - MA, 65634-540 - ITEM 6.2 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

FOTO: 0013



FOTO: 0014



Proc N° 2164/24
Folha N° 06
Assinatura

Atestado:
[X] OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
[X] OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
[X] AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
11/12/24
Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4
Portaria n° 01773/2024 GP
CPF: 966.477.822-97

6- ENDEREÇO: END. 06 - Conj. Cidade Nova III Qu C, 5 - Vila Monteiro, Timon - MA, 65634-540. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

6- ENDEREÇO: END. 06 - Conj. Cidade Nova III Qu C, 5 - Vila Monteiro, Timon - MA, 65634-540. ITEM 6.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO



ATESTO QUE:

☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

11 / 12 / 24


Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4
Portaria nº 01773/2021-CP
CPF: 965.477.813-37

Proc N° 2164/24

Folha N° 02

Assinatura

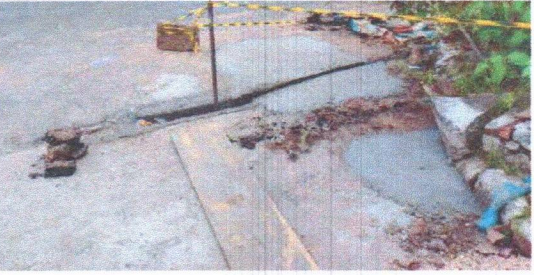

FOTO: 0015 	FOTO: 0016 
7- ENDEREÇO: END. 07 - Av. Teresina - Parque Piauí, Timon - MA, 65636-500. ITEM 1.3 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	7- ENDEREÇO: END. 07 - Av. Teresina - Parque Piauí, Timon - MA, 65636-500. ITEM 1.3 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
FOTO: 0017 	FOTO: 0018 
8- ENDEREÇO: END. 07 - Av. Teresina - Parque Piauí, Timon - MA, 65636-500. ITEM 1.3 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	8- ENDEREÇO: END. 08 - R. Joaquim Pedreira - Parque Piauí, Timon - MA, 65631-200. ITEM 6.4 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO
FOTO: 0019 	FOTO: 0020 
8- ENDEREÇO: END. 08 - R. Joaquim Pedreira - Parque Piauí, Timon - MA, 65631-200. ITEM 6.4 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO	8- ENDEREÇO: END. 08 - R. Joaquim Pedreira - Parque Piauí, Timon - MA, 65631-200. ITEM 9.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO.
FOTO: 0021 	FOTO: 0022 
8- ENDEREÇO: END. 08 - R. Joaquim Pedreira - Parque Piauí, Timon - MA, 65631-200. ITEM 9.3 EXECUÇÃO DE SARJETA.	8- ENDEREÇO: END. 08 - R. Joaquim Pedreira - Parque Piauí, Timon - MA, 65631-200. ITEM 6.4 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO

ATESTO QUE:

☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

11 / 12 / 2024

Antônio Rodrigues de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA 120554317-4
Portaria nº 0177312021-GP
CPF: 965.477.623-87

Proc N° 2164/24
Folha N° 01
Assinatura Onang

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024vi

Neta
CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO R\$ 289.589,14

Declaramos que rebemos da Prefeitura Municipal de Timon-MA, a importância supra de R\$ 289.589,14 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Quatorze Centavos) referente a 3ª medição dos serviços de Executados do referido contrato, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para os serviços manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros e vias públicas no município de Timon - MA. De acordo com o contrato nº 018/2024 conforme nota fiscal 119

Teresina ____/____/____

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372 Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA:81764197372

Franklande Felix da Costa
Socio Administrador

Proc Nº	2169/24
Folha Nº	01 de 01
Assinatura	
