



4ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 0018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº _____

Fonte de Recurso: 1.500.00 (próprio)

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 450.073,76

Proc. Nº	1105/25
Folha Nº	
	
Assinatura	

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada nas estradas do objeto supracitado consideramos a medição que segue anexa (4ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 450.073,76** (quatrocentos e cinquenta mil e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) correspondente a um percentual 7,99%, relativos à 4ª boletim de medição, totalizando 28,58% do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 DE FEVEREIRO DE 2025 E 14 DE MARÇO DE 2025.

Este é o nosso parecer.

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil/CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 14 de março de 2025.

Avenida Paulo Ramos S/N,
Centro Timon-MA

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	0100
Assinatura	

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -					
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			CONTRATO Nº: 18/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22		
MEDICÃO Nº: 04					
QUADRO - RESUMO FINANCEIRO					
MEDICÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE		
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM	
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024	05/11/2024	
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024	25/11/2024	
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024	11/12/2024	
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025	14/03/2025	
ACUMULADO	R\$ 1.609.389,53	28,58%			
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56				

Maciel do Nascimento Lopes
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22
MEDICÇÃO Nº: 04		

Cronograma Físico e Financeiro

Lte m	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025
SERVIÇOS						
1	PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,58%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	0109
Assinatura	

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73
1.4	C3373 SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.841,74
1.5	C3084 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	m²	30.579,02
2		INFRAESTRUTURA		
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMA/AREIA 1:4	m³	563,72
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	m³	563,73
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59
3		SUPERESTRUTURA		
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10
3.4	73381 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45
5		PAVIMENTAÇÃO		
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.891,20
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.546,52
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES		
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75

Proc N°
Folha N°
Assinatura



Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA, CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL
7		GALERIAS TUBULARES		
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49
8		DIVERSOS		
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m²	1.691,20
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m²	1.691,21
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48
8.7	CPU Próprio	CANALETA SIMPLES	M	269,10
8.8	SEINFRA 73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69
				996,88

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria N° 0148 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 04				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84				57.907,93	9,25%		44.936,72	7,18%		125.516,83	20,05%			
1.1	7385/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %													
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %													
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %													
1.4	C3373 SEINFRA	RETRADAÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %													
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIDÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %													
2		INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%			194.402,42	26,15%		72.992,51	9,82%		319.749,25	43,00%			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO OPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMAREIA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %													
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LOCO, DE 1:5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %													
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/ SICOITROLE, MAT. CAQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,83 %													
3		SUPERESTRUTURA					69.683,45	1,24%			3.773,75	5,35%		1.362,82	1,86%		5.553,89	7,37%			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	256,97	329,88	14.883,09	0,26 %													
3.2	94964 SINAPI	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %													
3.3	94960 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %													
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPORO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,08	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %													
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%													
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE 1:3 CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1 COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %													
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,89	32,44%			533.355,37	29,21%		275.474,81	15,09%		991.583,12	54,30%			
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %													
5.2	C3410 SEINFRA	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %													
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %													
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%													
6.1	83824 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %													
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %													
7		GALÉRIAS TUBULARES					148.115,79	2,63%													
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	225,50	92,14	118,69	26.785,01	0,48 %													
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12/2015	M	225,49	62,90	81,02	19.269,36	0,32 %													
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %													
8		DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%			80.257,16	3,94%		55.306,90	2,71%		166.986,44	8,19%			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18 %													
8.2	94266 SINAPI	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF 06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %													
8.3	94268 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89 %													
8.4	C0030 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m²	1.891,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %													
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.891,21	122,55	157,89	287.025,62	4,74 %													

Assinatura

Folha Nº

Proc Nº

mos/ps

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Orçamento Sintético										MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL 04		MEDICÃO ACUMULADA ATUAL	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	M	225,48	126,56	183,04	36.782,34	0,65 %		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.7	CPU Proprio SEINFRA TIMON	TRECHO RETO 100 CM BASE X 20 CM ALTURA AF 06/2016 CANALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,28 %		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.8	73982/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total Geral										869.726,63	15,45%	450.073,76	7,99%	1.699.389,53	28,59%


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0148 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Previsão de término: 31/03/2027

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wa9aB
Impresso em: 27/03/2025 às 12:58:43 por: , ip: 45.232.200.53

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



1105/25

Assinatura



27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41
295302953 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCEL ALMEIDA SOARES

AGENCIA: 2953-X CONTA: 51.672-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490522671900010084230618487703110430000027147

BENEFICIARIO:

CREA/MA - ART

NOME FANTASIA:

CREA/MA - ART

CNPJ: 06.062.038/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CREA/MA - ART

CNPJ: 06.062.038/0001-75

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

NR. DOCUMENTO 32.706

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 271,47

VALOR COBRADO 271,47

NR.AUTENTICACAO 1.9FE.D3E.C94.20D.074

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proc N°	1105125
Folha N°	
Assinatura	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de início: 20/02/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Previsão de término: 31/03/2027

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
 INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 28/03/2025 12:33:01

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1cYZ
 Impresso em: 28/03/2025 às 12:33:01 por: , ip: 138.0.234.198

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8303





Outra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 04			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84											
1.1	7385/002 SINAPI	CAPIVA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.280,00	1,44	1,88	4.203,61	0,07 %										
1.2	9270 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	18,46	1.855,80	0,03 %		756,65	1.911,39	24,06%	457,92	851,73	20,28%	1.214,57	2.259,10	53,74%
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	283,69	339,71	191.504,72	3,40 %										0,00%
1.4	C3373 SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,08	73.681,11	1,31 %										0,00%
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÉDRICO	m³	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %		6.825,24	56.896,54	16,04%	3.900,43	44.084,99	12,43%	10.625,67	123.257,73	34,75%
2		INFRAESTRUTURA					745.664,81	13,21%										
2.1	95487 SINAPI	EMBASEAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	394,57	495,00	279.040,66	4,96 %		188,73	67.137,16	24,06%	65,56	32.452,20	11,63%	254,29	125.875,01	45,11%
2.2	7386/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCOAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %		224,36	41.787,91	31,85%	54,54	12.647,83	9,87%	278,90	64.677,96	49,47%
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISICÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %		1.026,28	85.577,33	25,63%	282,57	27.892,48	8,35%	1.308,85	126.196,28	38,69%
3		SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%										
3.1	94983 SINAPI	CONCRETO FCK = 10MPA, TRACO 1:3:4,3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	256,97	329,88	14.883,09	0,26 %		12,70	3.723,75	25,02%	4,13	1.362,82	9,16%	16,83	5.553,89	37,32%
3.2	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:7,3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.366,15	0,29 %										0,00%
3.3	94986 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %										0,00%
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	381,48	465,13	20.973,41	0,37 %										0,00%


Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA 19182199/3



F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158

Fone: (86) 3213-6396 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutora ltda@gmail.com

Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

Proc N° 1105125
Folha N°
Assinatura



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Síntico										MEDIDA ACUMULADA ANTERIOR			MEDIDA ATUAL 04			MEDIDA ACUMULADA ATUAL		
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X10CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAZO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	70,85	90,89	61.550,46	1,09%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%			533.355,37	29,21%		275.474,81	15,09%		991.553,12	54,30%
5.1	96681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	583,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30%			184,79	31,21%		743,19	4,47%		6.190,93	37,25%
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26%			673,10	31,95%		85.828,82	16,46%		283.355,48	56,26%
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUÍRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.286.028,70	22,88%			8.807,84	28,07%		188.902,69	14,67%		892.098,70	53,73%
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.1	83924 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	186,81	214,88	72.680,58	1,29%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (600 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,64	392,70	44.275,35	0,79%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7		GALERIAS TUBULARES					148.115,79	2,63%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,48%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.299,36	0,32%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%			-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%


Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro CMI
CREA-PIRN 1916219993



F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158

Fone: (86) 3213-6396 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutoraltida@gmail.com

Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

Proc N°	1105123
Folha N°	1
Assinatura	



Obras

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 016/2024

Orçamento Síntico										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 04			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
8		DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%										
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	9.020,78	39,81	51,03	460.330,81	8,18 %				3,94%		55.306,90	2,71%		166.998,44	8,19%
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
8.3	94288 SINAPI	TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89 %				16,04%	996,88	55.306,90	11,05%		166.998,44	33,37%
8.4	C0300 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
8.5	C3388 SEINFRA	REMOÇÃO DE LAMA GRANULADA DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	281.025,92	4,74 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
8.6	94293 SINAPI	REMOÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 06/2016	M	235,46	126,56	163,04	38.762,34	0,65 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
8.7	CPU Próprio	CANALETAS SIMPLES	M	289,10	1.020,93	1.315,96	354.097,93	6,29 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
8.8	SEINFRA TIMON/724 73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,89	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %				0,00%		-	0,00%		-	0,00%
Total Geral							5.629.973,95				869.726,63	15,45%		450.073,76	7,99%		1.609.398,53	28,59%

Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PI/1916219993

F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158
Fone: (86) 3213-6396 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutora ltda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI



Proc. N°	1105/25
Folha N°	
Assinatura	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON - MA.

FOTO: 001

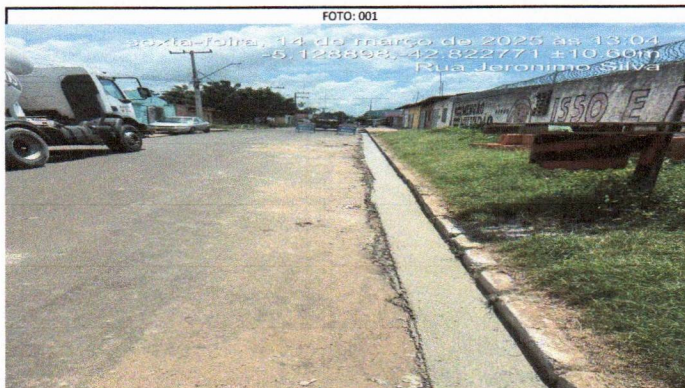


FOTO: 002

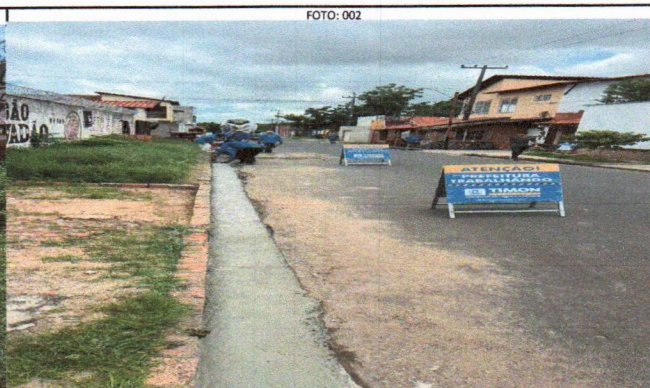


FOTO: 003

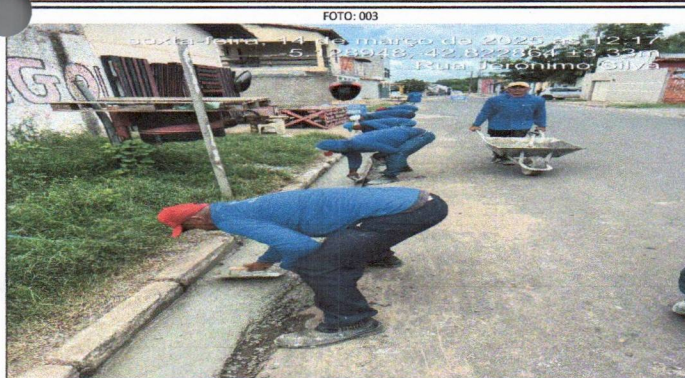


FOTO: 004



FOTO: 005



FOTO: 006

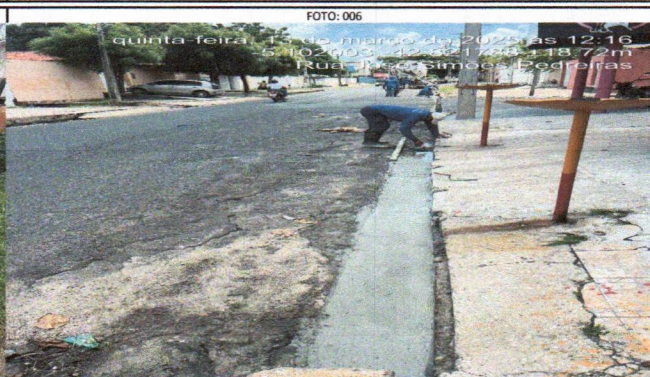


FOTO: 007


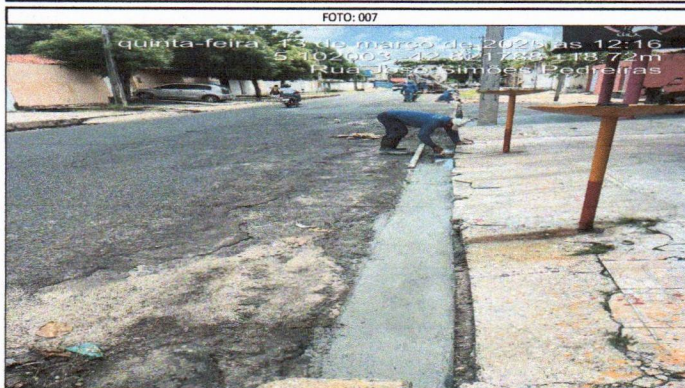









FOTO: 008

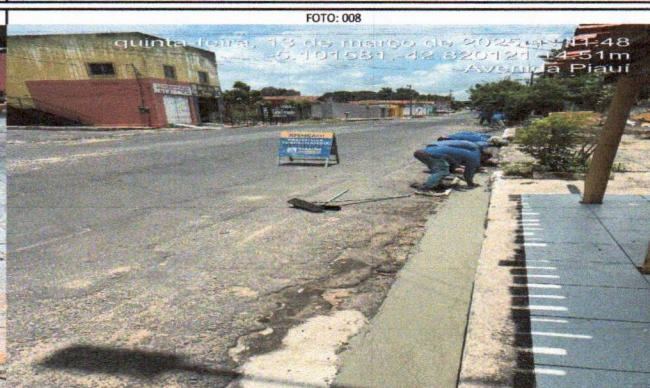

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINERA
CPF: 016.156.663-46


Folha N°

3105/25
6604
Assinatura

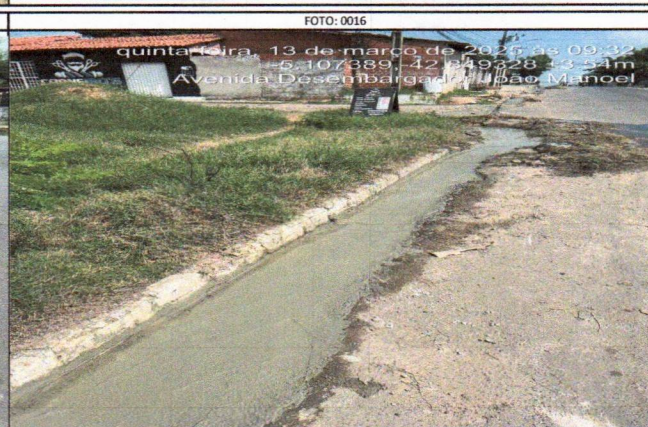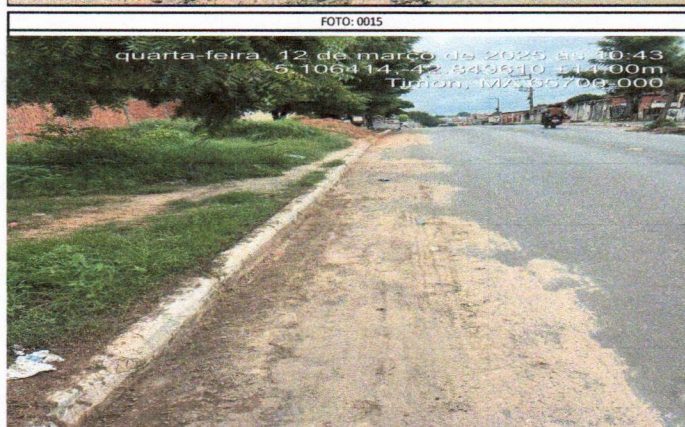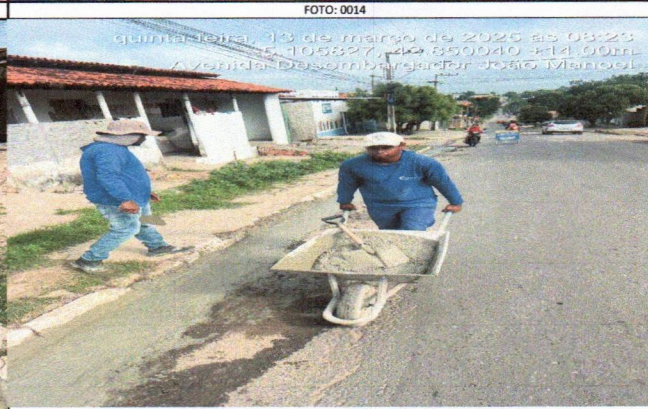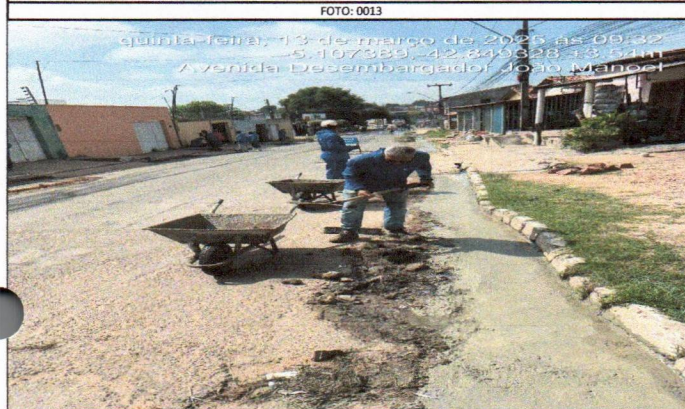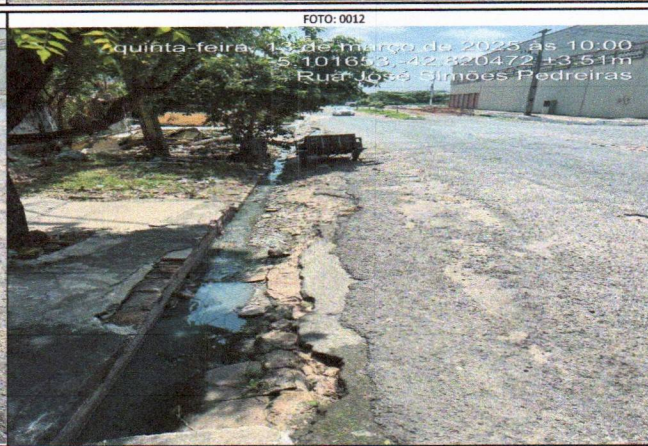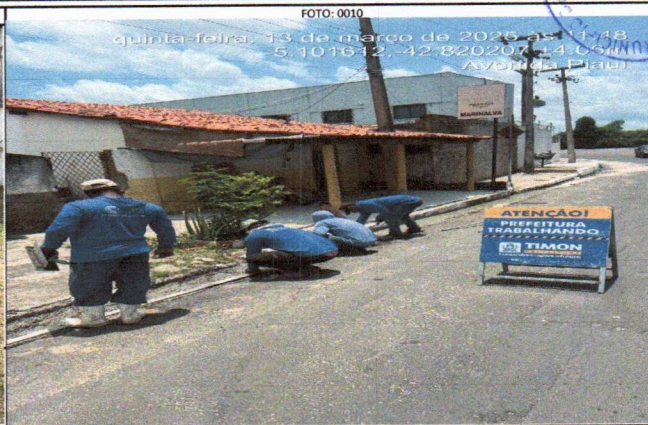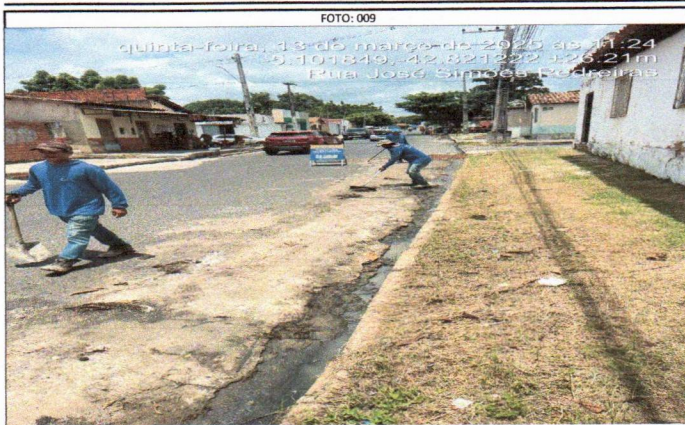

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-45

Proc N°	3105/23
Folha N°	6 nov
Assinatura	

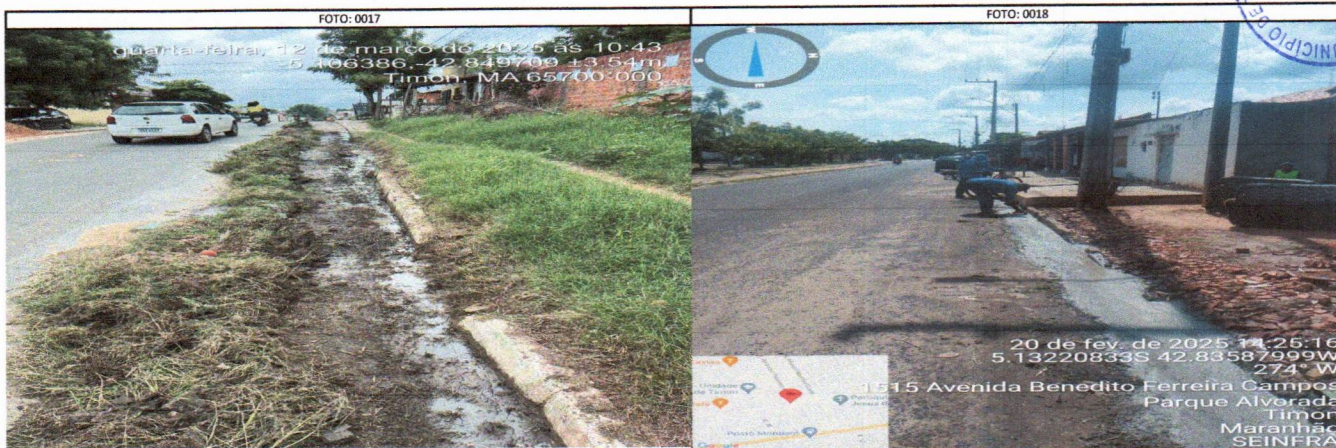

Maciel
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil/CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº	3105/25
Folha Nº	01
Assinatura	<i>Maciel</i>



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000121

Data e Hora de Emissão

14/03/2025 13:30:39

Código de Verificação

c8a20ad4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Inscrição Municipal : 463993-6

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, Nº1 - BAIRRO VALE DO GAVIAO - CEP:64069-120

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREF MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Inscrição Municipal : 463993-6

Endereço: PRACA SAO JOSE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:65630-160

Município: TIMON

UF: MA

E-mail: f.costaconstrutoraltda@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF A 4ª (TEREZEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA.

Contribuinte	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2024	1	450073,76	450.073,76

PIS (0,6500%): R\$ 0,00

COFINS (3,0000%): R\$ 0,00

INSS (1,1000%): R\$ 4.950,81

IR (1,2000%): R\$ 5.400,89

CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450.073,76

Valor Total das Deduções: R\$ 90.014,75

Base de Cálculo: R\$ 360.059,01

Alíquota: 5,00%

Valor do ISS: R\$ 18002,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025

Local da Prestação do Serviço: TIMON/MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA

Incidência: TIMON/MA

ATESTO QUE:

(X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

24/03/2025

Responsável

Maciel do Nascimento Lopes

Engenheiro Civil CREA 1919112979

Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA

Proc Nº 1105125

Folha Nº

Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO N° 018/2024

RECIBO

R\$ 450.073,76

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 450.073,76 (Quatrocentos e cinquenta mil, setenta e três reais e setenta e seis centavos), referente a 4ª (QUARTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000121.

Teresina, ____ de _____ 2025.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.03.14 13:33:41 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador
