



PREFEITURA DE
Timon
A Cidade que a gente ama



RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

OBJETO: SEGUNDA (02ª) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

CONTRATO: 018/2024

MUNICÍPIO: TIMON/MA

Com base em vistoria técnica realizada nas obras do objeto supracitado consideramos que as obras cujo objeto do contrato prevê a Manutenção e Conservação de Pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros em vias públicas do município de Timon -MA , através da empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22 chega nesta 02ª (SEGUNDA) medição no valor de R\$ 426.083,39 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) ao percentual de execução de 7,57% nesta medição, totalizando 15,45% do total executado de acordo com os itens previstos em planilha orçamentária.

LISTA DE ATIVIDADES – 02ª MEDIÇÃO

Serviços Manutenção e Conservação de Pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fio, galerias e outros:


OBS: * MAIORES DETALHES NA MEMORIA DE CÁLCULO E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. * MEDIÇÕES VISTORIADAS IN LOCO UTILIZANDO-SE TRENAS, GPS . VISTORIAS IN LOCO REALIZADAS COM SUCESSO POR MEMBRO E AMOSTRAS FOTOGRÁFICAS REPASSADAS A FISCALIZAÇÃO PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

A presente medição compreende os serviços executados entre os dias 06/11/2024 - 25/11/2024
Diante do exposto acima, seguem anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
3. Relatório de vistoria.
4. Memoria de Cálculo
5. Cronograma de Execução (02ª Medição)

Atenciosamente,

Timon/MA, 26 DE NOVEMBRO de 2024.



Proc N°	2169/24
Folha N°	102
Assinatura	

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMON

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

MEDICÃO Nº: 02

QUADRO - RESUMO FINANCEIRO

MEDICÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM
1ª	R\$ 443.643,24 ✓	7,88% ✓	22/10/2024	05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39 ✓	7,57% ✓	06/11/2024	25/11/2024
ACUMULADO	R\$ 869.726,63 ✓	15,45% ✓		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56 ✓			

ATESTO QUE:
☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22
MEDIÇÃO Nº: 02		

Cronograma Físico e Financeiro

Itm	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med.		2ª Med.	
			05/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43		
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17		
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60		
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-		
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26		
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-		
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-		
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93		
Porcentagem Custo			7,88%	7,57%		
Porcentagem Acumulado			443.643,24	426.083,39		
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63		

Atestado de:

☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

25/11/2024

Proc Nº 2164/24

Folha Nº

Assinatura

Obra


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-	
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	313,24	item vistoriado in-loco
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	-	
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	-	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	-	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	2.825,50	item vistoriado in-loco
2		INFRAESTRUTURA			-	
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	78,13	item vistoriado in-loco
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	65,11	item vistoriado in-loco
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	234,41	item vistoriado in-loco
3		SUPERESTRUTURA			-	
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	2,08	item vistoriado in-loco
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-	

ATESTO QUE:
A OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25 / 11 / 2024



Assinatura

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	-	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			-	
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	-	
5		PAVIMENTAÇÃO			-	
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	13,02	item vistoriado in-loco
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	195,33	item vistoriado in-loco
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	3.646,26	item vistoriado in-loco

Folha Nº 2169/04
Assinatura *lowe*

ATESTADO QUE:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25 / 11 / 2024



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			-	
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	-	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	-	
7		GALERIAS TUBULARES			-	
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	-	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	-	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	-	

Proc.º	2164/24
Folha nº	100
Assinatura	

RESERVAÇÃO:
(X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA	OBSERVAÇÃO
8		DIVERSOS			-	-
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	9.020,78	-	
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-	
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	833,33	item vistoriado in-loco
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	-	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	-	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	-	
8.7	CPU Próprio SEINFRA	CANALETA SIMPLES	M	269,10	-	
8.8	73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	-	

Proc Nº 2164/24
Folha Nº 100
Assinatura

ALBUQUERQUE
LOS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024



Orçamento Síntica										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 02				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.981,84					3,92%			5,33%		57.907,93	9,25%			
1.1	73650002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %						33.358,43	5,33%						
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %		230,52	428,77	10,20%	313,24	582,62	13,86%	543,76	1.011,39	24,06%			
1.3	C1048 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,75	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
1.4	C3373 SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.891,11	1,31 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,80	354.716,60	6,30 %		2.079,37	24.120,73	6,80%	2.825,50	32.775,81	9,24%	4.904,87	56.896,54	16,04%			
2		INFRAESTRUTURA					743.864,81	13,21%				15,61%			10,34%			26,15%			
2.1	96467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/ MAREIA 1:4	m²	593,72	384,57	495,00	279.040,68	4,96 %		57,40	28.482,15	10,20%	78,13	38.675,04	13,86%	135,63	67.137,18	24,98%			
2.2	73650009 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESCOTAMENTOS/ESCORAMENTOS	m²	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %		115,00	26.688,71	20,40%	85,11	15.099,20	11,55%	180,11	41.767,91	31,95%			
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUISUÍCIO	m³	3.382,69	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %		632,64	62.438,40	18,70%	234,41	23.138,93	6,93%	866,96	85.577,33	25,63%			
3		SUPERESTRUTURA					66.663,45	1,24%				4,35%			0,99%			5,35%			
3.1	94893 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,68	14.863,09	0,26 %		9,20	3.038,15	20,40%	2,08	687,80	4,82%	11,28	3.723,75	25,02%			
3.2	94894 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,28 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
3.3	94896 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:3:1,2:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

Atesto que:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024

Folha Nº 2164/24
Assinatura



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 02			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	876,45	70,85	90,69	61.550,46	1,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6		PAVIMENTAÇÃO					1.826.148,89	32,44%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	583,74	22,94	23,48	16.619,10	0,30%	182,92	4.802,92	28,90%		383,90	2,31%	175,94	5.186,82	31,21%
6.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.468,89	9,26%	345,01	106.385,77	20,40%	13,02	60.233,12	11,55%	540,34	166.618,90	31,95%
6.3	C2883 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88%	2.883,39	153.275,41	11,90%	195,33	208.274,24	16,17%	6.329,65	381.549,66	28,07%
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					118.955,84	2,08%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAVALETE LARGO = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29%	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	394,84	392,70	44.275,35	0,79%	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7		GALÉRIAS TUBULARES					146.115,79	2,63%		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.1	96571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SM/PI) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSERÇÃO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	226,50	92,14	118,69	28.795,01	0,48%	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32%	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSERÇÃO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%

ATESTO QUE:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024

Proc Nº 2164/24
Folha Nº 100
Assinatura

Orçamento Sintética										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 02				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
8		DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%													
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF_06/2016	M	9.020,76	36,61	51,03	460.330,61	8,18 %		-	34.024,23	1,67%	-	46.232,93	2,27%	-	80.257,16	3,94%			
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9.016,68	43,06	55,48	500.356,34	8,69 %		613,27	34.024,23	6,80%	-	46.232,93	9,24%	1.446,60	80.257,16	16,04%			
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m²	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %		-	-	0,00%	833,33	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.5	C0988 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m²	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_06/2016	M	225,46	126,56	163,04	36.762,34	0,65 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.7	CPU Próprio	CAVALETA SIMPLES	M	268,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.8	SEINFRA 73802005 SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	86,46	113,96	102.300,75	1,82 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
Total Geral											443.843,24	7,68%	✓	426.083,39	7,57%	✓	869.726,63	15,45%	✓		


ATESTO QUE:
X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25/11/2024

Proc N° 2164/24
Folha N°
Assinatura



PREFEITURA DE
Timon
A Cidade que a gente ama

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA: F.
COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 002ª MEDIÇÃO

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON - MA.

FOTO: 001




1 - ENDEREÇO: Rua Rua do norte entre as ruas antônio Nunes e Santa Helena - Formosa

FOTO: 002



1 - ENDEREÇO: Rua Rua do norte entre as ruas antônio Nunes e Santa Helena - Formosa

FOTO: 003

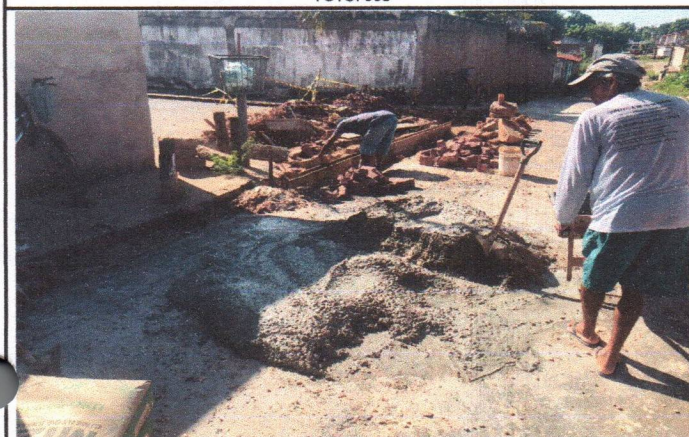

2 - ENDEREÇO: Rua 12 com José constância (parte 02) São Benedito.

FOTO: 004



2 - ENDEREÇO: Rua 12 com José constância (parte 02) São Benedito.

FOTO: 005



3 - ENDEREÇO: Rua 19 com rua do Fio - Parque Piauí 2

FOTO: 006



3 - ENDEREÇO: Rua 19 com rua do Fio - Parque Piauí 2


X OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
25 / 11 / 2024

Antônio
Engenheiro Civil
Portado
CNPJ: 27.537.410/0001-22
CPF: 77.823.37

Proc. Nº 2164/24
Folha Nº 02
Assinatura




FOTO: 007

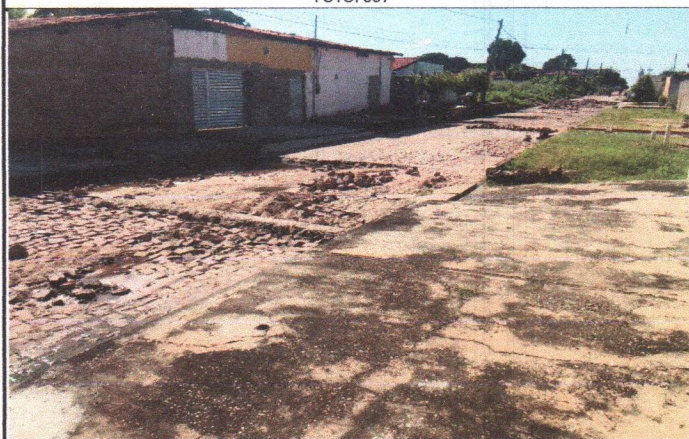

4 - ENDEREÇO: Rua 19 com rua projetada (trecho 02) - parque Piauí 2

FOTO: 008

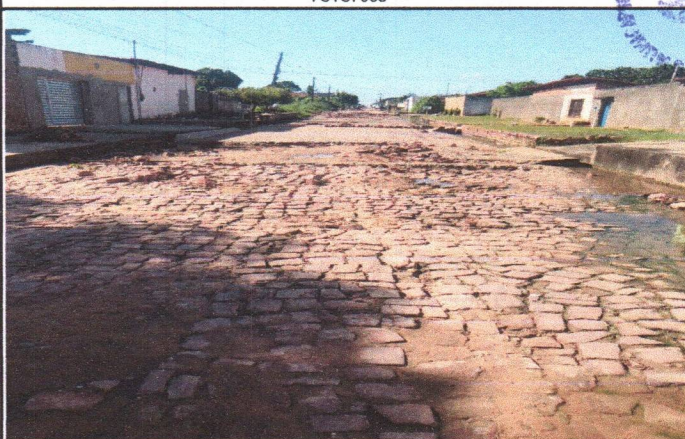

4 - ENDEREÇO: Rua 19 com rua projetada (trecho 02) - parque Piauí 2

FOTO: 009



5 - ENDEREÇO: Rua 90, Parque Piauí (calçada ceasa)

FOTO: 0010



5 - ENDEREÇO: Rua 90, Parque Piauí (calçada ceasa)

Atesto que:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

25 / 11 / 2024

Assinatura: *André Rodrigues de Lima Júnior*
Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4
P.O. 01773/2021-GP
CPF: 962.527.823-07

Proc N° 2164/24
Folha N°
Assinatura *ber*



PREFEITURA DE
Timon
A Cidade que a gente ama

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -CONTRATADA: F.
COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.

FOTO: 001



1 - ENDEREÇO: MATEUZINHO - 5°6'46"-S / 42°49'24" - O

FOTO: 002




1 - ENDEREÇO: MATEUZINHO - 5°6'46"-S / 42°49'24" - O

FOTO: 003



2 - ENDEREÇO:BAIRRO JÓIA - 5°8'36" - S / 42°50'14" - O

FOTO: 004

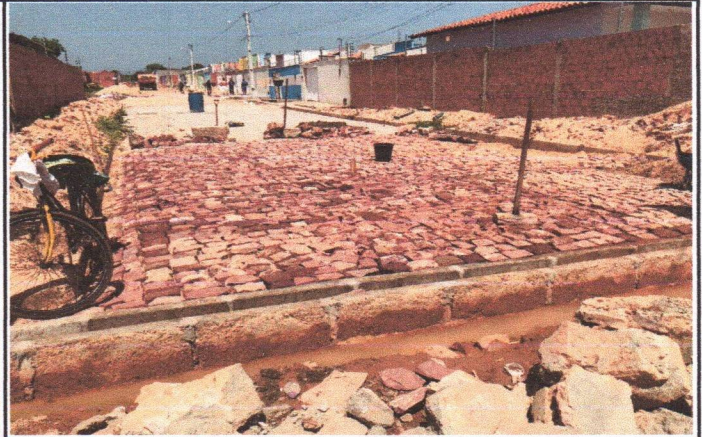


2 - ENDEREÇO:BAIRRO JÓIA - 5°8'36" - S / 42°50'14" - O

FOTO: 005



FOTO: 006

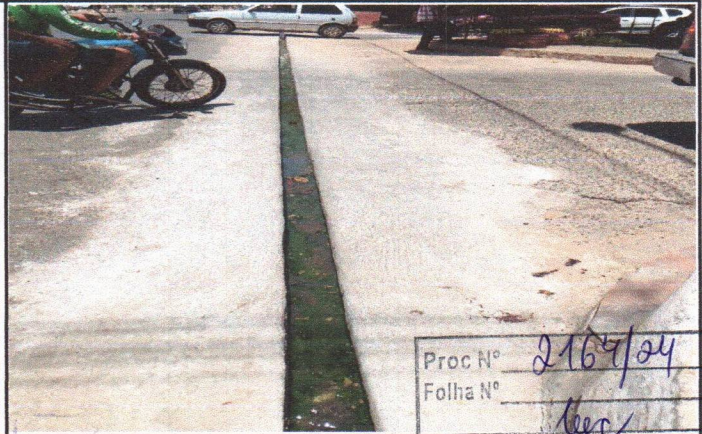

Proc N° 2167/24
Folha N° 11
Assinatura

Atestado de:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

25 / 11 / 2024

Engenheiro
Lina Junior
CREA 19224317-4
CPF: 969.477.823-87



3 - ENDEREÇO: AVENIDA 03 - 5°5'44" - S / 42°50'20" - O

3 - ENDEREÇO: AVENIDA 03 - 5°5'44" - S / 42°50'20" - O

FOTO: 007

FOTO: 008



4 - ENDEREÇO: RUA 14 - 5°6'5" - S / 42°50'20" - O

4 - ENDEREÇO: RUA 14 - 5°6'5" - S / 42°50'20" - O

FOTO: 009

FOTO: 0010



5 - ENDEREÇO: RUA 100 - 5°5'15" - S / 42°50'12" - O

5 - ENDEREÇO: RUA 100 - 5°5'15" - S / 42°50'12" - O

FOTO: 0011

FOTO: 0012



6 - ENDEREÇO: RUA 09: 5°5'20" - S / 42°50'21" - O

6 - ENDEREÇO: RUA 09: 5°5'20" - S / 42°50'21" - O

ATESTO QUE:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

25 / 11 / 2021

Handwritten signature: Henrique de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 180354317-4
Número de Registro: 17021-CP

Proc N° 2164/24
Folha N°
Assinatura


RECEBUEMOS
25/11/2024

FOTO: 0013



7 - ENDEREÇO: MARIMAR 5°5'13" - S / 42°51'22" - O

FOTO: 0014

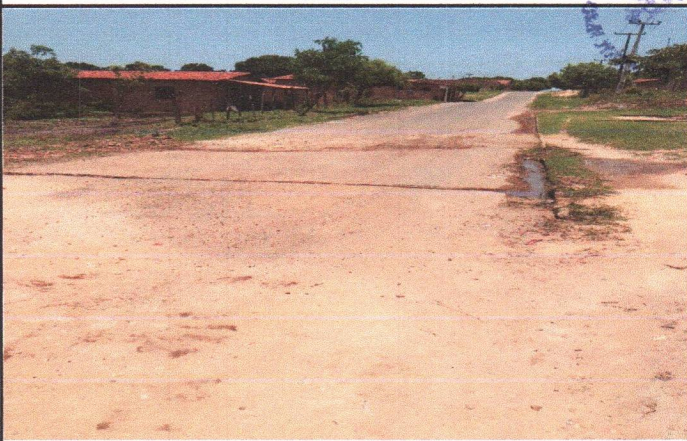

7 - ENDEREÇO: MARIMAR 5°5'13" - S / 42°51'22" - O

ATESTO QUE:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

25 / 11 / 2024

Requies de Lima Júnior
Engenheiro Civil - CRE 1234567-4
Pessoa Fís. nº 017.123.456-7
CPF: 999.888.777-11

Proc N° 2164/24
Folha N°
Assinatura

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintética				Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 02				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLICOES					825.961,84												
1.1	73559/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %		24.549,50	3,92%		33.358,43	6,33%		57.907,93	9,26%		
1.2	92970 SINAPI	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %		428,77	10,20%	313,24	582,62	13,86%	643,76	1.011,39	24,06%		
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
1.4	C3373 SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.661,11	1,31 %		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLICAO E REMOCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E SOLUPEIRO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %		2.079,37	6,80%	2.825,50	32.776,81	9,24%	4.904,87	56.896,04	16,04%		
2		INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%		117.666,26	16,81%		76.913,17	10,34%		184.482,42	26,16%		
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREA 1:4	m³	563,72	394,57	495,00	279.040,66	4,86 %		67,50	10,20%	78,13	38.676,04	13,86%	136,63	87.137,18	24,06%		
2.2	73655/009 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESCAMENTAMENTO	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %		115,00	10,40%	65,11	16.098,20	11,85%	180,11	41.767,91	31,95%		
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	m³	3.352,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %		632,54	18,70%	234,41	23.138,93	6,93%	866,96	86.677,33	25,63%		
3		SUPERESTRUTURA					68.863,45	1,24%		3.036,16	4,36%		897,60	0,99%		3.723,76	5,36%		
3.1	94983 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.863,09	0,26 %		9,20	10,40%		687,60	4,62%	11,28	3.723,76	25,02%		
3.2	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	282,48	352,64	16.356,15	0,29 %		-	0,00%	2,08	-	0,00%	-	-	0,00%		
3.3	94986 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
3.4	73381 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		

Assinatura do Responsável Técnico
CNPJ: 27.537.410/0001-22

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 27.537.410/0001-22
Franklender Félix da Costa
Administrador

Procº 2164/24
Folha nº 60
Assinatura

F. Costa Construtora LTDA-EPP CNPJ: 27.537.410/0001-22 / Inscrição: 19600158
Fone: (11) 3213-6386 / (11) 9.9472-5158 E-mail: fcostaconstroitalda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. D6 / Casa 07 - Vale do Cavalo - Teresina-PI





OBRA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,
CANTEROS, SARJETAS, MEO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-JA. CONTRATO 018/2024 - CONTRATADA:
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

Orçamento Síntica										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 02				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,89	32,44%													
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %		162,92	4.802,92	26,30%		383,90	2,31%	176,94	6.186,82	31,21%			
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.891,20	239,50	308,36	521.496,89	9,26 %		345,01	106.396,77	50,40%	13,02	60.233,12	11,65%	540,34	166.618,90	31,95%			
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRINO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.286.026,70	22,88 %		2.683,39	183.276,41	11,90%	195,33	208.274,24	16,17%	6.329,65	361.549,06	28,07%			
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	336,24	166,81	214,88	72.660,58	1,29 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (600 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7		GALERIAS TUBULARES					148.115,79	2,63%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,48 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.266,36	0,32 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

Recebido em 14/04/2024
Valor R\$ 1.943.955,94

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 27.537.410/0001-22
Franklende Felix da Costa
Administrador

Proc Nº 2164/24
Folha Nº 60
Assinatura


F. Costa Construtora LTDA - EPP CNPJ: 27.537.410/0001-22 / Ins. Est.: 196020158
Fone: (66) 3213-6396 / (66) 9 9472-5198 E-mail: fcostaconstroitoraldagmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Cavalo - Teresina-PI





CRZ-PIR-1913219893
Entregado ao Civil
1913219893
1913219893

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 27.531.410/0001-22
Franklin Felix da Costa
Administrador



F. Costa Construtora LTDA - EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158
Fone: (88) 3213-6396 / (88) 9 9472-5198 E-mail: fcostaconstroitalda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Galvão - Teresina-PI

Proc. Nº 2164/24
Folha Nº 100
Assinatura
