

6ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 0018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 (próprio)

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 841.310,87

Teresina, 26 de Maio de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 6ª (SEXTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.26 07:20:57 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº 3105/25
Folha Nº 01
Assinatura



PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (6ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 841.310,87** (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos) correspondente a um percentual **14,94%**, relativos à 6ª boletim de medição, totalizando **52,04%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 DE ABRIL DE 2025 E 28 DE MAIO DE 2025.

Este é o nosso parecer.


Maciel de Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 28 de Maio de 2025.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

MEDICÃO Nº: 06

QUADRO - RESUMO FINANCEIRO

MEDICÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024	05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024	25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024	11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025	14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025	10/04/2025
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/04/2025	28/05/2025
ACUMULADO	R\$ 2.930.069,42	52,04%		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56			

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663.46



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 08			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					635.961,84										
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %									
1.2	92370 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	m²	112,75	12,78	16,46	1.852,60	0,03 %									
1.3	C1049 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	336,71	191.504,72	3,41 %									
1.4	C3373 SINAPI	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %									
1.5	C3064 SINAPI	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INFRAESTRUTURA	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %									
2							743.864,81	13,21 %									
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %									
2.2	73859/008 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO	m³	362,53	160,00	231,90	130.728,99	2,35 %									
2.3	C0330 SINAPI	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ACRISOL	m³	5.962,79	76,52	98,71	1.283.026,16	1,24 %									
3		SUPERESTRUTURA					69.865,45										
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4,3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) -	m³	45,10	256,97	326,98	14.683,09	0,26 %									
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,1:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) -	m³	45,10	234,56	292,64	16.356,15	0,29 %									
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2,1:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) -	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,60	0,31 %									
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	m³	45,09	361,46	465,13	20.975,41	0,37 %									
4							61.350,46	1,09 %									
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %									
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44 %									
5.1	98661 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO,	m²	563,74	22,94	28,48	16.619,10	0,30 %									
5.2	C3410 SINAPI	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.891,20	239,50	306,36	521.486,89	9,26 %									
5.3	C2893 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.026,70	22,89 %									
6							116.865,94										
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO	M	335,24	166,81	214,88	72.660,58	1,25 %									
6.2	C4327 SINAPI	GALÉRIA DE FERRO FUNDIDO (600 x 500 x 10 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %									
7		GALÉRIAS TUBULARES					148.115,79	2,63 %									
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,48 %									
7.2	92674 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	225,49	82,90	81,02	18.269,36	0,32 %									
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	225,48	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %									
8		DIVERSOS					2.037.914,59	36,20 %									
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,16 %									
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %									
8.3	94268 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	M	9.016,69	43,06	55,48	500.350,34	8,89 %									
8.4	C0930 SINAPI	CORTE MANUAL EM TERRA	m²	1.891,21	54,97	70,82	119.770,69	2,13 %									
8.5	C3888 SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m²	1.891,21	122,55	157,89	287.025,62	4,74 %									
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65 %									
8.7	CPU próprio	CANALETA SIMPLES	M	289,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,25 %									
8.8	73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %									
Total Geral							6.620.973,69										

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Assinatura
Folha N°
85/85



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA
CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	493,20
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	m²	112,75	12,00
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	559,88
2		INFRAESTRUTURA			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	101,65
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	67,80
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	987,60
3		SUPERESTRUTURA			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	9,80
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	m³	45,09	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	
5		PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	176,00
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	269,90
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	2.798,50

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 6
Assinatura



6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	
7		GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	225,50	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	225,49	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	225,49	
8		DIVERSOS			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	3.976,37
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	2.931,15
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	1.578,65
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	
8.7	CPU Próprio SEINFRA	CANAleta SIMPLES	M	269,10	
8.8	73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº	1105/05
Folha Nº	0105
Assinatura	

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22
MEDIÇÃO Nº: 06		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025	6ª Med. 28/05/2025
1	SERVIÇOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80
4	ELEMENTOS DE VEDACÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,58%	37,09%	52,04%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO




OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024




5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

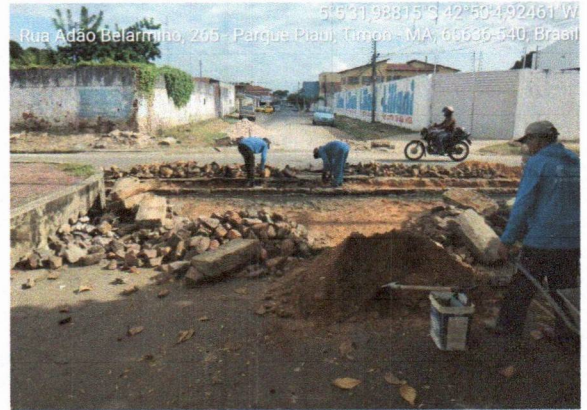

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA



1.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

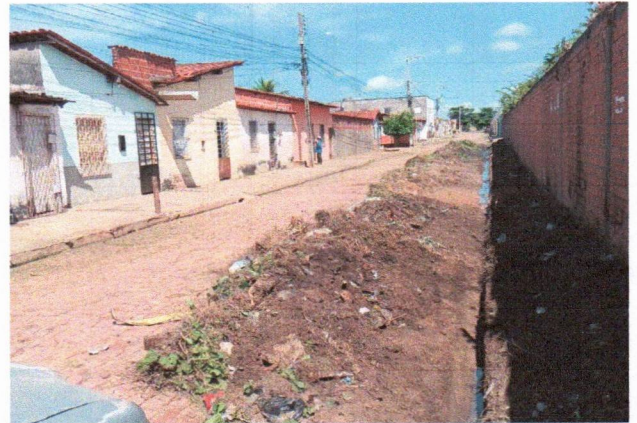

1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO



2.3 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO




3.1 CONCRETO


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 3105/25
Folha N° 01/02
Assinatura


	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

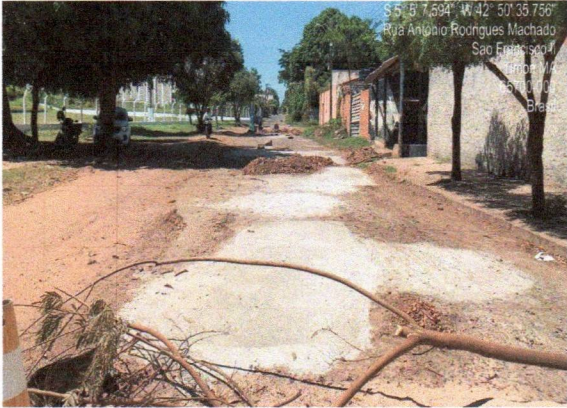

3.1 CONCRETO

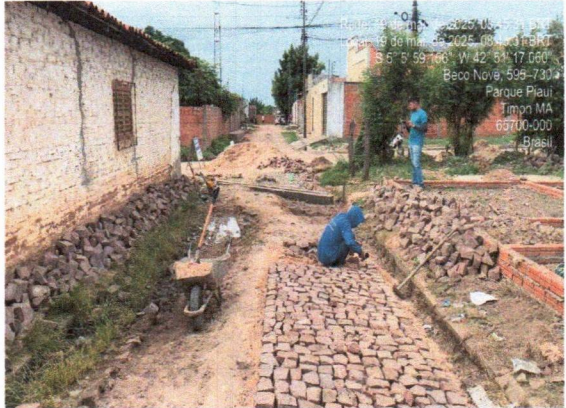

5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

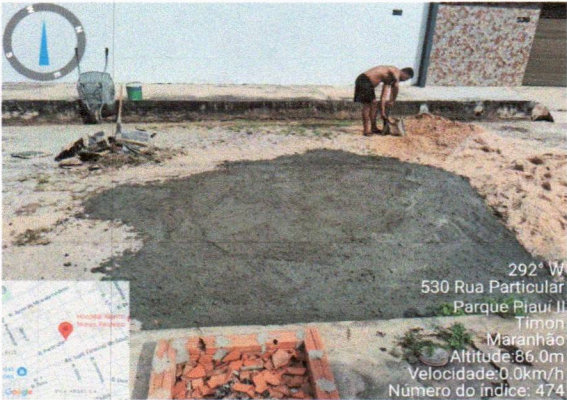


3.1 CONCRETO



1.1 CAPINA E LIMPEZA



8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

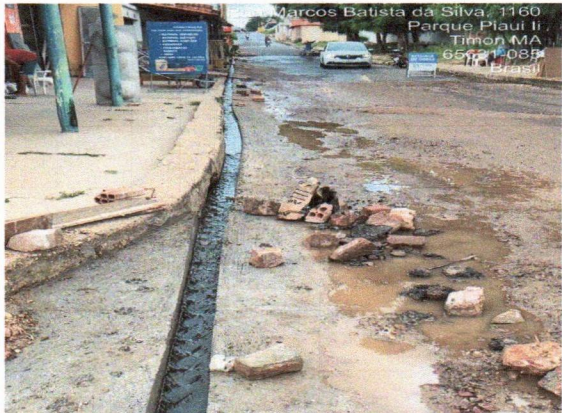

8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 3105/25
Folha N° 0109
Assinatura

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA



8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO




2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL



2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL



2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL

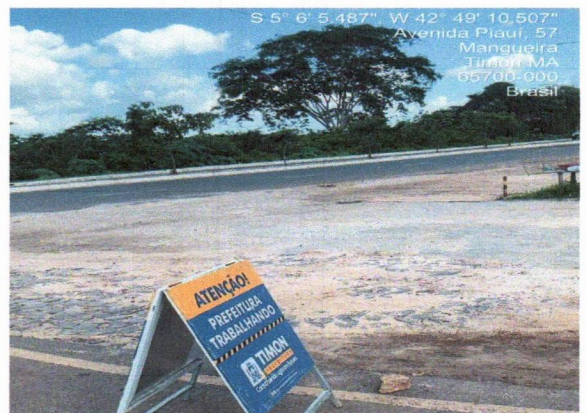

5.1 PISO CIMENTADO

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº 3105/25
Folha Nº 01
Assinatura

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



3.1 CONCRETO



3.1 CONCRETO



8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA



3.1 CONCRETO



5.1 PISO CIMENTADO



3.1 CONCRETO

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 012
Assinatura

Teresina, 28 de MAIO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 841.310,87 (Oitocentos, quarenta, um mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), referente a 6ª (SEXTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:23:50 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº 3105/25
Folha Nº 0104
Assinatura

Obra

 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA
 CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,280.00	493.20
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	m²	112.75	12.00
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	559.88
2			INFRAESTRUTURA			
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	101.65
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	67.80
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	987.60
3			SUPERESTRUTURA			
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	9.80
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	m³	45.09	
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676.45	
5			PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563.74	176.00
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1,691.20	269.90
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	2,798.50

 FRANKLANDE FELIX
 DA
 COSTA:81764197372
 Assinado de forma digital
 por FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372
 Dados: 2025.05.28 13:13:50
 -03'00'

 Proc N° 3105/25
 Folha N°
 Assinatura

6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	
7		GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	225.50	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	225.49	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	225.49	
8		DIVERSOS			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,020.78	3,976.37
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,511.09	2,931.15
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,018.68	1,578.65
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1,691.20	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1,691.21	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	
8.7	CPU Próprio	CANALETA SIMPLES	M	269.10	
8.8	SEINFRA 73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897.69	

FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
 FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372
 Dados: 2025.05.28 13:14:02 -03'00'

Proc N° 5105/25
 Folha N° 01
 Assinatura [assinatura]

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -									
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA					CONTRATO Nº: 18/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON					CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22				
MEDICÇÃO Nº: 06					QUADRO - RESUMO FINANCEIRO				
MEDICÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE						
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM							
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%							
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%							
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%							
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%							
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%							
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%							
ACUMULADO	R\$ 2.930.069,42								
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56	52,04%							

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:13:38 -03'00'

Proc Nº 5105/25
Folha Nº 01
Assinatura



OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEDICÃO Nº: 06			PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMONIMA		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATO Nº: 18/2024		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22		
Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025	6ª Med. 28/05/2025			
1	SERVIÇOS	625,961.84	24,549.50	33,358.43	22,672.18	44,936.72	49,491.32	7,609.48			
2	INFRAESTRUTURA	743,664.81	117,569.26	76,913.17	52,274.32	72,992.51	85,051.93	163,525.57			
3	SUPERESTRUTURA	69,663.45	3,036.15	687.60	467.33	1,362.82	2,352.76	3,233.80			
4	ELEMENTOS DE VEDACÃO	61,550.46	-	-	-	-	-	-			
5	PAVIMENTAÇÃO	1,826,146.69	264,464.11	268,891.26	182,752.94	275,474.81	288,177.51	248,265.16			
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116,955.94	-	-	-	-	-	-			
7	GALERIAS TUBULARES	148,115.79	-	-	-	-	-	-			
8	DIVERSOS	2,037,914.59	34,024.23	46,232.93	31,422.38	55,306.90	54,295.50	418,676.85			
Porcentagem			7.88%	7.57%	5.14%	7.99%	8.51%	14.94%			
Custo			443,643.24	426,083.39	289,589.14	450,073.76	479,369.02	841,310.87			
Porcentagem Acumulado			7.88%	15.45%	20.59%	28.58%	37.09%	52.04%			
Custo Acumulado			443,643.24	869,726.63	1,159,315.78	1,609,389.54	2,088,758.56	2,930,069.42			

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:14:15 -03'00'

Proc Nº 3105/25
Folha Nº 01009
Assinatura



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SAREJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS
EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMONIA, CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIDA ACUMULADA ANTERIOR			MEDIDA ATUAL DE			MEDIDA ACUMULADA ATUAL		
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLICOES					628.981,84											
1.1	73690002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.200,00	1,44	1,86	4.200,81	0,07%		1.468,77	2.731,91	64,90%	483,20	917,35	1,22%		182.817,63	28,17%
1.2	92970 SINAPI	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03%		67,10	773,27	41,78%	12,00	197,52	0,00%	1.861,97	3.649,26	66,81%
1.3	C1048 SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m²	550,73	339,71	203,69	191.504,71	3,40%				0,00%			0,00%	59,10	972,79	0,49%
1.4	C1048 SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m²	550,73	339,71	203,69	191.504,71	3,40%				0,00%			0,00%			0,00%
1.5	C3004 SENFRA	DEMOLICAO E REMOICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E	m²	30.579,02	11,80	9,00	275.211,12	6,30%		14.784,57	171.600,97	48,33%	550,88	6.484,61	1,83%	15.344,45	177.985,58	50,16%
2		INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%										
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO DE CORDOEA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CINZAREA 1.4	m²	563,72	384,57	466,07	279.040,66	4,86%		329,42	183.064,36	59,44%	101,85	59.316,75	18,03%	431,07	213.381,11	76,47%
2.2	73690000 SINAPI	ESCAVAICAO MANUAL DE VALA EM LOCO DE 1.5 ATE 3M, EXCLUIDO	m³	563,72	180,00	231,90	102.128,99	2,32%		357,00	82.789,35	63,33%	67,80	15.722,82	12,03%	424,80	98.512,17	75,36%
2.3	C0330 SENFRA	TIPO DE COBERTURA MANUAL S/CONTROLE MAT. COBERTURA	m²	3.382,59	79,62	88,71	333.955,16	5,83%		1.610,25	158.847,47	47,00%	987,50	97.488,00	29,20%	2.597,75	256.433,47	78,80%
3		SUPERFÍCIE					9.683,45	1,24%										
3.1	84693 SINAPI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRACO 13.43.5 CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA	m³	45,10	256,97	320,96	14.883,56	0,26%		23,98	7.906,65	53,13%	9,80	3.333,80	21,73%	33,76	11.140,46	74,85%
3.2	94864 SINAPI	CONCRETO FCK - 20MPa, TRACO 12.7.3 CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1º	m³	45,10	362,64	382,64	16.356,15	0,29%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3	94868 SINAPI	CONCRETO FCK - 30MPa, TRACO 12.12.3 CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA	m³	45,10	306,91	306,91	17.450,80	0,31%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4	73301 SINAPI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRACO 13.43.5 CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA	m³	45,09	465,13	465,13	20.971,41	0,37%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.599,48	1,00%										
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	m²	678,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09%										
5		PAVIMENTAÇÃO					1.626.146,49	26,44%										
5.1	84693 SINAPI	PREO CIMENTO/CO, TRACO 13.43.5 CIMENTO/AREIA/ACABAMENTO RUSTICO	m³	563,74	22,84	29,48	16.819,10	0,30%		258,59	7.873,54	45,87%	175,00	5.188,48	31,22%	432,00	12.752,02	76,79%
5.2	C3110 SENFRA	CALEADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTO/CO BASE DE CONCRETO	m²	1.891,20	23,52	29,50	44.370,38	0,78%		1.820,39	43.073,52	77,40%	2.653,00	1.678,94	15,95%	4.473,39	14.881,38	73,35%
5.3	C2893 SENFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO ARGENTADO	m²	22.549,52	44,36	37,12	1.000.000,00	16,36%		15.203,39	668.532,06	67,00%	2.738,50	19.859,32	1,98%	18.003,89	1.028.382,38	60,00%
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,54	2,08%										
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG - 20CM	M	338,24	168,81	214,68	79.000,58	1,52%										
6.2	C4327 SENFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (600 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	302,70	44.275,35	0,79%										
7		GALERIAS TUBULARES					148.115,79	2,83%										
7.1	85271 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	225,49	92,14	118,69	26.765,01	0,48%										
7.2	82824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	225,49	62,90	81,02	18.260,38	0,32%										
7.3	82223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS,	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83%										
8		DIVERSOS					3.976.914,89	64,29%										
8.1	84273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18%										
8.2	94205 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50%										
8.3	84208 SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	M	9.018,68	43,06	55,48	500.354,34	8,89%		3.989,50	221.281,94	44,22%	1.578,05	87.881,50	17,50%	5.567,55	308.865,44	61,73%
8.4	C2030 SENFRA	REMOICAO MANUAL DA CANADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m²	1.891,21	122,55	107,89	231.500,46	4,74%										
8.5	C3888 SENFRA	EXECUÇÃO DE SAREJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	225,49	126,56	163,04	36.762,34	0,65%										
8.6	94293 SINAPI	CANALETA SIMPLES	M	299,10	1.020,93	1.315,86	354.007,93	6,29%										
8.7	73690005 SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,	M	897,89	88,46	113,94	102.300,75	1,82%										
8.8	73690005 SINAPI		M															
Total Geral							5.628.873,65				2.088.795,48	37,10%		841.310,87	14,94%		2.930.069,42	52,04%

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA-81764197372
Dados: 2025.05.28 13:13:23
COSTA:81764197372 437007





Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918219993



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024




5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA



1.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

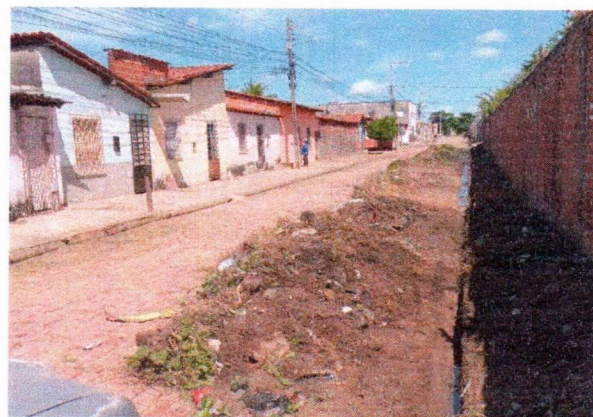

1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:18:18
-03'00'

Proc N°	3105/25
Folha N°	01
Assinatura	



Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-P/RN 1918219993



2.3 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO



3.1 CONCRETO




PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

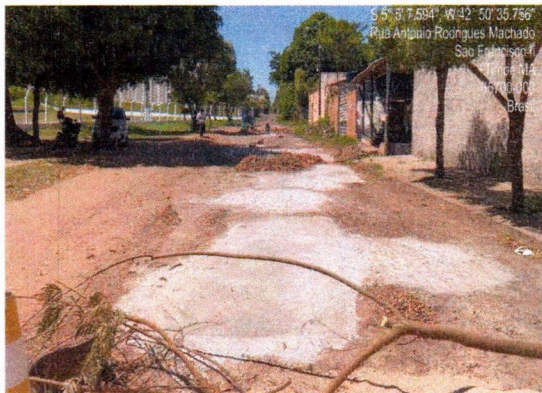

3.1 CONCRETO

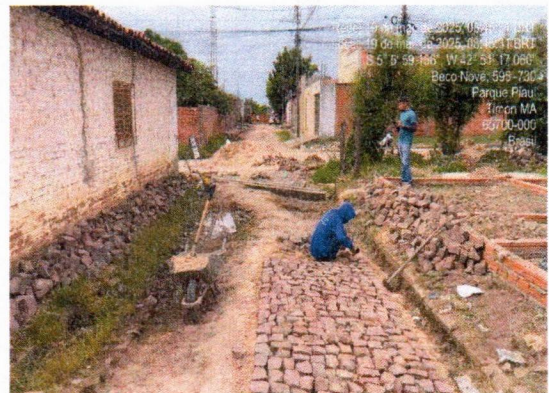

5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:18:38 -03'00'

Proc N° 3105/25
Folha N°
Assinatura



Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-P/MA 1918219993



FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:18:52
-03'00'

Proc N°	3105/25
Folha N°	01 de 01
Assinatura	

3.1 CONCRETO	1.1 CAPINA E LIMPEZA
--------------	----------------------

8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA	8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:19:19 -03'00'



Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro CNII
CREA-PURN 1918219693




3.1 CONCRETO





3.1 CONCRETO



8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA

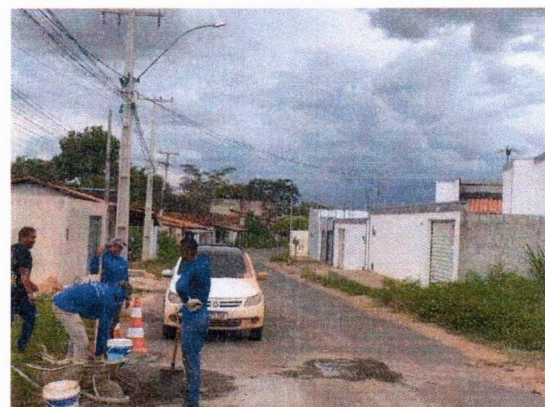

3.1 CONCRETO

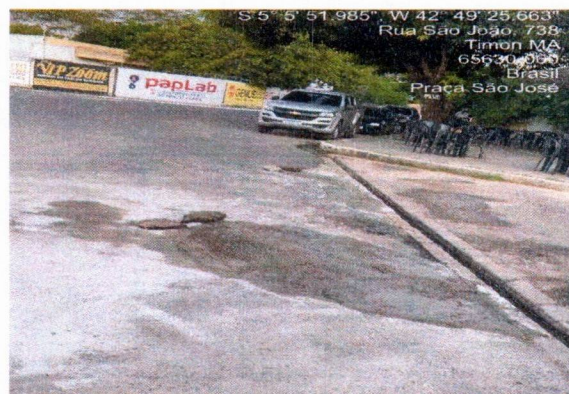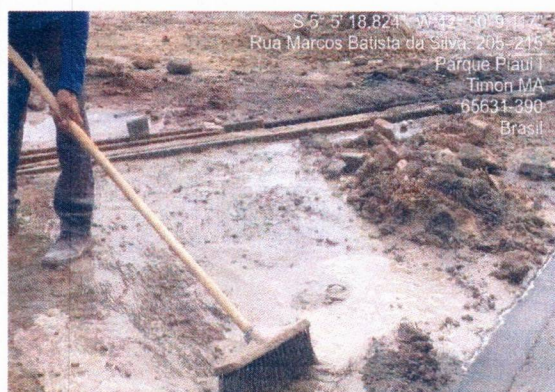


FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:19:40 -03'00'


Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura



Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PIRN 1916219993

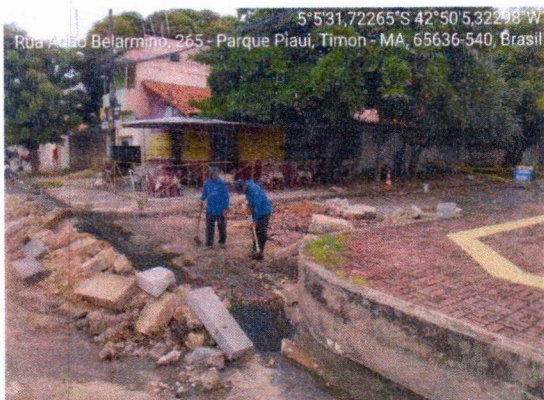


2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL

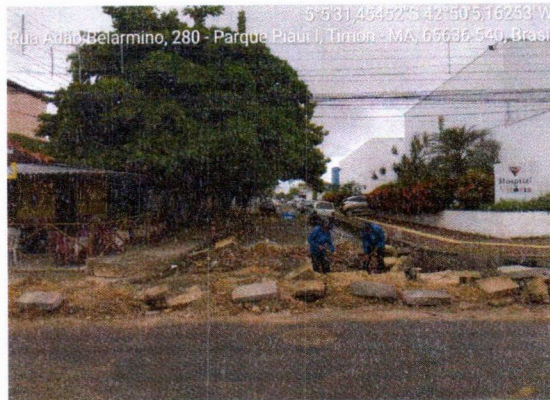

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL



2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL

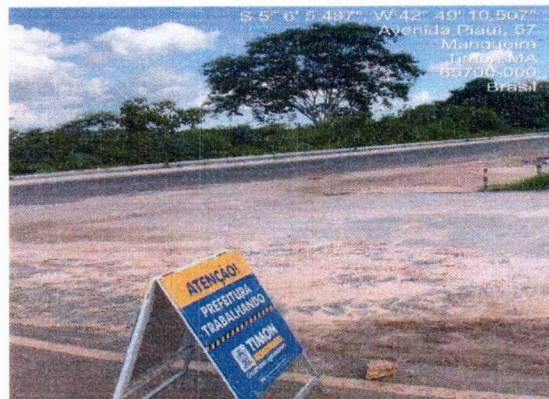

5.1 PISO CIMENTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:19:30 -03'00'

Proc N°	3105/25
Folha N°	0104
Assinatura	



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000134

Data e Hora de Emissão

28/05/2025 13:16:45

Código de Verificação

bb3a88cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **27.537.410/0001-22**

Inscrição Municipal : **463993-6**

Endereço: **CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, Nº1 - BAIRRO VALE DO GAVIAO - CEP:64069-120**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREF MUNICIPAL DE TIMON**

CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**

Endereço: **PRACA SAO JOSE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:65630-160**

Município: **TIMON**

UF: **MA**

E-mail: **f.costaconstrutoraltda@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 018/202	1	841310,87,00	841.310,87
ATESTO ☒ Os serviços foram realizados ☐ Os materiais foram entregues Timon-(MA) <u>28/05/25</u> Maclei do Nascimento Lopes Engenheiro Civil CREA 1919112979 Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA CPF: 016.156.663-46				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (1,1000%):
R\$ 9.254,42

IR (1,2000%):
R\$ 10.095,73

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841.310,87

Valor Total das Deduções:

R\$ 168.262,17

Base de Cálculo:

R\$ 673.048,70

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 33652,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **TIMON/MA**

Incidência: **TIMON/MA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 01
Assinatura [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO N° 018/2024

RECIBO

R\$ 841.310,87

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 841.310,87 (Oitocentos, quarenta e um mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), referente a 6ª (SEXTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000134.

Teresina, ____ de _____ 2025.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.05.28 13:24:01 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura
