

12ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 - próprio

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 588.181,01

Teresina, 24 de novembro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 12ª (décima segunda) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por

FRANKLANDE FELIX DA

COSTA:81764197372

Dados: 2025.11.24 09:06:32 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 12ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (12ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.


Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 388.181,01** (trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e um centavo) correspondente a um percentual **6,89%**, relativos à 12ª boletim de medição, totalizando **96,45%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO 2025 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025.

Este é o nosso parecer.


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 25 de novembro de 2025.

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024



SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 12			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84										
1.1	73859/002	SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	2.260,00	499.560,89	79,81%	-	R\$ 43.293,35	6,92%		542.854,18	86,72%
1.2	92970	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	112,75	1.855,87	100,00%	-	-	0,00%		4.203,61	100,00%
1.3	C1049	SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	563,73	191.504,72	100,00%	-	-	0,00%		1.855,80	100,00%
1.4	C373	SEINFRA RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	5,641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	5.164,80	67.452,39	91,55%	476,94	6.228,84	8,45%		73.681,11	100,00%
1.5	C3064	SEINFRA DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	20.219,35	234.544,42	66,12%	3.135,22	37.064,52	10,45%		271.608,95	76,57%
2		INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%									
2.1	95467	SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	563,72	279.042,86	100,00%	-	-	0,00%		563,72	100,00%
2.2	73965/009	SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCOMAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	563,73	130.730,04	100,00%	-	-	0,00%		563,73	100,00%
2.3	C0330	SEINFRA ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	3.382,59	333.895,15	100,00%	-	-	0,00%		333.895,16	100,00%
3		SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%									
3.1	94963	SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	45,10	14.882,43	100,00%	-	-	0,00%		45,10	100,00%
3.2	94964	SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	45,11	16.356,88	100,00%	-	-	0,00%		45,11	100,00%
3.3	94966	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	45,11	17.451,58	100,00%	-	-	0,00%		45,11	100,00%
3.4	73361	SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	45,09	20.972,71	100,00%	-	-	0,00%		45,09	100,00%
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%									
4.1	87523	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X41X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	422,10	38.406,88	62,40%	254,35	23.143,31	37,60%		61.550,46	100,00%
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%									
5.1	98681	SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	563,74	16.619,19	100,00%	-	-	0,00%		563,74	100,00%
5.2	C3410	SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.691,20	521.497,88	100,00%	-	-	0,00%		521.498,89	100,00%
5.3	C2893	SEINFRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (ARGEGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %	22.549,52	1.288.028,77	100,00%	-	-	0,00%		1.288.028,70	100,00%
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%									
6.1	83624	SINAPI ESQUADRIA DE FERRO FUNDIDO PARA CANTALHA LARG - 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%		-	0,00%
6.2	C4327	SEINFRA GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%		-	0,00%

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663.46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 028/2024



Orçamento Sintético

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 12				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
7			GALERIAS TUBULARES																		
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	92,14	118,69	148.115,79	2,63%	100,00	121.558,91	82,07%		R\$ 26.555,39	17,93%	225,50	148.115,79	100,00%			
								26.765,01	0,48 %		11.869,00	44,35%	125,50	14.895,60	55,65%		26.765,01	100,00%			
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32 %	225,40	18.261,91	99,96%		7,29	0,04%	225,49	18.269,36	100,00%			
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %	200,00	91.428,00	88,69%	25,49	11.652,50	11,30%	225,49	103.081,41	100,00%			
8			DIVERSOS																		
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	39,61	51,03	2.037.914,59	36,20%	9.020,78	1.742.787,60	85,52%		R\$ 295.125,96	14,48%		2.037.914,59	100,00%			
								460.330,61	8,18 %		460.330,40	100,00%	-	-	0,00%	9.020,78	460.330,61	100,00%			
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %	4.511,09	197.269,97	100,00%	-	-	0,00%	4.511,09	197.270,12	100,00%			
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89 %	9.018,68	500.356,33	100,00%	-	-	0,00%	9.018,68	500.356,34	100,00%			
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %	714,70	50.615,05	42,26%		69.155,73	57,74%	1.691,20	119.770,89	100,00%			
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74 %	694,70	109.686,18	41,08%	996,51	157.338,96	58,92%	1.691,21	267.025,62	100,00%			
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETAÇÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65 %	225,48	36.762,26	100,00%	-	-	0,00%	225,48	36.762,34	100,00%			
8.7	CPU SEINFRA TIMON/724	Próprio	CANALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29 %	269,10	354.097,93	100,00%		-	0,00%	269,10	354.097,93	100,00%			
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %	295,45	33.669,48	32,91%	602,24	68.631,27	67,09%	897,69	102.300,75	100,00%			
																</					

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

TIMON

MEDICÇÃO Nº: 12

QUADRO - RESUMO FINANCEIRO

MEDICÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024	05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024	25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024	11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025	14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025	10/04/2025
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/04/2025	28/05/2025
7ª	R\$ 451.510,46	8,02%	29/05/2025	26/06/2025
8ª	R\$ 506.114,74	8,99%	27/06/2025	24/07/2025
9ª	R\$ 502.073,22	8,92%	25/07/2025	26/08/2025
10ª	R\$ 351.238,23	6,24%	27/08/2025	24/09/2025
11ª	R\$ 300.785,69	5,34%	25/09/2025	27/10/2025
12ª	R\$ 388.118,01	6,89%	28/10/2025	25/11/2025
ACUMULADO	R\$ 5.429.909,77	96,45%		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56			

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	-
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	-
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	-
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	476,94
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	3.195,22
2			INFRAESTRUTURA			-
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	-
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	-
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	-
3			SUPERESTRUTURA			-
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	-
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			-
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E	m²	676,45	254,35
5			PAVIMENTAÇÃO			-
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	-
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	-
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			-
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	-
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	-

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	125,50
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	0,09
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	25,49
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	-
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	-
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	976,50
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	996,51
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	-
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269,10	-
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	602,24

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOINHA				CONTRATO Nº: 18/2024				CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22											
MEDIDAÇÃO Nº: 12				Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025	6ª Med. 28/05/2025	7ª Med. 26/06/2025	8ª Med. 24/07/2026	9ª Med 26/08/2025	10ª Med 24/09/2025	11ª Med 27/10/2025	12ª Med 25/11/2025	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	63.415,66	18.743,59	43.293,35	
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67	48.011,29	9.210,77		
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68			
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12	-		23.143,31	
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58			
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	154.879,11	203.095,33	26.555,35	
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%	5,34%	6,89%	
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	351.238,23	300.785,69	388.118,01	
Porcentagem Acumulada			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%	89,55%	96,45%	
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,86	3.887.694,62	4.389.767,94	4.741.006,07	5.041.791,76	5.429.909,77	

Maíel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112079
Portaria N° 0146/2025-GP/SEINFRA
CPF: 016.156.653-45




SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO

DATA DE INICIO		DATA DE FIM	PERIODO	MEDIÇÃO	PÁGINA
			28/10/2025 a 25/11/2025	012	003
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA				
CONTRATO	18/2024				

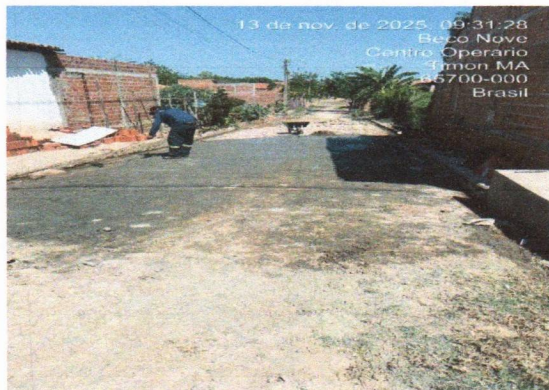

1.5

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO

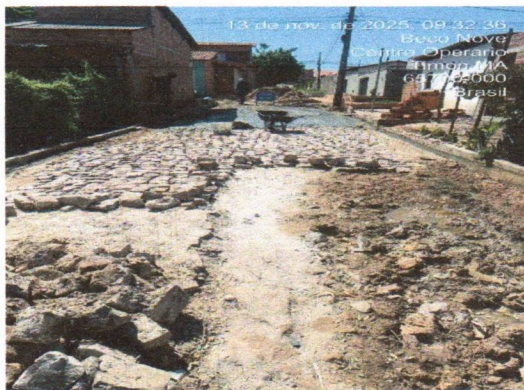

1.5

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO



8.4

CORTE MANUAL EM TERRA




8.5

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO
PAVIMENTO



8.5

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO
PAVIMENTO

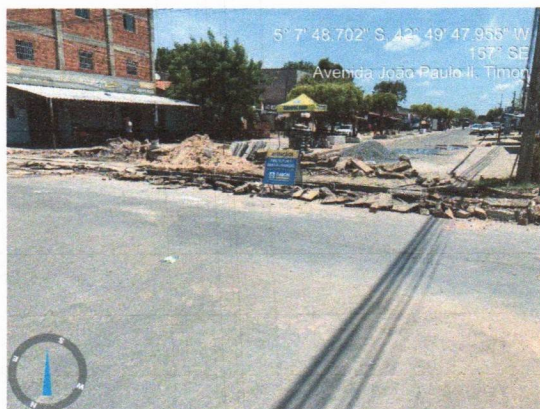

8.5

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO
PAVIMENTO

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46




SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO

DATA DE INICIO		DATA DE FIM	PERIODO	MEDIÇÃO	PÁGINA
			28/10/2025 a 25/11/2025	012	003
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA				
CONTRATO	18/2024				

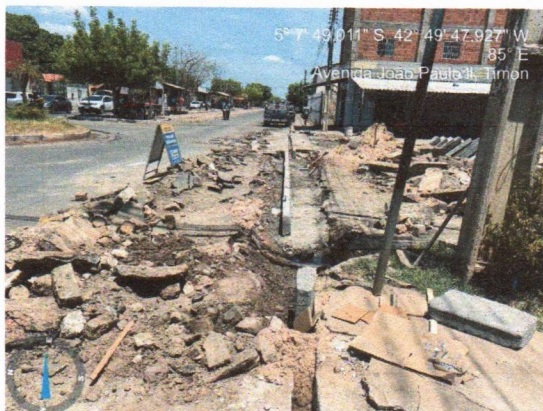


1.4

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

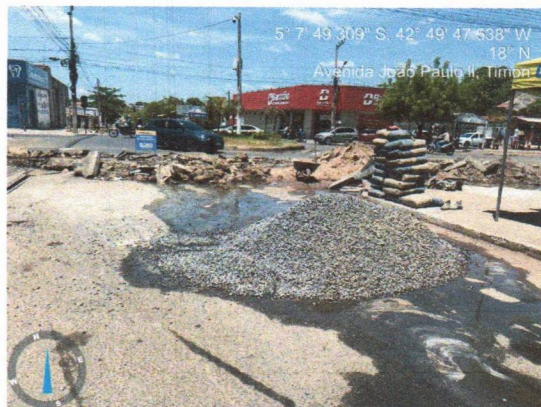

1.4

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

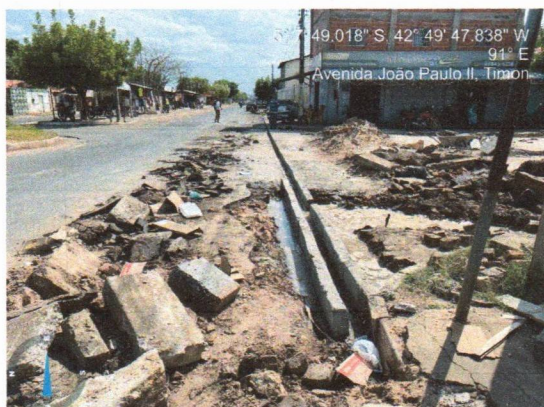


1.4

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA




8.4

CORTE MANUAL EM TERRA

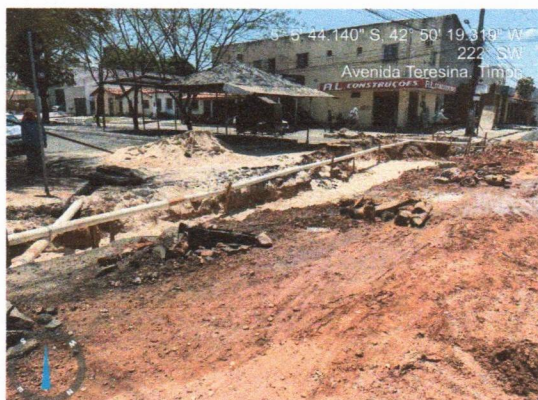

8.5

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

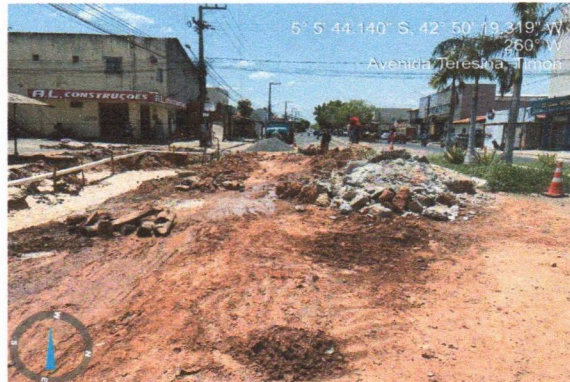

8.5

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS,
SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO

DATA DE INICIO	DATA DE FIM	PERIODO	MEDIÇÃO	PÁGINA
		28/10/2025 a 25/11/2025	012	003
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA			
CONTRATO	18/2024			




8.4

CORTE MANUAL EM TERRA

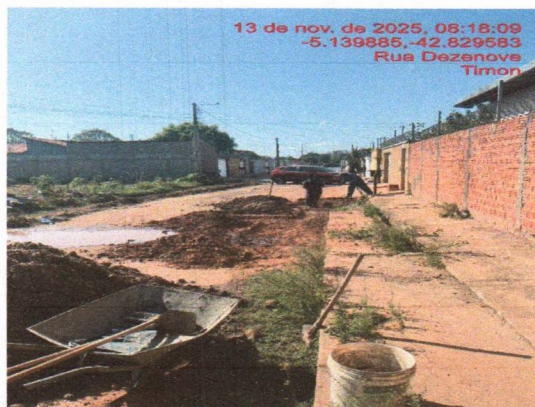

8.4

CORTE MANUAL EM TERRA

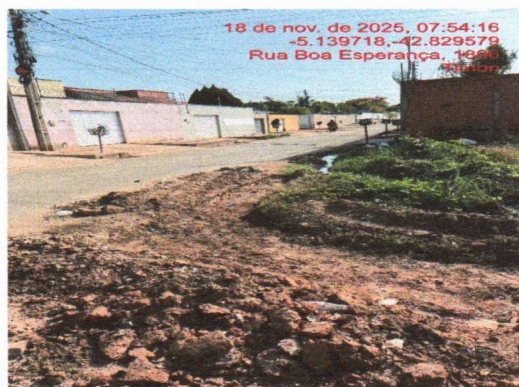

8.4

CORTE MANUAL EM TERRA



8.4

CORTE MANUAL EM TERRA

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Teresina, 25 de novembro de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 388.118,01 (Trezentos oitenta e oito mil, cento e dezoito reais um centavos), referente a 12ª (décima segunda) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA

COSTA:81764197372

Dados: 2025.11.25 12:04:51 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



GT4013lof

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/11/2025 11:51:47
Competência 11/2025
Número / Série 154 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.537.410/0001-22
Nome / Nome Empresarial
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP
Endereço
CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07 1 S/N VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal 463993-6
Telefone (86) 3212-2837
E-mail
CLARICESOARES27@HOTMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64069-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.115.307/0001-14
Nome / Nome Empresarial
PREF MUNICIPAL DE TIMON
Endereço
PRACA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (86) 99472-5158
E-mail
f.costaconstrutoraltda@gmail.com
Município TIMON / MA B

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA E MECANICA DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
Local da prestação do serviço
TIMON / MA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024 DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GABOIS E OUTROS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA



Responsável
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN TIMON - MA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
388.118,01	77.623,60	0,00	310.494,41	5,000000	15.524,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.657,41	0,00	0,00	4.269,29	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
310.494,41	8.926,70	0,00	0,00	379.191,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO

R\$ 388.118,01

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 388.118,01 (Trezentos oitenta e oito mil, cento e dezoito reais um centavos), referente a 12ª (décima segunda) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000154.

Teresina, ____ de ____ 2025.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.11.25 12:04:37 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético

Orçamento Simétrico										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 12				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
1	73859/002	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84		79,81%	499.560,89	79,81%		43.293,16	6,92%		542.853,99	86,72%			
			CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	4.203,61	0,07%	2.260,00	4.203,60	100,00%	2.260,00	4.203,61	100,00%							
			DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	1.855,80	0,03%	112,75	1.855,87	100,00%	112,75	1.855,80	100,00%							
			DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40%	563,73	191.504,72	100,00%	563,73	191.504,72	100,00%						
			RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	73.681,11	1,31%	5.164,80	67.452,29	91,55%	476,94	6.228,84	8,45%	5.641,74	73.681,11	100,00%				
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30%	20.219,35	234.544,42	66,12%	3.195,20	37.064,32	10,45%	23.414,55	271.608,75	76,57%			
2	95467	SINAPI	INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%	743.668,05	100,00%		-	0,00%		743.664,81	100,00%				
			EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96%	563,72	279.042,86	100,00%	563,72	279.040,66	100,00%						
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32%	563,73	130.730,04	100,00%	-	-	0,00%	563,73	130.728,99	100,00%			
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93%	3.382,59	333.895,15	100,00%	-	-	0,00%	3.382,59	333.895,16	100,00%			
3	94963	SINAPI	SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%	69.663,59	100,00%		-	0,00%		69.663,45	100,00%				
			CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26%	45,10	14.882,43	100,00%	45,10	14.883,09	100,00%						
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29%	45,11	16.356,88	100,00%	-	-	0,00%	45,11	16.356,15	100,00%			
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,12:2,5 (CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31%	45,11	17.451,58	100,00%	-	-	0,00%	45,11	17.450,80	100,00%			
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37%	45,09	20.972,71	100,00%	-	-	0,00%	45,09	20.973,41	100,00%			
4	87523	SINAPI	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%	38.406,88	62,40%		23.143,31	37,60%		61.550,46	100,00%				
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF -06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09%	422,10	38.406,88	62,40%	254,35	23.143,31	37,60%	676,45	61.550,46	100,00%			
5	98681	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%	1.826.145,83	100,00%		-	0,00%		1.826.146,69	100,00%				
			PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF -09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30%	563,74	16.619,19	100,00%	563,74	16.619,10	100,00%						
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26%	1.691,20	521.497,88	100,00%	-	-	0,00%	1.691,20	521.498,89	100,00%			
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88%	22.549,52	1.288.028,77	100,00%	-	-	0,00%	22.549,52	1.288.028,70	100,00%			
6	83624	SINAPI	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
			GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA-817641973
72

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA-81764197372
Dados: 2025.11.25
12:43:11 -03'00'



Bruno Vilas Boas Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA 1916219993

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 12			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
6.2	C4327	SEINFRA GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44 275,35	0,79 %	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:8176419
7372

Assinado de forma
digital por FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.11.25
12:43:22 -03'00'

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MÁ. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 12			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
									QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
7		GALERIAS TUBULARES					148.115,79	2,63%									
7.1	95571	SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,48 %	100,00	11.869,00	44,35%		26.555,39	17,93%	225,50	148.115,79	100,00%
7.2	92824	SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	62,90	81,02	18.269,36	0,32 %	225,40	18.261,91	99,96%	0,09	7,29	0,04%	225,49	18.269,36	100,00%
7.3	92223	SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	354,88	457,14	103.081,41	1,83 %	200,00	91.428,00	88,69%	25,49	11.652,50	11,30%	225,49	103.081,41	100,00%
8		DIVERSOS					2.037.914,59	36,20%									
8.1	94273	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	39,61	51,03	460.330,61	8,18 %	9.020,78	460.330,40	100,00%		295.125,96	14,48%	9.020,78	2.037.914,59	100,00%
8.2	94265	SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50 %	4.511,09	197.269,97	100,00%		-	0,00%	4.511,09	197.270,12	100,00%
8.3	94288	SINAPI EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	43,06	55,48	500.356,34	8,89 %	9.018,68	500.356,33	100,00%		-	0,00%	9.018,68	500.356,34	100,00%
8.4	C0930	SEINFRA CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	54,97	70,82	119.770,89	2,13 %	714,70	50.615,05	42,26%	976,50	69.155,73	57,74%	1.691,20	119.770,89	100,00%
8.5	C3888	SEINFRA REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	122,55	157,89	267.025,62	4,74 %	694,70	109.686,18	41,08%	996,51	157.338,96	58,92%	1.691,21	267.025,62	100,00%
8.6	94293	SINAPI EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	126,56	163,04	36.762,34	0,65 %	225,48	36.762,26	100,00%		-	0,00%	225,48	36.762,34	100,00%
8.7	CPU SEINFRA TIMON/724	Próprio CANALETA SIMPLES	M	269,10	1.020,93	1.315,86	354.097,93	6,29 %	269,10	354.097,93	100,00%		-	0,00%	269,10	354.097,93	100,00%
8.8	73882/005	SINAPI CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	88,46	113,96	102.300,75	1,82 %	295,45	33.669,48	32,91%	602,24	68.631,27	67,09%	897,69	102.300,75	100,00%
				Total Geral			5.629.973,56			5.041.791,76	89,55%		388.118,01	6,89%		5.429.909,77	96,45%

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024.			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº. 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDICÇÃO Nº: 12		QUADRO - RESUMO FINANCEIRO	
MEDICÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO	PERCENTAGEM	PERÍODO CORRESPONDENTE
	MONETÁRIO		INÍCIO FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024 05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024 25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024 11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025 14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025 10/04/2025
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/04/2025 28/05/2025
7ª	R\$ 451.510,46	8,02%	29/05/2025 26/06/2025
8ª	R\$ 506.114,74	8,99%	27/06/2025 24/07/2025
9ª	R\$ 502.073,22	8,92%	25/07/2025 26/08/2025
10ª	R\$ 351.238,23	6,24%	27/08/2025 24/09/2025
11ª	R\$ 300.785,69	5,34%	25/09/2025 27/10/2025
12ª	R\$ 388.118,01	6,89%	28/10/2025 25/11/2025
ACUMULADO	R\$ 5.429.909,77		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56	96,45%	

FRANKLANDE FELIX Assinado de forma digital
DA por FRANKLANDE FELIX
COSTA:8176419737 DA COSTA:81764197372
2 Dados: 2025.11.25
12:43:42 -03'00'

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	-
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	-
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	-
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	476,94
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	3.195,20
2			INFRAESTRUTURA			-
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	-
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	-
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	-
3			SUPERESTRUTURA			-
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	-
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	-
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			-
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E PAVIMENTAÇÃO	m²	676,45	254,35
5			PAVIMENTAÇÃO			-
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	-
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	-
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			-
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	-
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	-

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.11.25 12:43:51
-03'00'

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	125,50
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	0,09
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	25,49
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	-
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	-
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	976,50
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	996,51
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	-
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269,10	-
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	602,24

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.11.25 12:44:00 -03'00'

ORÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMONIMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CONTRATO Nº: 18/2024
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJON														CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 27.337.410/0001-22													
MEDICÃO Nº: 12														Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 26/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2025	9º Med 26/08/2025	10º Med 24/09/2025	11º Med 27/10/2025	12º Med 25/11/2025													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55	63.415,66	18.743,59	43.293,16													
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67	48.011,29	-	-													
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72	12.805,68	9.210,77	-													
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.136,76	15.268,12	-	-	23.143,31													
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04	20.303,58	-	-													
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
7	GALÉRIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11	154.879,11	203.095,33	295.125,96													
	Porcentagem		7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%	6,24%	5,34%	6,89%													
	Custo		443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22	351.238,23	300.785,69	388.118,01													
	Porcentagem Acumulado		7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%	84,21%	89,55%	96,45%													
	Custo Acumulado		443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,62	4.389.767,84	4.741.006,07	5.041.791,76	5.429.909,77													

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA-81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA-81764197372
Dados: 2025.11.25 12:44:09 -03'00'

DATA DE INICIO	DATA DE FIM	PERIODO	MEDIÇÃO	PÁGINA
		28/10/2025 a 25/11/2025	012	003
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA			
CONTRATO	18/2024			

 S: 149640355, 42: 82953408W 1818 Avenida Boa Esperança Paralelo Boa Esperança Timon Maranhão	 S: 149750384, 42: 82953408W 1806 Avenida Boa Esperança Paralelo Boa Esperança Timon Maranhão		
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA

Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PIRN 1918219993

FRANKLANDE
FELIX DA
COSTA:817641973
72

Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX
DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.11.25
12:49:05 -03'00'



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.537.410/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:50:11 do dia 16/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2026.

Código de controle da certidão: **217A.DC0F.7974.C512**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Serviços do Contribuinte
Portal de Serviços da Receita

Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 27.537.410/0001-22 Período 25/11/2024 a 25/11/2025

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
217A.DC0F.7974.C512	Positiva com efeitos de negativa	16/10/2025 - 11:50:11	14/04/2026	Válida	Download
4658.FB11.97A6.0748	Positiva com efeitos de negativa	03/10/2025 - 10:37:07	01/04/2026	Válida	Download
6A01.FF5D.305C.BCCE	Positiva com efeitos de negativa	30/09/2025 - 20:07:07	29/03/2026	Válida	Download
C537.24D1.9C69.427C	Positiva com efeitos de negativa	03/09/2025 - 15:38:48	02/03/2026	Válida	Download
9F45.8ED0.3CC6.62CE	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 21:49:01	01/03/2026	Válida	Download

Exibir: 5

1-5 de 15 itens

Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)





ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218339873

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2025 13:05:09
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 70BFB973-809C-464E-A07A-71D7A96709FD



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318339210

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2025 13:05:45
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 932F7461-62CB-4FFB-97A2-47584666090C

CERTIDÃO
1.0.0

Menu Certidão

Negativa de Débitos

Menu Certidão

Negativa de Dívida Ativa

Menu Consultas

Consultar Solicitação de Certidão

SIAT WEB

Início / Menu Consultas / Consultar Solicitação de Certidão

Consultar Solicitação de Certidão

CPF/CNPJ

27.537.410/0001-22

Número da Solicitação

A verificação expirou. Marque a caixa de seleção novamente.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA

Proteja seu site

LIMPAR

CONSULTAR

Tipo de Certidão	Especie de Certidão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Status	Número de Solicitação	Data de Solicitação	Tipo de Emissão	Data de Emissão	Data de Validade	Ações
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2500010118339228	27/10/2025 13:05:41	AUTOMÁTICA	27/10/2025 13:05:45	26/12/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2500010018339881	27/10/2025 13:05:09	AUTOMÁTICA	27/10/2025 13:05:09	26/12/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010114912916	28/08/2025 16:33:06	AUTOMÁTICA	28/08/2025 16:33:12	27/10/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010014912876	28/08/2025 16:32:46	AUTOMÁTICA	28/08/2025 16:32:46	27/10/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010111895113	02/07/2025 12:44:56	AUTOMÁTICA	02/07/2025 12:45:01	31/08/2025	

5

1-5 de 18

© 2021 - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ-PI. Desenvolvido por D2ti.

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/certidao/consultas/consultar-solicitacao-certidao>

1/1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.613/25-83

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:31 h, do dia 24/11/2025.

Validade: 22/02/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Confirmar

Limpar

Número da certidão

0.336.613/25-83

Código de autenticidade

27F9B995EDF32D68

Nota Obrigatória

Para manter um sistema bem atualizado

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 24/11/2025 às 10:24

Válida até 22/02/2026

Código controle 0.336.613/25-83

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22 Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, 1 Complemento: S/N Bairro: BAIRRO VALE DO GAVIAO Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.069-120

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão Social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: CJ SIGEFREDO PACHECO II SN / VALE DO GAVIAO / TERESINA / PI / 64069-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111410054907643972

Informação obtida em 24/11/2025 09:20:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111410054907643972
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102601234907643961
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100519454907643917
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091607314907643945
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820314907643901
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121004907643920
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223374907643910
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320404907643981
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503194907643983
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603004907643947
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709174907643925
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902124907643970
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022154907643983
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908384907643923
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109144907643905
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202544907643919
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403304907643907
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503164907643914
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602254907643904
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809424907643944
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905584907643924
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020324907643971
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102374907643978
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307304907643913
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509074907643906
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603234907643905
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707514907643973
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906154907643945
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019464907643947
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101564736832050
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208165151262209
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405113045063760
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022307404681425404
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402162340827137
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011607522183608265
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802371610559264
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902073373571865

Resultado da consulta em 25/11/2025 12:59:44

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Certidão nº: 66467272/2025

Expedição: 04/11/2025, às 18:42:25

Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.537.410/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.537.410/0001-22	Razão Social F. COSTA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.8498448-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000040533374			Valor Total do Documento 3.401,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	547,88			547,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	254,98			254,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.564,37			1.564,37
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	463,60			463,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	117,32			117,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	195,54			195,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	15,64			15,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	78,21			78,21
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	117,32			117,32
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	46,93			46,93
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

18/11/2025 11:55:17

85860000034 9 01790385253 0 23071625322 9 84984486098 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000034 9 01790385253 0 23071625322 9 84984486098 4



CNPJ: 27.537.410/0001-22
Número: 07.16.25322.8498448-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.401,79

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.401,79			3.401,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.02
3507603507

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
EFETUADO POR: FRANKLANDE F COSTA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85860000034-9	01790385253-0
	23071625322-9	84984486098-4
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento	07.16.25322.8498448-6	
Valor Total		3.401,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 111904
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CPF/CNPJ do Empregador
27.537.410

Nome/Razão Social do Empregador
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803622315-5

Tag
27537410 10/2025 MENSAL

Valor a recolher
625,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72
Total FGTS:		625,72	0,00	0,00	0,00	625,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **625,72**

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 11:57:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 625,72

19/11/2025 às 17:34:59

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251119203451828259178

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 260cb568631a47d09125db3dcf440d22

Documento: 000000000111902

Autenticação SISBB: 9.92A.FAC.D11.286.4DE

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 17:35:00

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111803622315-5

Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Data Emissão: 18/11/2025 11:57:56 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 625,72

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	19/11/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
10/2025		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	19/11/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
10/2025		GRIGORIO BASILIO DA SILVA NETO	178-0020	025.573.143-40	101	19/11/2025	Mensal	1.533,50	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68
10/2025		JULIO CESAR SOUSA FREITAS	178-0019	058.500.333-51	101	19/11/2025	Mensal	2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
Total do Tomador				Sem Tomador				7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72
Total do Estabelecimento				27.537.410/0001-22				7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72
				Total FGTS				7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	625,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803622315-5 Data Emissão: 18/11/2025 11:57:56 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72


Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
		Total FGTS	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Guard, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo fixado nas normas da Lei 8.091/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo fixado nas normas da Lei 8.091/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo órgão/órgão de destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho superior, nos termos da Lei 8.068/1990
- 771 - Membro de conselho regional de medicina de 1925 estabelecido, de abrangência ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.091/1998
- 904 - Profissional em formação que receba bolsa
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803622315-5 Data Emissão: 18/11/2025 11:57:56 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,72

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	27.537.410/0001-22	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
Total FGTS			7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 012511803622315-5

Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

18/11/2025 11:57:56 (Brasília)

012511803622315-5

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 625,72

F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72
		Total FGTS	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803622315-5

Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Data Emissão: 18/11/2025 11:57:56 (Brasília)

Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 625,72

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	4	7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72	0,00	625,72
Total FGTS		7.821,86	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,72	0,00	625,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	27.537.410/0001-22
Nome	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	130419785 / Reinf CP 35830429623 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 867,86	R\$ 802,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.145,29	R\$ 2.145,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 453,64	R\$ 453,64
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.466,79	R\$ 3.401,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANKLANDE FELIX DA COSTA
CPF	817.641.973-72
Telefone	3221-0969

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/11/2025 11:47:40
Nº do recibo de entrega	0000050000405333374



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1588/021101 - Reanálise nº 1

Conclusão: Parecer Pleno

PROCESSO Nº	1105/2025	NOTA FISCAL/FATURA Nº	154	REFERÊNCIA	out./25, nov./25
ORGAO/ENTIDADE	SEINFRA				
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
701001 /2025 - OR	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	2.010.292,01	350.080,13	
804001 /2025 - OR	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	1.407.493,39	38.037,88	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 388.118,01	

I. Introdução

Analisei o processo nº 1105/2025, de pagamento da 12ª medição do do Contrato nº 018/2024, firmado entre o Município de Timon - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon - MA - SEINFRA e a Empresa F. Costa Construtora Ltda, que tem por Objeto, a "Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Manutenção e Conservação de Pavimentação, Canteiros, Sarjetas, Meio Fio, Galerias e Outros em Vias Públicas do Município de Timon - MA", de acordo com o Processo Administrativo Nº 1823/2024 e Concorrência Nº 006/2024, conforme roteiro de Pagamento de medição de obras, previamente definido pela CGM, conforme demonstrado a seguir.

Legenda: S = Sim N = Não

II. Análise

Pergunta	S	N
1. O processo da despesa foi analisado pela Controladoria Geral do Município antes do pagamento?	X	
Observação: Cumprer salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com o relatório apresentado pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não será objeto desta análise os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.		
2. A análise do controle interno foi realizada pela Controladoria Geral do Município após o pagamento da despesa ?		X

Pergunta	S	N
3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ? ☒ Solicitação de Execução de Despesa - SED; ☒ Nota de Empenho; ☒ Contrato e/ou Aditivos; ☒ Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM; ☒ Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA); ☒ Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato; ☒ Ordem de Fornecimento de Material/Serviço; ☒ Solicitação de Pagamento; ☒ Nota Fiscal; ☒ Recibo; ☒ Carta da Contratada encaminhando a medição; ☒ Memória de cálculo; ☒ Cronograma executivo (físico) realizado; ☒ Certificado de medição, definindo o período correspondente; ☒ Quadro resumo financeiro; ☒ Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; ☒ Certidões Negativas de Débito. ☒ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; ☒ Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; ☒ Outros (Especificar): Observação: De acordo com Relatório de Vistoria, Planilhas de Medição, Relatório Fotográfico, todos devidamente atestados pelo Engenheiro Fiscal do presente Contrato, Sr. MACIEL DO NASCIMENTO LOPES do Departamento de Engenharia e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (CREA Nº 191911297-9), conforme Contrato nº 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 6,89% referente à 12ª medição, totalizando 96,45% do Valor do Contrato; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo. Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa? Qual a fonte de recurso utilizada? R.: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	X	
12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa? Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: OF Nº 29/2025, de 01/07/2025.	X	

Pergunta	S	N
13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato? Qual número e o período de vigência do contrato? R.: <i>Contrato nº 018/2024. Prazo de Vigência: 12 meses: de 21/10/2024 a 21/10/2025. 2º Termo de aditivo: 22/10/2025 a 22/10/2026.</i> Qual o período de execução da medição? R.: <i>28/10/2025 a 25/11/2025.</i>	X	
14. Houve solicitação de pagamento (SP)? Qual o número da Solicitação de Pagamento? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i> Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>25/11/2025.</i>	X	
15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa? Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>156, DE 25/11/2025.</i> Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$)? R.: <i>388.118,01.</i>	X	
16. O Recibo consta no Processo?		X
17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?	X	
18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato? Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>R\$ 5.629.973,56.</i> Qual o valor já pago? R.: <i>R\$ 5.429.909,77 (incluindo este pagamento da 12ª medição do Contrato nº 018/2024).</i>		X
19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período? Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 388.118,01</i> Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 388.118,01</i> Observação: Cabe ressaltar, a responsabilidade da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento e fiscalização das medições, bem como a verificação da qualidade das mesmas, já que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo. Salientamos ainda, a existência de atesto do fiscal do Contrato, designado nos autos do processo, reconhecendo a efetiva medição conforme contratado e apresentados na Nota Fiscal. Assim, uma vez que a regularidade da despesa foi atestada pelo mesmo, esta Controladoria não adentrou ao mérito da fiscalização atestada por ele, nem da autorização do pagamento realizada pelo ordenador da despesa.		X
20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária? Qual o valor da medição apresentada? R.: <i>R\$ 388.118,01.</i> Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: <i>R\$ 388.118,01.</i> Observação: Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.		X


Diante do exposto, após análise da documentação constante do referido processo de pagamento, constatou-se que estas guardam conformidade, de acordo com os aspectos contábeis e financeiros, no que se refere ao cumprimento das exigências referentes aos estágios da despesa (Empenho e Liquidação).

Em relação à prestação do serviço, esta Controladoria verificou que há atesto do fiscal do contrato na nota fiscal, bem como emissão de relatório de fiscalização, reconhecendo, assim, a efetiva realização do serviço contratado.

Ressaltamos ainda, que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo.

Por fim, recomenda-se também que sejam realizadas as devidas retenções dos tributos incidentes e, posteriormente, o recolhimento dos mesmos aos respectivos órgãos arrecadadores, conforme Legislação vigente.

Timon-MA, 27 de novembro de 2025.


Joseane Tainan da Silva Dourado
Mat.: 2200828
Técnico de Nível Superior - Engenharia


Paraguaçu Santos Veras Filho
Mat.: 9221038-1
Controlador-Geral

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Praça São José, S/N
CNPJ: 06.115.307/0001-14

701001 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9 FICHA: 327 DATA: 27/11/2025 EMPENHO Nº: 701001

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000006/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA 27.537.410/0001-22 CÓDIGO: 23519
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

OR

SOMA

350.080,13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 11 01 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
15.451.1016.2005.0000 Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.010.292,01

2.010.292,01

350.080,13

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350.080,13

trezentos e cinquenta mil e oitenta reais e treze centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

27/11/2025

Thayane de Aragão Evangelista
Diretora Técnica
Portaria Nº 0363/2025-GP
CPF: 063.240.303-93T. Evangelista
Diretora Técnica
Portaria Nº 0363/2025-GP
CPF: 063.240.303-93

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 022/2025-GP
CPF: 791.274.103-82

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Praça São José, S/N
CNPJ: 06.115.307/0001-14

804001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 327

DATA: 27/11/2025

EMPENHO Nº: 804001

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA

000006/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

27.537.410/0001-22

CÓDIGO: 23519

ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

OR

SOMA

38.037,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 11 01

SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

15.451.1016.2005.0000

Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas

3.3.90.39.99

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.407.493,39

38.037,88

38.037,88

1.369.455,51

VALOR A SER PAGO R\$

38.037,88

trinta e oito mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

27/11/2025

Thayane de Aragão Evangelista
Diretora Técnica
Portaria Nº 0363/2025-GP
CPF: 063.240.393-93

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 022/2025-GP
CPF: 791.274.103-82

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 24469

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

Valor 254.190,55

(duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 254.190,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001 / 13	OR	021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 254.190,55	R\$ 0,00	R\$ 22.055,04	R\$ 232.135,51
TOTAL					R\$ 254.190,55	R\$ 0,00	R\$ 22.055,04	R\$ 232.135,51

Despesa Líquida: R\$ 232.135,51

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	071646	232.135,51
TOTAL. . .			R\$ 232.135,51

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados



Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 000 2025-07

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 24471

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

Valor 38.037,88

(trinta e oito mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38.037,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804001 / 1	OR 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38.037,88	R\$ 0,00	R\$ 2.396,39	R\$ 35.641,49	
TOTAL					R\$ 38.037,88	R\$ 0,00	R\$ 2.396,39	R\$ 35.641,49

Despesa Líquida: R\$ 35.641,49

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	071646	35.641,49
TOTAL . . .			R\$ 35.641,49

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados


Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 003 2025-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:04
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	267.777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO	553.791.000.105.359

=====

NR. AUTENTICACAO	E.96A.DD8.8A6.8D2.169
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 28 de novembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 154

DT/EMIS.: 25-nov.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo Pacheco II, Teresina -PI. **DADOS BANCÁRIOS:** BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 12ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do municipio.. **ÓRGÃO DE ORIGEM:** SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	388.118,01
Pagamentos anteriores	
Valor da Ordem Bancária	292.228,43
Retenções	(24.451,43)
ISSQN	15.524,72
IRRF	4.657,42
INSS	4.269,29
Valor líquido pago	267.777,00
Saldo Remanescente	95.889,58

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 105.359-0/FEP

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

24478

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COSTA CONSTRUTORA LTDA., CONFORME NFS-e N° 154 EMITIDA EM 25/11/2025.

Valor 15.524,72

(quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.524,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
254	/ 1	EX	990187		R\$ 15.524,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.524,72
TOTAL					R\$ 15.524,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.524,72

Despesa Líquida: **R\$ 15.524,72**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	112801	15.524,72
TOTAL. . .			R\$ 15.524,72

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados


Davio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 003/2025-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41654265	10/12/2025	ÚNICA	10/12/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		15.524,72
PRÇ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.11/2025 002						0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.524,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41654265	10/12/2025	ÚNICA	10/12/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		15.524,72
PRÇ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.11/2025 002						0,00
Via da Prefeitura						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.524,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

ISS/2025

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
11	754	41654265	ÚNICA	10/12/2025	10/12/2025	15.524,72
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
PRÇ SAO JOSE						(+) MULTA
CENTRO						0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.11/2025 002						0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.524,72

VIA DO BANCO

81640000155 7 24724542202 4 51210034165 4 42650003000 9



PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



Impresso no site oficial do Município



Emissão de comprovantes

G3382810557531211
28/11/2025 11:14:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0
=====

Convenio	PREFEITURA MUN TIMON - IP	
Codigo de Barras	81640000155-7	24724542202-4
	51210034165-4	42650003000-9
Data do pagamento	28/11/2025	
Valor Total	15.524,72	

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: A.4A4.68C.352.B0B.53F

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 24484

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

RECOLHIMENTO DE IR DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COSTA CONSTRUTORA L TDA., CONFORME NFS-e N° 154 EMITIDA EM 25/11/2025.

Valor **4.657,42**(quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **R\$ 4.657,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
255	/ 1	EX	999013		R\$ 4.657,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.657,42
TOTAL					R\$ 4.657,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.657,42

Despesa Líquida: **R\$ 4.657,42**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	112802	4.657,42
TOTAL. . .			R\$ 4.657,42

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados


Sebastião Farias Bitencourt
Torneiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038/2025-GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA E ITAU			DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			Emissao 27/11/2025			
No. Registro 3610			Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 41654264	Vencim Original 01/12/2025
Valor do Tributo 4.657,42			(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00
						Nosso número 4.657,42

Insc. Contribuinte 754 Insc. Econômico 11 Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160

Historico

IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 154 EMITIDA EM 25/11/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.

IRRPJ

Empresão por CRISTIANE

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

IRRF /2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa 3610	Inscrição do Contribuinte 754	No. Crédito 41654264	Parcela ÚNICA	Vencim Original 01/12/2025	VENCIMENTO 01/12/2025	VALOR DO IMPOSTO 4.657,42
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14 PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160						
Historico IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 154 EMITIDA EM 25/11/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbências 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 4.657,42

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



VIA DO BANCO 81620000046 0 57424542202 1 51201664165 0 42640001000 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 81620000046-0 57424542202-1
51201664165-0 42640001000-2

Data do pagamento 28/11/2025

Valor Total 4.657,42

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: 9.040.1D3.D4B.1F4.665

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 24485

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:

INSS DESCONTADO EM PAGAMENTO EFETUADO À F. COSTA CONSTRUTORA LTDA., CONFORME NFS-e N° 154 EMITIDA EM 25/11/2025.

Valor **4.269,29**(quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.269,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
256	/ 1	EX	991740		R\$ 4.269,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269,29
TOTAL					R\$ 4.269,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269,29

Despesa Líquida: **R\$ 4.269,29**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	200036	4.269,29
TOTAL. . .			R\$ 4.269,29

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados


Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Secretário Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038 2025-GP

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24473

PAGTO: 28/11/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

Valor **46.300,00**

(quarenta e seis mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001 / 14	OR	021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.300,00
TOTAL					R\$ 46.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 46.300,00**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	120.761-X	071646	46.300,00
TOTAL. . .			R\$ 46.300,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tabelião de Notas do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038/2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3382810557531211
28/11/2025 11:15:25

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:46
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TIMON -CIDE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 120.761-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	46.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.120.761
=====

NR.AUTENTICACAO	2.3BA.0D1.A2C.F5C.852
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 28 de novembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 154

DT/EMIS.: 25-nov.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo Pacheco II, Teresina -PI. DADOS BANCÁRIOS: BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 12ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do municpio.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	388.118,01
Pagamentos anteriores	292.228,43
Valor da Ordem Bancária	46.300,00
Retenções	-
ISSQN	
IRRF	
INSS	
Valor líquido pago	46.300,00
Saldo Remanescente	49.589,58

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO:

120.761-X/CIDE

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURAPraça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24475

PAGTO: 01/12/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 23519

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, CONFORME NFS-E Nº 154 E PARECER DA CGM Nº 1588/021101-REANÁLISE Nº 1.

Valor **49.589,58**

(quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49.589,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001 / 15	OR	021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49.589,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.589,58
TOTAL					R\$ 49.589,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.589,58

Despesa Líquida: **R\$ 49.589,58**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	21	071646	49.589,58
TOTAL. . .			R\$ 49.589,58

Despesa paga em 01/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Partaria Nº 038/2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:18
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMT FDO PARTICIPACAO
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 200.036-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	49.589,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO	553.791.000.200.036

=====

NR. AUTENTICACAO	6.370.731.A66.CBF.C29
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 01 de dezembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 154

DT/EMIS.: 25-nov.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo pacheco II, Teresina -PI. **DADOS BANCÁRIOS:** BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 12ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do municipio.. **ÓRGÃO DE ORIGEM:** SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	388.118,01
Pagamentos anteriores	338.528,43
Valor da Ordem Bancária	49.589,58
Retenções	-
ISSQN	
IRRF	
INSS	
Valor líquido pago	49.589,58
Saldo Remanescente	0,00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 200.036-9/FPM
