

7ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 0018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 (próprio)

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 451.510,46

Teresina, 25 de junho de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 7ª (SETIMA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA Assinado de forma digital por FRANKLANDE
COSTA:81764197372 FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.25 09:37:14 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	
	
Assinatura	

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (7ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 451.510,46** (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dez reais e quarenta seis centavos) correspondente a um percentual **8,02%**, relativos à 7ª boletim de medição, totalizando **60,06%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 29 DE MAIO DE 2025 E 26 DE JUNHO DE 2025.

Este é o nosso parecer.


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil OREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 26 de Junho de 2025.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEROS, SARIJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 07				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84				182.517,63	29,17%		29.774,56	4,76%		212.392,19	33,93%			
1.1	7395/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %		1.981,97	3.549,28	88,81%		228,76	6,44%	2.084,97	3.878,04	92,25%			
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	m²	115,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %		86,10	972,79	2,42%		477,34	12,72%	86,10	1.450,13	3,61%			
1.3	C1049 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	963,71	283,69	339,71	181.504,72	3,40 %		-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%			
1.4	C3373 SINAPI	RETRABALHO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	m	30.579,02	10,14	13,08	73.881,11	1,31 %		-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%			
1.5	C3064 SINAPI	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INFRAESTRUTURA	m²	30.579,02	9,00	11,80	354.716,60	6,30 %		18.344,45	177.595,69	50,18%	2.505,90	29.068,44	8,18%	17.850,35	207.664,13	58,37%			
2		EMBASAMENTO OPERADORA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 1:4	m²	963,72	394,57	489,00	279.040,66	4,50 %		431,07	213.381,11	76,47%	55,80	27.621,00	9,90%	486,87	241.002,11	86,37%			
2.1	7395/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO DE 1:5 ATE 3M, EXCLUINDO	m³	963,73	180,00	231,90	130.726,99	2,32 %		424,80	98.512,17	75,36%	39,80	9.229,82	7,60%	464,60	107.741,99	82,42%			

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	123,00
2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	m²	112,75	29,00
3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	2.505,90
2		INFRAESTRUTURA			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	55,80
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	39,80
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	245,10
3		SUPERESTRUTURA			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	5,60
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	m³	45,09	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N°	1105/25
Folha N°	
Assinatura	

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDIDAÇÃO Nº: 07			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025	6ª Med. 28/05/2025	7ª Med. 26/06/2025
1	SERVIÇOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDICÃO Nº: 07			
MEDICÃO Nº		QUADRO - RESUMO FINANCEIRO	
		VALOR TOTAL MEDIDO	PERÍODO CORRESPONDENTE
		MONETÁRIO	INÍCIO FIM
1ª		R\$ 443.643,24	22/10/2024 05/11/2024
2ª		R\$ 426.083,39	06/11/2024 25/11/2024
3ª		R\$ 289.589,14	26/11/2024 11/12/2024
4ª		R\$ 450.073,76	12/02/2025 14/03/2025
5ª		R\$ 479.369,02	15/03/2025 10/04/2025
6ª		R\$ 841.310,87	11/04/2025 28/05/2025
7ª		R\$ 451.510,46	29/05/2025 26/06/2025
ACUMULADO		R\$ 3.381.579,88	
VALOR CONTRATO		R\$ 5.629.973,56	
		60,06%	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024




1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL




1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL




1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL

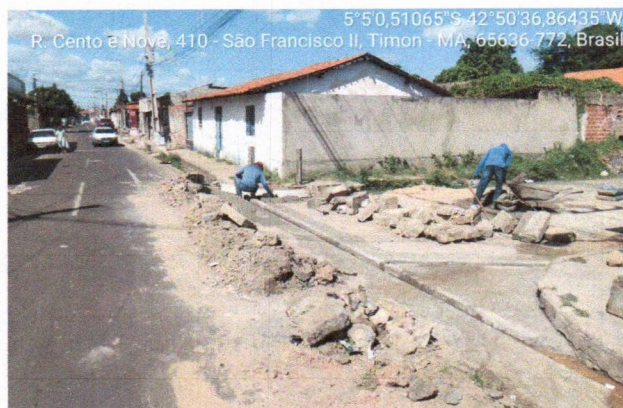

8.2 GUIA (MEIO-FIO)

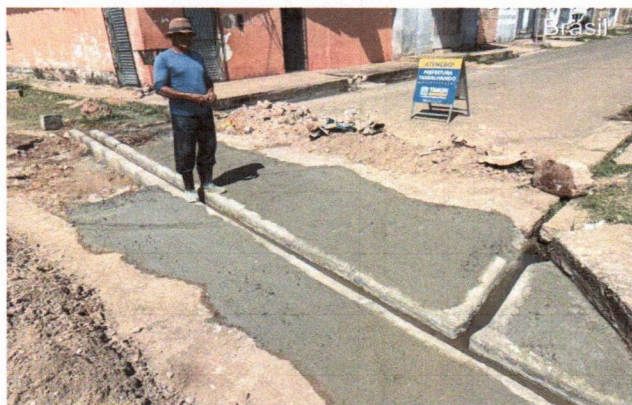

8.2 GUIA (MEIO-FIO)

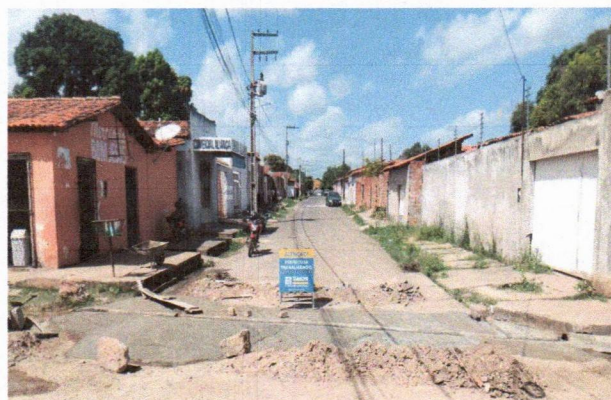

8.2 GUIA (MEIO-FIO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



5.1 PISO CEMENTADO

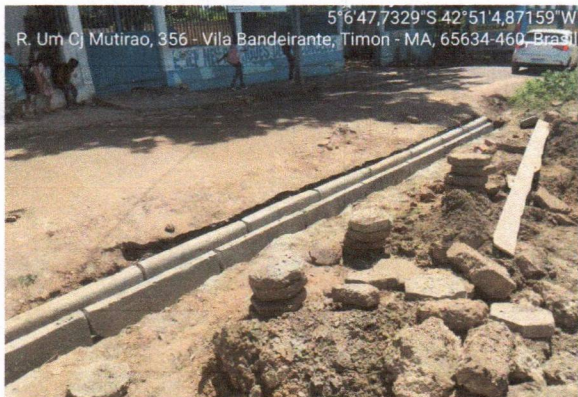

8.2 GUIA (MEIO-FIO)



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



8.2 GUIA (MEIO-FIO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO

OBJETO


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

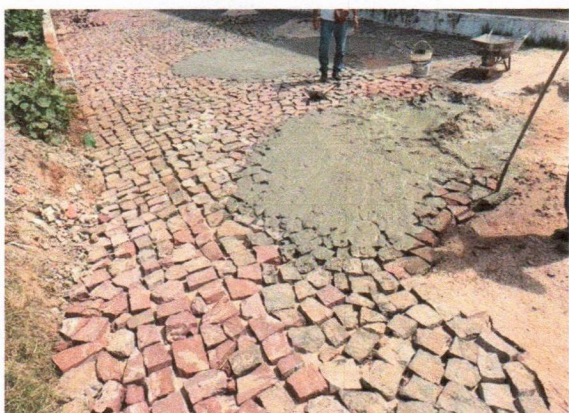

5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Folha Nº

1205115



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Previsão de término: 31/03/2027

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n

Teresina, 26 de JUNHO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 451.510,46 (Quatrocentos, cinquenta, um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), referente a 7ª (SETIMA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.26 09:37:58 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	110512
Folha Nº	
Assinatura	



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000135
Data e Hora de Emissão	26/06/2025 07:58:29
Código de Verificação	5aac5828

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **27.537.410/0001-22** Inscrição Municipal : **463993-6**
Endereço: **CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, Nº1 - S/N - BAIRRO VALE DO GAVIAO - CEP:64069-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREF MUNICIPAL DE TIMON**
CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**
Endereço: **PRACA SAO JOSE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:65630-160**
Município: **TIMON** UF: **MA** E-mail: **f.costaconstrutoraltda@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TIMON-MA

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2024	1	451510,46,00	451.510,46
ATESTADO QUE: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS 26/06/25 Maclei do Nascimento Lopes Engenheiro Civil CREA 1919112979 Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA CPF: 016.156.663-46				

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (1,1000%): R\$ 4.966,62	IR (1,2000%): R\$ 5.418,13	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 451.510,46

Valor Total das Deduções: R\$ 90.302,09	Base de Cálculo: R\$ 361.208,37	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18060,41
---	---	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2025** Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **TIMON/MA** Incidência: **TIMON/MA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	
Assinatura	

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO

R\$ 451.510,46

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 451.510,46 (Quatrocentos, cinquenta, um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), referente a 7ª (SETIMA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA.. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000135.

Teresina, ____ de _____ 2025.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.26 09:38:09 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	
	
Assinatura	

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEROS, SARIETAS, MEIO-FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS
EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Síntetico										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL 07				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E REMOÇÕES					625.961,84															
1.1	73890002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.250,00	1,44	1,66	4.203,60	0,07 %														
1.2	92070 SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,45	1.450,13	0,03 %		1.981,97	3.649,26	88,81 %	123,00	228,76	5,44 %	2.084,97	3.878,04	92,26 %				
1.3	92070 SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	20,45	26,45	2.957,13	0,05 %		59,10	972,79	52,42 %	29,00	477,34	25,72 %	88,10	1.450,13	78,14 %				
1.4	C3733 SENFRA	RETRABALHO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA	m	5,941,74	10,14	13,96	73.581,11	1,30 %				0,00 %			0,00 %			0,00 %				
1.5	C3964 SENFRA	REMOÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E	m	30,579,02	9,00	11,60	354.716,60	8,30 %		13.344,45	177.993,58	50,18 %	2.505,90	29.988,44	8,19 %	17.850,35	207.064,02	58,37 %				
2		INFRAESTRUTURA					743.684,81	13,21 %														
2.1	95467 SINAPI	EMBRASAMENTO DE PEDRA ARÇAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMBARRIA 1:4	m³	503,72	384,57	408,00	209.610,88	4,09 %		451,97	213.381,11	76,42 %	55,50	27.521,00	8,21 %	507,47	240.902,11	84,63 %			</	

Obra

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA
CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024**

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,260.00	123.00
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112.75	29.00
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	2,505.90
2		INFRAESTRUTURA			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	55.80
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	39.80
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	245.10
3		SUPERESTRUTURA			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	5.60
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	m³	45.09	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676.45	
5		PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563.74	99.00
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1,691.20	102.00
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	1,554.50

FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
 FELIX DA COSTA:81764197372
 Dados: 2025.06.26

6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	
7		GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	225.50	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	225.49	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	225.49	
8		DIVERSOS			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020.78	1,550.00
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511.09	1,550.00
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018.68	1,600.60
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691.20	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691.21	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	
8.7	CPU Próprio	CANALETA SIMPLES	M	269.10	
8.8	SEINFRA 73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897.69	

FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
 FELIX DA COSTA:81764197372
 Dados: 2025.06.26 12:00:47 -03'00'

Proc. N° 1105115
 Folha N°
 Assinatura

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA 81764197372
Dados: 2025.06.26 12:00:58 -03'00'


Proc N°	1105125
Folha N°	
Assinatura	

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -									
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA					CONTRATO Nº: 18/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON					CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22				
MEDIDAÇÃO Nº: 07					QUADRO - RESUMO FINANCEIRO				
MEDIDAÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE						
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM					
1ª	R\$ 443.643.24	7.88%	10/22/2024	11/5/2024					
2ª	R\$ 426.083.39	7.57%	11/6/2024	11/25/2024					
3ª	R\$ 289.589.14	5.14%	11/26/2024	12/11/2024					
4ª	R\$ 450.073.76	7.99%	2/12/2025	3/14/2025					
5ª	R\$ 479.369.02	8.51%	3/15/2025	4/10/2025					
6ª	R\$ 841.310.87	14.94%	4/11/2025	5/28/2025					
7ª	R\$ 451.510.46	8.02%	5/29/2025	6/26/2025					
ACUMULADO	R\$ 3.381.579.88								
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973.56	60.06%							

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA/81764197372
Data: 2025.06.26 12:00:26 -03'00'

Proc Nº 1205125
Folha Nº
Assinatura


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

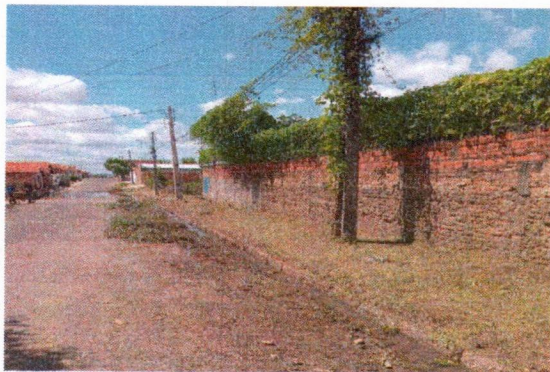


1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL



1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL

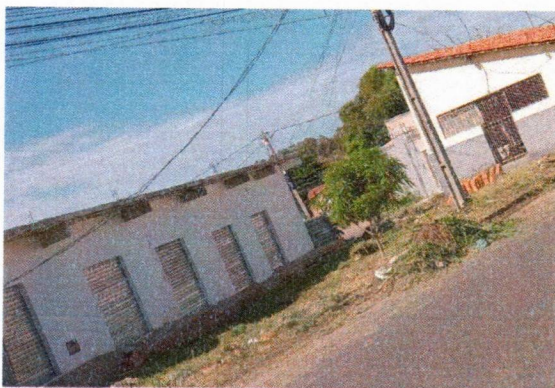


1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL

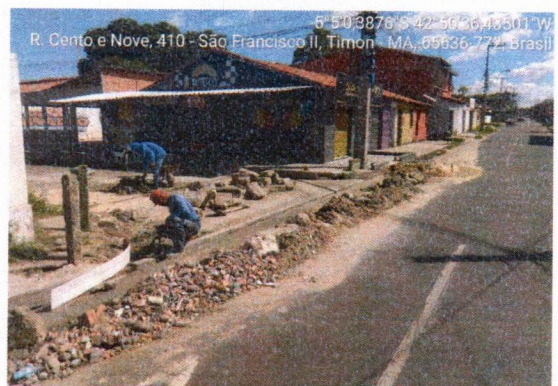

8.2 GUIA (MEIO-FIO)



5.1 PISO CEMENTADO

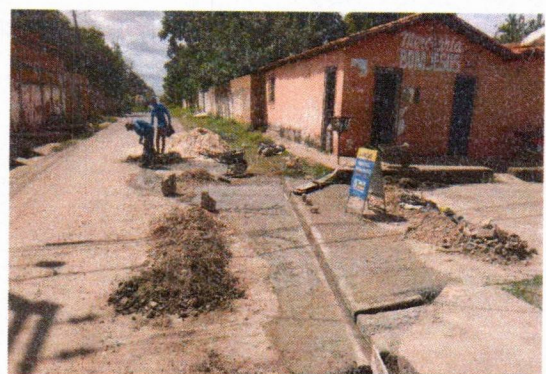

8.2 GUIA (MEIO-FIO)


FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372


Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.26 12:01:31 -03'00'

Proc N° 1105125
Folha N°
Assinatura

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024

 Brasil	 S 5° 6' 8.608" W 42° 49' 10.100" Rua Gonçalves Dias Mangueira Timon MA 65630-536 Brasil
5.1 PISO CEMENTADO	5.3 PAVIMENTAÇÃO

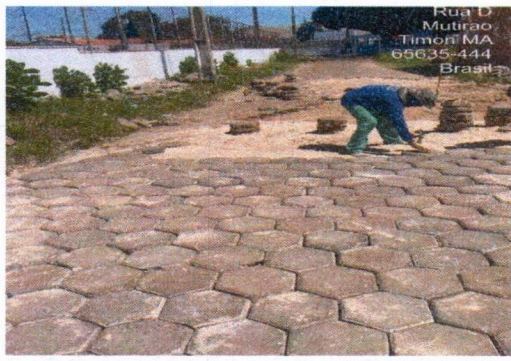 Rua D. Mutirão, Timon MA 65635-444 Brasil	 65635-446 Brasil
5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL

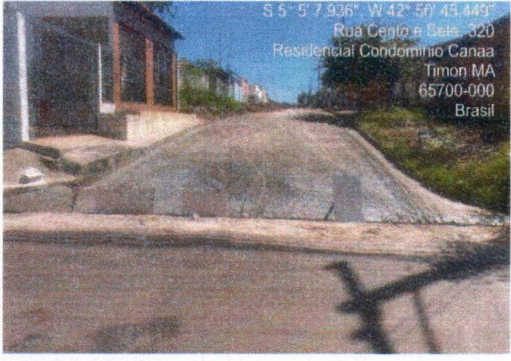 S 5° 5' 7.936" W 42° 50' 45.449" Rua Ceão e Silva, 320 Residencial Condomínio Canaã Timon MA 65700-000 Brasil	
--	--

5.1 PISO CIMENTADO	1.5 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
--------------------	--

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024




5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO




5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO




8.2 GUIA (MEIO-FIO)

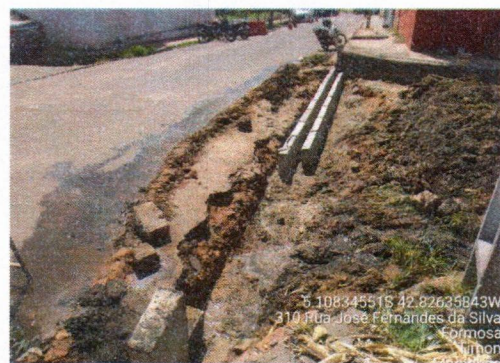

8.2 GUIA (MEIO-FIO)

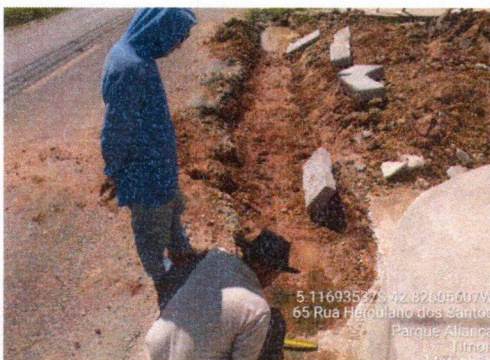

5-116935372-42-82695607W
65 Rua Hercúlio dos Santos
Parque Alencar
Timon
Maranhão

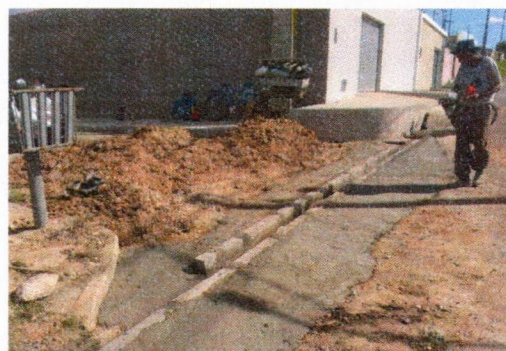

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.26 12:01:56 -03'00'

Proc. Nº 1105/25
Folha Nº
Assinatura

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL

8.2 GUIA (MEIO-FIO)

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2023.06.26 12:02:08 -03'00'

Proc. N°	110514
Folha N°	1
Assinatura	<i>[Signature]</i>

OBJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON	
	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS	




ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS



ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS




ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS

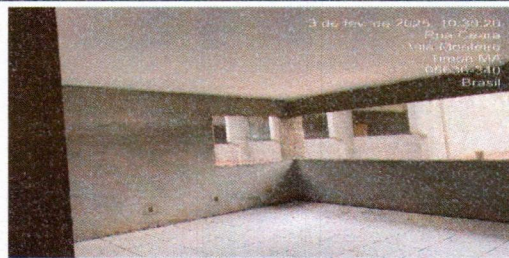

SALA SEM ESQUADRIAS, COM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA



SALA COM ESQUADRIAS, COM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA

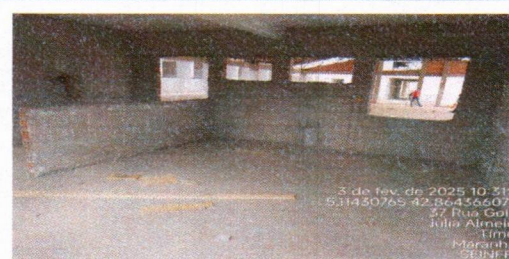

SALA SEM ESQUADRIAS, SEM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.06.26 12:02:21
-03'00'
