

5ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 0018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 (próprio)

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas pavimentadas

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Valor R\$: 479.369,02

Teresina, 07 de Abril de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 5ª (QUINTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por

FRANKLANDE FELIX DA

COSTA:81764197372

Dados: 2025.04.07 18:11:54 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº 1105/25
Folha Nº 01
Assinatura

F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158

Fone: (86) 3234.5584 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutoraltda@gmail.com

Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (5ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 479.369,02** (quatrocentos e setenta e nove mil e trezentos e sessenta e nove reais e dois centavos) correspondente a um percentual 8,51%, relativos à 5ª boletim de medição, totalizando 37,10% do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 DE MARÇO DE 2025 E 10 DE ABRIL DE 2025.

Este é o nosso parecer.


Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Timon, 10 de abril de 2025.



Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

 TIMON PREFEITURA Construindo agora o futuro		SEINFRA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -			
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDICÇÃO Nº: 05			
QUADRO - RESUMO FINANCEIRO			
MEDICÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024 05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024 25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024 11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025 14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025 10/04/2025
ACUMULADO		R\$ 2.088.758,55	37,10%
VALOR CONTRATO		R\$ 5.629.973,56	

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/IMA			CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22	
MEDIÇÃO Nº: 05				

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025
SERVIÇOS							
1	PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%
Custo			443.643,24	426.083,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,58%	37,09%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Proc Nº: 3105/25
Folha Nº: 6
Assinatura: G. M. A. S.

Proc Nº: 3105/25
Folha Nº: 6
Assinatura: G. M. A. S.



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	254,20
	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	47,10
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	4.158,90
2		INFRAESTRUTURA			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	75,13
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	78,10
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	301,40
3		SUPERESTRUTURA			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	7,13
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676,45	
5		PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	46,90
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	357,60
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	3.090,43

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146-2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46




Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	
	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	
		GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	
8		DIVERSOS			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	978,65
	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	
8.7	CPU Próprio SEINFRA	CANALETA SIMPLES	M	269,10	
8.8	73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



Orçamento Sintético										MEDIDA ACUMULADA ANTERIOR				MEDIDA ATUAL 05				MEDIDA ACUMULADA ATUAL			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLICOES					628.941,94														
1.1	73859002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.250,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07			170.453,55	20,05%		48.491,32	7,91%		175.004,15	27,96%			
1.2	92970 SINAPI	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03		1.214,57	3.110,83	53,74%	254,20	472,81	11,25%	1.468,77	2.731,91	84,95%			
1.3	C1046 SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	593,73	263,69	339,71	191.524,72	3,40		-	-	0,00%	47,10	775,27	41,76%	-	775,27	41,76%			
1.4	C3373 SINAPI	REMOCAO DE MEO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	5.641,74	10,14	13,05	73.681,11	1,31		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
1.5	C3064 SINAPI	DEMOLICAO E REMOCCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÍDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30		10.826,67	187.342,72	34,75%	4.159,90	48.243,24	13,60%	14.784,57	171.800,97	48,35%			
2		INFRAESTRUTURA					734.644,81	13,21%		392.741,76	43,00%		85.051,83	11,44%		404.801,19	54,43%				
2.1	96467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG.C/AREIA 1:4	m²	563,72	384,57	495,00	275.040,85	4,96		254,29	158.372,21	45,11%	75,13	37.189,35	13,33%	329,42	163.854,36	58,44%			
2.2	73865009 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LOCO DE 1,5 A 3M, EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m²	563,73	180,00	231,90	130.728,59	2,32		275,90	77.326,79	49,47%	78,10	18.111,39	13,62%	357,00	82.789,25	63,35%			
2.3	C0330 SINAPI	APPRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUISICAO SUPERFUTURACAO	m²	3.392,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93		1.308,85	187.088,78	38,89%	301,40	29.751,19	8,91%	1.810,25	188.847,47	47,80%			
3		CONCRETO					69.693,45	1,24%		6.916,71	7,97%		-	-	0,00%	-	-	0,00%			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FOX = 15MPA, TRACO 1:3:4:5 (CIMENTO:AREIA:MEIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.893,09	0,25		18,83	6.916,71	37,32%	7,13	2.382,76	15,81%	23,96	7.998,65	53,15%			
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FOX = 20MPA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO:AREIA:MEIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m³	45,10	382,48	382,64	18.356,15	0,25		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FOX = 30MPA, TRACO 1:2:12,5 (CIMENTO:AREIA:MEIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m³	45,10	301,52	306,91	17.450,80	0,31		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
3.4	73391 SINAPI	CONCRETO C/GRANULADO FOMT/MPA, 30% PEDRA DE MAC INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.580,46	1,09%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUROS 80x80x160, COM REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	m²	676,45	70,85	90,69	61.580,46	1,09		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
5		PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%		1.287.057,92	54,30%		-	-	0,00%	-	-	0,00%			
5.1	96681 SINAPI	PREO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	18.619,10	0,30		210,00	6.934,12	37,25%	46,90	1.382,61	8,32%	256,90	7.973,54	45,97%			
5.2	C3410 SINAPI	CALCADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	306,36	521.468,89	9,25		951,44	379.214,40	86,25%	357,60	110.819,54	21,14%	1.309,04	403.655,02	77,40%			
5.3	C2893 SINAPI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUIDUO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.286.028,70	22,88		12.114,96	860.909,40	53,75%	3.090,43	176.828,36	13,71%	15.205,39	888.832,06	87,43%			
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,06%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.890,58	1,29		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.2	C4327 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (800 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	362,70	44.275,35	0,79		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
6.7		GALÉRIAS TUBILARES					148.115,78	2,63%		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7		TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	225,50	92,14	118,69	26.765,01	0,48		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.1	95571 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	225,49	62,90	81,02	18.269,38	0,35		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.2	92624 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	225,48	354,88	457,14	103.081,41	1,83		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	225,48						-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8		DIVERSOS					2.037.914,69	38,20%		222.293,34	8,19%		54.298,40	2,88%		221.281,94	10,88%				
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X133X30 CM, COM REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	9.020,78	38,61	51,03	460.330,61	8,18		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.2	94295 SINAPI	GUA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	4.511,09	33,94	43,73	197.270,12	3,50		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.3	94286 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	9.018,69	43,06	55,48	500.356,34	8,69		3.009,85	222.293,34	33,37%	979,65	54.298,40	10,65%	3.989,50	221.281,94	44,22%			
8.4	C0550 SINAPI	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.891,20	54,97	70,82	139.707,89	2,15		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.5	C3888 SINAPI	REMOCAO DE MATA DE CANOAS GRANULAS DO PAVIMENTO	m³	1.891,20	10,49	13,05	20.000,00	0,03		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.6	94293 SINAPI	REMOCAO DE MATA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	225,48	126,56	163,04	38.762,34	0,66		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.7	CPU Proprio	CANALETAS SIMPLES	M	269,10	1.020,63	1.315,86	354.097,63	6,29		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
8.8	93862005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 800 MM	M	597,69	86,46	113,96	102.300,75	1,85		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
Total Geral							5.628.973,66			2.059.493,29	28,99%		479.369,02	8,61%		2.688.758,55	37,10%				

Proc N° 1105/23
Folha N° 61
Assinatura

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 141141-1
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/01/2025

Valor: R\$ 5.629.973,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Previsão de término: 31/03/2027

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
 INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 28/03/2025 12:33:01

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877

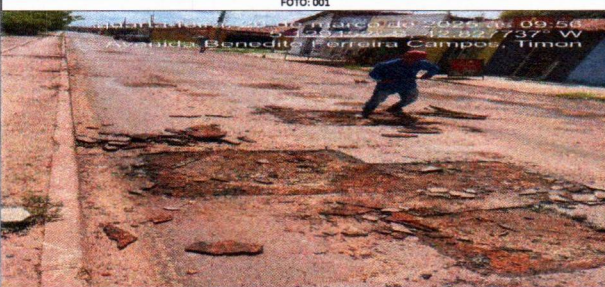
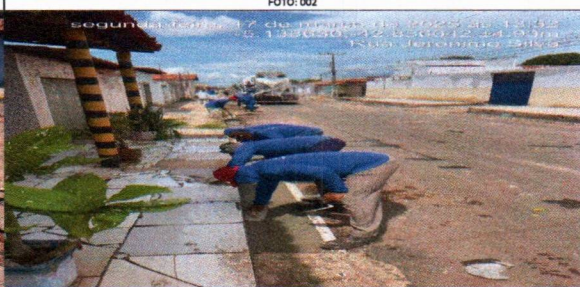
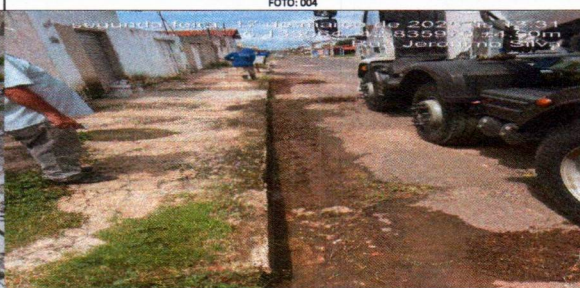
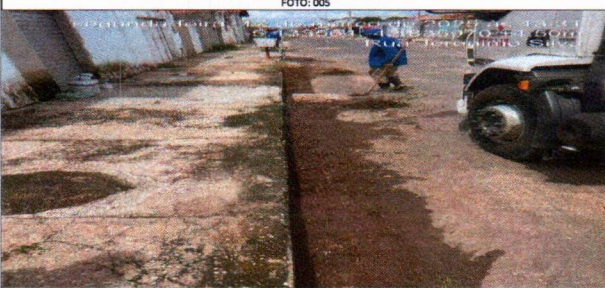
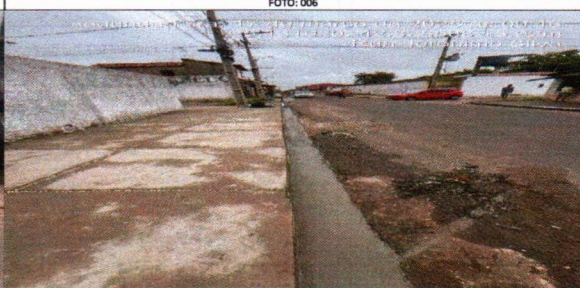


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1cYZ
 Impresso em: 28/03/2025 às 12:33:01 por: , ip: 138.0.234.198



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.
----------------	---

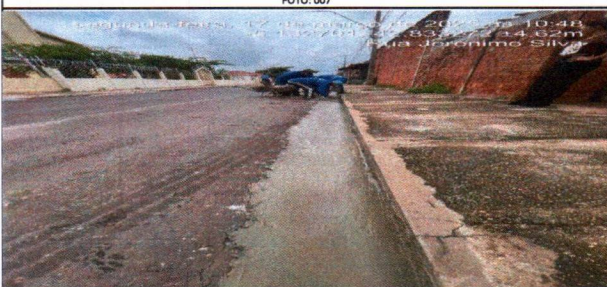
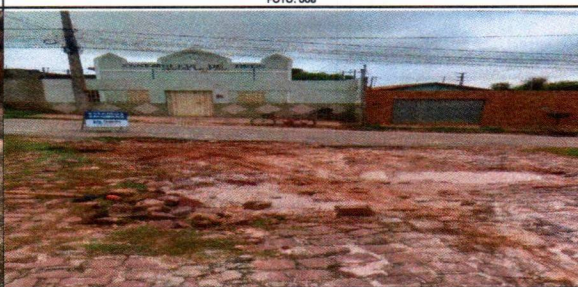
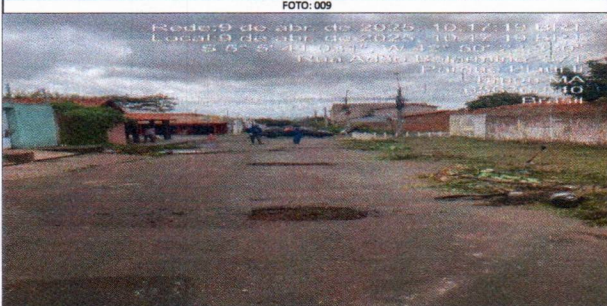
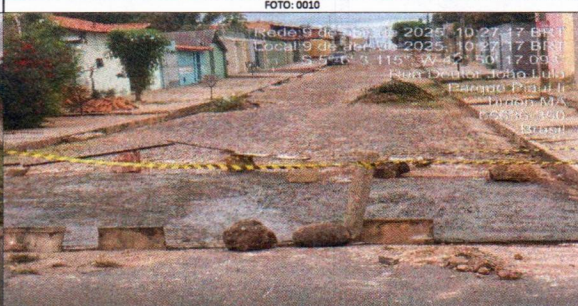
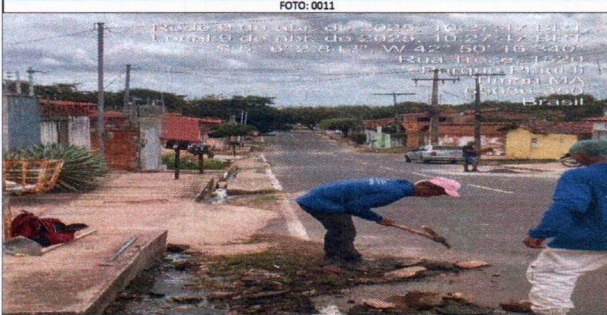
FOTO: 001 	FOTO: 002 
1.2 - Demolição de pavimento	8.3 - Execução de sarjeta
FOTO: 003 	FOTO: 004 
3.1 - Concreto fck 15 MPA	1.1 - Capina e Limpeza manual
FOTO: 005 	FOTO: 006 
1.1 - Capina e Limpeza manual	8.3 - Execução de sarjeta

Maciel do Nascimento Lopes
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc Nº 5105/25
Folha Nº 01
Assinatura Maciel do Nascimento Lopes

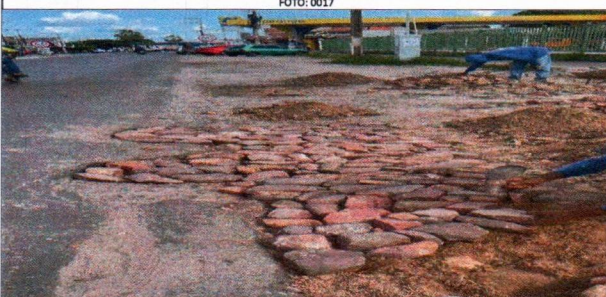


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.	
FOTO: 007 	FOTO: 008 
8.3 - Execução de sarjeta	1.5 - Demolição e Remoção de pavimento em paralelepípedo
FOTO: 009 	FOTO: 0010 
1.2 - Demolição de pavimento	5.3 - Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento
FOTO: 0011 	FOTO: 0012 
1.2 - Demolição de pavimento	1.2 - Demolição de pavimento
FOTO: 0013	FOTO: 0014

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO	
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.
	
5 - Pavimentação	1.2 - Demolição de pavimento
	
1.2 - Demolição de pavimento	5.3 - Pavimentação em paralelepípedo
	
5.3 - Pavimentação em paralelepípedo	5.3 - Pavimentação em paralelepípedo

Maciel
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Teresina, 15 de abril de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 479.369,76 (Quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente a 5ª (QUINTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:34:37 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	1105/25
Folha Nº	01/01

[illegible]

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:25:56 -03'00'


Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918210-03

Proc N° 1105/2
Folha N° 01
Assinatura


Bruno Williams, Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PR/01 1916210403

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -									
PROONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA					CONTRATO Nº: 18/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON					CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22				
MEDICÃO Nº: 05									
					QUADRO - RESUMO FINANCEIRO				
MEDICÃO Nº		VALOR TOTAL MEDIDO			PERÍODO CORRESPONDENTE				
		MONETÁRIO	PORCENTAGEM		INÍCIO		FIM		
1ª		R\$ 443.643,24	7,88%		10/22/2024		11/5/2024		
2ª		R\$ 426.083,39	7,57%		11/6/2024		11/25/2024		
3ª		R\$ 289.589,14	5,14%		11/26/2024		12/11/2024		
4ª		R\$ 450.073,76	7,99%		2/12/2025		3/14/2025		
5ª		R\$ 479.369,02	8,51%		3/15/2025		4/10/2025		
ACUMULADO		R\$ 2.088.758,55	37,10%						
VALOR CONTRATO		R\$ 5.629.973,56							

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:26:18 -03'00'



Bruno Williams Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA 1918219993

Obra

 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA
 CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,260.00	254.20
1.2	92970 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112.75	47.10
1.3	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	
1.4	C3373 SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	
1.5	C3064 SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	4,158.90
2		INFRAESTRUTURA			
2.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	75.13
2.2	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	78.10
2.3	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	301.40
3		SUPERESTRUTURA			
3.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	7.13
3.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.3	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.4	73361 SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45.09	
4		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	676.45	
5		PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563.74	46.90
5.2	C3410 SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1,691.20	357.60
5.3	C2893 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	3,090.43

 FRANKLANDE FELIX
 DA
 COSTA:81764197372

 Assinado de forma digital por
 FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372
 Dados: 2025.04.15 08:26:41
 -03'00'


 Bruno Williams da Sousa Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA-PURN 1918219893

 Proc N° 1105/25
 Folha N° 01
 Assinatura

Obra

 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA
 CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
6		ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	
6.2	C4327 SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	
7		GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.50	
7.2	92824 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225.49	
7.3	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.49	
8		DIVERSOS			
8.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,020.78	
8.2	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,511.09	
8.3	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,018.68	978.65
8.4	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1,691.20	
8.5	C3888 SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1,691.21	
8.6	94293 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	
8.7	CPU Próprio	CANALETA SIMPLES	M	269.10	
8.8	SEINFRA 73882/005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897.69	

 FRANKLANDE FELIX DA
 Assinado de forma digital por
 FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372
 Dados: 2025.04.15 08:26:53
 -03'00'


 Bruno Williams da Silva Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA-PIRN 1916219993

 Proc N° 1105/25
 Folha N° 0000
 Assinatura

OBRA									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024									
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			CONTRATO Nº: 18/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22						
MEDIÇÃO Nº: 05									
Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	625,961.84	24,549.50	33,358.43	22,672.16	44,936.72	49,491.32		
2	INFRAESTRUTURA	743,664.81	117,569.26	76,913.17	52,274.32	72,992.51	85,051.93		
3	SUPERESTRUTURA	69,663.45	3,036.15	687.60	467.33	1,362.82	2,352.76		
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61,550.46	-	-	-	-	-		
5	PAVIMENTAÇÃO	1,826,146.69	264,464.11	268,891.26	182,752.94	275,474.81	288,177.51		
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116,955.94	-	-	-	-	-		
7	GALERIAS TUBULARES	148,115.79	-	-	-	-	-		
8	DIVERSOS	2,037,914.59	34,024.23	46,232.93	31,422.38	55,306.90	54,295.50		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.



FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital
por FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:27:16
-03'00'

Bruno Williams de Sousa Rocha
Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918219893

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura



FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:27:28
-03'00'

Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918219803

Proc N° 1105/25
Folha N° 6
Assinatura

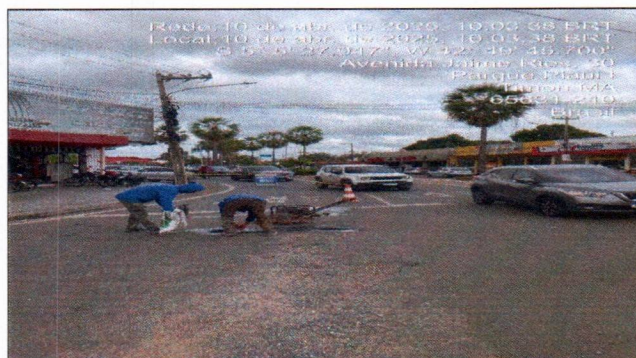


FOTO: 0015

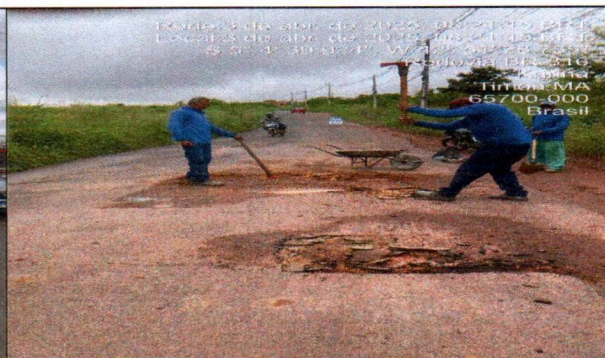


FOTO: 0016



FOTO: 0017

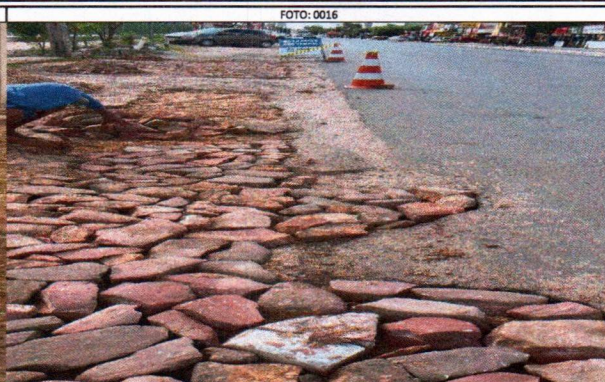
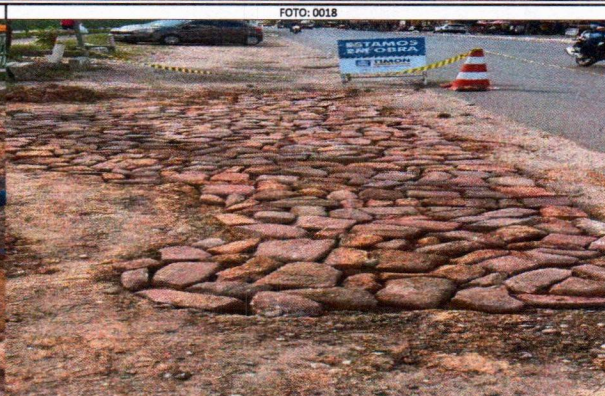
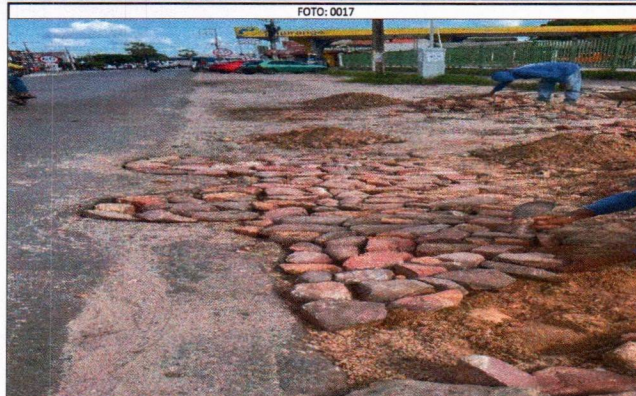


FOTO: 0018



FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:27:40
-03'00'

Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918219893

Proc N° 1105/25
Folha N° 01
Assinatura



 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000128	
	Data e Hora de Emissão 15/04/2025 06:42:38	
	Código de Verificação f742632b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP	Inscrição Municipal : 463993-6
CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22	
Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, N°1 - BAIRRO VALE DO GAVIAO - CEP:64069-120	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREF MUNICIPAL DE TIMON	
CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14	
Endereço: PRACA SAO JOSE, N°SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65630-160	
Município: TIMON	UF: MA E-mail: f.costaconstrutoraltda@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2024	1	479369,02	479.369,02
	ATESTO QUE: ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ AS DESPESAS FORAM REALIZADAS <u>15/04/2025</u> <i>Maciel do Nascimento Lopes</i> Maciel do Nascimento Lopes Engenheiro Civil CREA 1919112979 Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA CPF: 016.156.663-46			

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (1,1000%): R\$ 5.273,06	IR (1,2000%): R\$ 5.752,43	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 479.369,02				
Valor Total das Deduções: R\$ 95.873,80	Base de Cálculo: R\$ 383.495,22	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 19174,76	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TIMON/MA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Proc Nº	<u>1105/25</u>
Folha Nº	<u>6</u>
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO N° 018/2024

RECIBO

R\$ 479.369,76

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de \$ 479.369,76 (Quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente a 5ª (QUINTA) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000128.

Teresina, ____ de ____ 2025.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.04.15 08:34:48 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

Proc N°	1105/25
Folha N°	01010
Assinatura	
